

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวรวิทย์ บุญเนตร	ผส.ชป.๑๑		
๒	นายสมัย ธรรมสัจย์	รอง ผส.ชป.๑๑		
๓	นายวรชัย สุขผลธรรม	ผวศ.ชป.๑๑		
๔	นายประพจน์ กระจงแก้ว	ผผง.ชป.๑๑	x	ติดราชการ
๕	นายชัชชม ชมประดิษฐ์	ผจบ.ชป.๑๑		
๖	นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์	ผคก.ชป.๑๑ รท.ผบพ.ชป.๑๑		
๗	นายทรงพล สวยสม	ผคป.นนทบุรี		
๘	นายสากล ชลคีรี	ผคป.สมุทรสาคร		
๙	นายนิคม วัชรดิเรกรัตน์	ผคป.ปทุมธานี		
๑๐	นายสุชาติ อินทร์ปรุง	ผคป.สมุทรปราการ		
๑๑	นายนชุตินันต์ สกกุลพราหมณ์	ผคบ.รังสิตเหนือ		
๑๒	นายบัวแดง ทาแก้ว	ผคบ.รังสิตใต้		
๑๓	นางฉวีพร หงษ์อู่ นายชัยพร พรหมสุวรรณ	ผคบ.ชลหารพิจิตร	x	(ภรรยา)
๑๔	นายธานินทร์ เมืองทศเทศ	ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต		
๑๕	นายวีระชัย จิตรบรรเทา	ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน		(11นง)
๑๖	นายอากาศร์ สนิกะวาที	ผคบ.พระยาบรรลือ		
๑๗	นายชาญวิทย์ แสนเกต	ผคบ.พระพิมล		
๑๘	นายคำนิง ชูชาติ	ผคบ.ภาษีเจริญ		


















ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๙	นายอุดม คงช่วย	ผคส.๑๑		
๒๐	นายสรสิทธิ์ ตริเนตร	นิติกร สขป.๑๑		
๒๑	นายประวิทย์ อรุณวงษา	อ.อ.อ. อรุณวงษา		
๒๒	นายประวิทย์ อรุณวงษา	อ.อ.อ. อรุณวงษา		
๒๓	นายประวิทย์ อรุณวงษา	อ.อ.อ. อรุณวงษา		
๒๔	นายประวิทย์ อรุณวงษา	อ.อ.อ. อรุณวงษา		(พิเศษ)
๒๕				
๒๖				
๒๗				
๒๘				
๒๙				
๓๐				
๓๑				

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศรารุจ สากล	บน.ชป.๑๑	*	ติดรถไป
๒	นายณัฐ ก้านทอง	ปบ.ชป.๑๑		
๓	นายฉลาด พันธุ์ไพร	ปน.ชป.๑๑		
๔	นายจ่าง ภัทรวิหค	สพ.ชป.๑๑		
๕	นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล	ปช.ชป.๑๑		
๖	นายทวีวัฒน์ บุรมย์ชัย	ผง.ชป.๑๑		
๗	นายประสิทธิ์ มนต์เทวา	ยศ.ชป.๑๑		
๘	นายนิติ พานิชการ	อบ.ชป.๑๑		
๙	นายสุนัย กุณศลจินดา	คพ.ชป.๑๑		
๑๐	นายสมิตร สรพันธ์ไพโรจน์	ตป.ชป.๑๑		
๑๑	นายรัฐธีรย์ ทักษะนาคะจิตต์	พค.ชป.๑๑	* 	
๑๒	นายไพฑูรย์ เกื้อกิจ	สป.ชป.๑๑		
๑๓	นายธีระวุฒิ ศิลปคุปต์	ปธ.ชป.๑๑		
๑๔	นายคมกริช หงษ์ทอง	ตว.ชป.๑๑		
๑๕	นายชาญ พรรณเทวี	วค.ชป.๑๑		
๑๖	นายอำนาจ ถี่ถ้วน	ชบ.ชป.๑๑		
๑๗	นายเทวพันธ์ เอกอนงค์	ปย.ชป.๑๑		
๑๘	นายพิเชษฐ สว่างปาน	ปส.ชป.๑๑		

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๙	นางขวัญเมือง ฤาการงาม	พท.ชป.๑๑		
๒๐	นางสาวยุพยงค์ ชื่นอรุระ	ธก.ชป.๑๑		
๒๑	นางสาวรุ่งนภา ชันทอง	บส.ชป.๑๑		
๒๒	นางสุนีย์ ชาติเชื้อ	งบ.ชป.๑๑		
๒๓	นางอรุญา เจริญนฤภัทร	พต.ชป.๑๑		
๒๔	นางเสนาะ เพ็ชรพราว	ปท.ชป.๑๑		
๒๕	นางนงนุช คำเดชะ	ตำแหน่งงานเสมือนพิเศษ		
๒๖	นางนงนุช จิราพรวิมล	อภ.๑๒๖๒๖๖๖๖		
๒๗	นางสาวอนิลา ชวีชื่น	อธิการบดีประเพณีปริญญาตรี		
๒๘	นางรุจิรา พลรัตน์	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา		
๒๙	นางสุภา อุดมมณี	ผู้อำนวยการศูนย์		
๓๐	นายชรัต ไชยรัตน์	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย		
๓๑	นางนงนุช คำเดชะ	ผู้อำนวยการศูนย์		
๓๒	นางนงนุช คำเดชะ	รท.๑๑.๑๑		
๓๓	นางนงนุช คำเดชะ	ผู้อำนวยการศูนย์		
๓๔	นางนงนุช คำเดชะ	ผู้อำนวยการศูนย์		
๓๕	นางนงนุช คำเดชะ	ผู้อำนวยการศูนย์		
๓๖	นางนงนุช คำเดชะ	ผู้อำนวยการศูนย์		
๓๗	นางนงนุช คำเดชะ	ผู้อำนวยการศูนย์		
๓๘	นางนงนุช คำเดชะ	ผู้อำนวยการศูนย์		
๓๙	นางนงนุช คำเดชะ	ผู้อำนวยการศูนย์		
๔๐	นางนงนุช คำเดชะ	ผู้อำนวยการศูนย์		

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๑










ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาววิภาดา ศรีรัมย์	เจ้าพนักงานธุรการ	วิภาดา	
๒	นางสาวอมรา คามอ	พนักงานทั่วไป	อมรา	
๓	นายปัญญาพล กุฑัณณ์	"	ปัญญาพล	
๔	นางสาวจิโรภรณ์ นุชพานิช	"	จิโรภ.	
๕	นางสาวสาวิศา สิงห์ศรี	"	สาวิศา	
๖	นางสาวศศิประภา อออง	"	ศศิประภา	
๗	น.ส. อธิภา นันทวัฒน์ตาก	พนักงานพัสดุ กอ	อธิภา	
๘	นาง กอภรณ์ คุ้ม	- ก -	กอภรณ์	
๙	นายบุญชู บุญวัฒน์	ช่างเขียน/ช่าง	บุญชู	
๑๐	น.ส. นันต์จิตา ชาติสิง	พนักงานทั่วไป	นันต์จิตา	
๑๑	น.ส. นภินันท์ นุชพานิช	พนักงานทั่วไป	นภินันท์	
๑๒	นางกมลทิพย์ นนทรัตน์	พนักงานทั่วไป	กมลทิพย์	
๑๓	น.ส. นันทิยา ทองอ้อย	พนักงานทั่วไป	นันทิยา	
๑๔	นายชุตติชัย สุขอน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชุตติชัย	
๑๕	นาย ศุภเรศม์ กิมทองดี	พนักงานทั่วไป	ศุภเรศม์	
๑๖	น.ส. วิภาดา อุดมผล	พนักงานพิมพ์ดีด	วิภาดา	
๑๗	นางสาวจิราภา นนทรัตน์	พนักงานพิมพ์ดีด ๕๔	จิราภา	
๑๘	น.ส. อ. อธิภา คุ้ม	พนักงานทั่วไป	อธิภา	

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.








ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๙	พ.ร. อาริณต์ สิงห์ชัย	พนักงานทั่วไป		
๒๐	นาย อรุณ น้อยกาฬ	ลูกจ้าง	อรุณ	
๒๑	นาย กฤษกร สิวะเก็ด	พนักงานทั่วไป		
๒๒	พ.ร. นรณิณี วัฒนาก	พนักงานทั่วไป	นรณิณี	
๒๓	น.ล. ธีระดา ทิมทิมศรี	พนักงานทั่วไป	ธีระดา	
๒๔	น.ร. อธิภา อยมอน	พนักงานทั่วไป	อธิภา	
๒๕	นาย อภิเดช พิเศษเด	พนักงานทั่วไป		
๒๖	นาย อธิษฐ์ เสงี่ยมอน	พนักงานทั่วไป	อธิษฐ์	
๒๗	น.ร. อภิภา อิทภา	พนักงานทั่วไป	อภิภา	
๒๘	น.ร. สิริวิมล นิลนง	พนักงานทั่วไป	สิริวิมล	
๒๙	นาง กสิมวดี สามีเสด็จ	พนักงาน	กสิมวดี	
๓๐	นาย อรรถ นีธราณีวงษ์	พนักงานทั่วไป		
๓๑	นาย อธิชัย นุชชัย	พนักงานทั่วไป	อธิชัย	
๓๒	นาย อธิชากร สนิทวงศ์	พนักงานขับรถ		
๓๓	นาย อธิชากร สนิทวงศ์	ช่างยนต์		
๓๔	นาย อธิชากร สนิทวงศ์			
๓๕	นาย อธิชากร สนิทวงศ์			
๓๖	นาย อธิชากร สนิทวงศ์	น.อ.ร.		

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๓๗	นายวิจิตร อรรถนรินทร์	ช่างสำรวจ/คส. ๑		
๓๘	นายวิรัตน์ วัฒนอน	พนักงานช่างสำรวจ		
๓๙	นายสุรเชษฐ์ อรรถนรินทร์	ช่างสำรวจ/คส. ๑		
๔๐	นายวิรัตน์ วัฒนอน	พนักงานช่างสำรวจ		
๔๑	นายวิจิตร อรรถนรินทร์	ช่างสำรวจ/คส. ๑		
๔๒	นายสุรเชษฐ์ อรรถนรินทร์	ช่างสำรวจ/คส. ๑		
๔๓	นายวิรัตน์ วัฒนอน	พนักงานช่างสำรวจ		
๔๔				
๔๕				
๔๖				
๔๗				
๔๘				
๔๙				
๕๐				
๕๑				
๕๒				
๕๓				
๕๔				

โครงการก่อสร้าง

ยินดีต้อนรับ

นายวรวิทย์ บุญยเนตร

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ในการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓




ประวัติ



ผังองค์กร



ผลงาน





ประวัติ



ผังองค์กร



ผลงาน

ทำเนียบผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

- | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------|
| ๑. นายเป็ร็องการ | สรวยสุวรรณ | พ.ศ.๒๕๔๖ |
| ๒. นายกฤษฎา | โภคการ | พ.ศ.๒๕๔๗ |
| ๓. นายณัฐพงศ์ | ศิริโชค | พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ |
| ๔. นายธนกิจ | นั้มวิญญา | พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ |
| ๕. นายนิเวศน์ | ธวัชรุ้งโรจน์ | พ.ศ.๒๕๕๖ |
| ๖. นายเกรียงไกร | ภาคพิเศษ | พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ |
| ๗. นายอุดม | คงช่วย | พ.ศ.๒๕๕๙ - ปัจจุบัน |



ประวัติ



ผังองค์กร



ผลงาน

ภารกิจงานตามคำสั่งกรมที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

๑. ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารชลประทานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ดำเนินการก่อสร้างโครงการตามภารกิจสำคัญที่กรมชลประทานมอบหมายเฉพาะ
๓. สายงานสนับสนุน ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ภารกิจหลักสำเร็จ




ประวัติ



ผังองค์กร



ผลงาน



โครงการก่อสร้าง

สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

- งานบริหารทั่วไป
- ฝ่ายวิศวกรรม
- ฝ่ายช่างกล
- ฝ่ายก่อสร้างที่ 1
- ฝ่ายก่อสร้างที่ 2
- ฝ่ายก่อสร้างที่ 3
- ฝ่ายก่อสร้างกิจกรรมพิเศษ



งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑



ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

ฝ่ายก่อสร้างกิจกรรมพิเศษ

นายอุดม คงช่วย
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ ๑๑





งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑




ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

ฝ่ายก่อสร้างกิจกรรมพิเศษ

บท.คส.๑๑

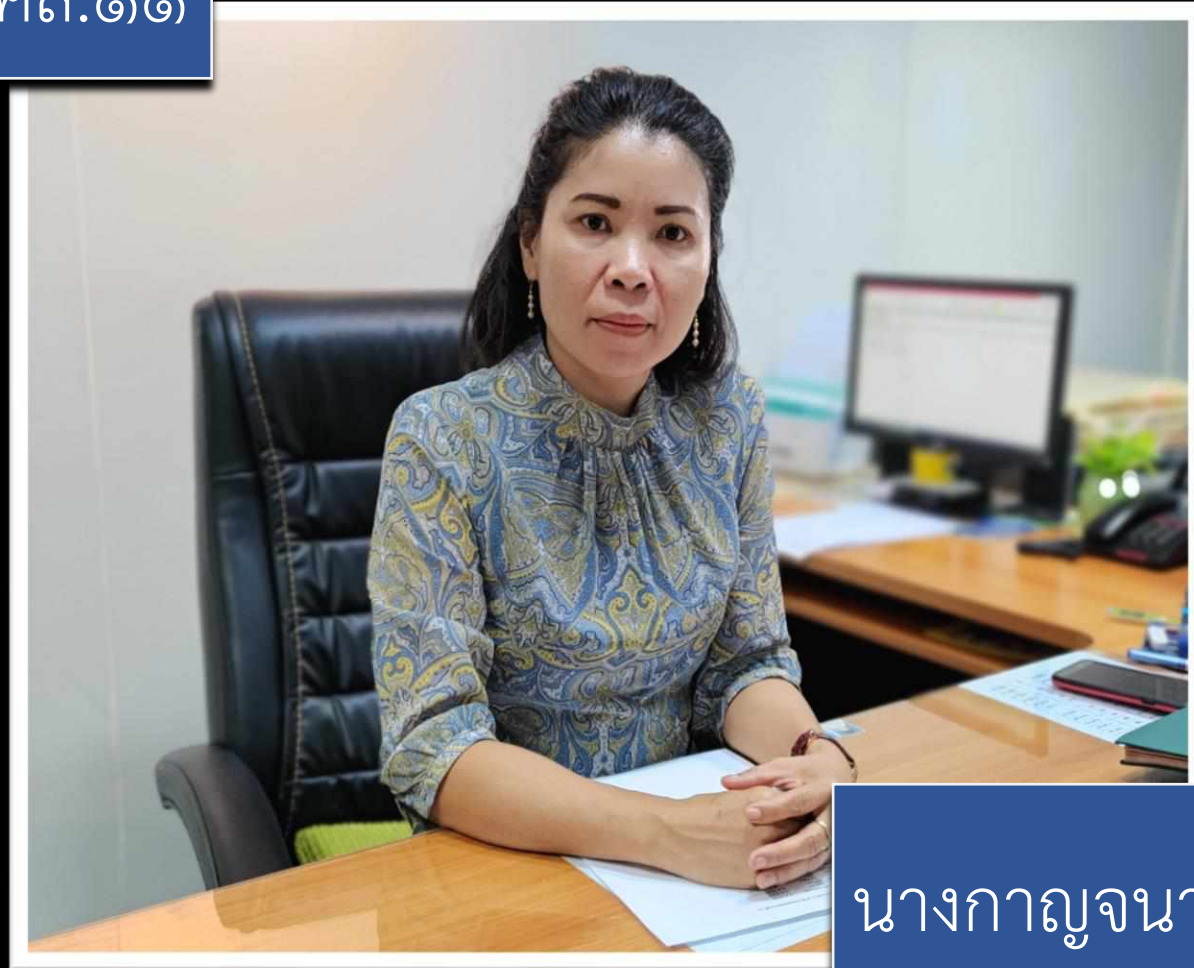

นางกาญจนา โยอาศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



หัวหน้าเจ้าหน้าที่



นางรุจิเรข พัชราพิณิจัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑



ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

ฝ่ายก่อสร้างกิจกรรมพิเศษ



วศ.คส.๑๑



งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑



ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

ฝ่ายก่อสร้างกิจกรรมพิเศษ

นายยุกทร วงษาไฮ

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ

นายกมลภพ แสงจินดา
วิศวกรชลประทานชำนาญการ

นายวิทวัส คามวัลย์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ



งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑



ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

ฝ่ายก่อสร้างกิจกรรมพิเศษ

ชก.คส.๑๑



นายชาญ พรรณเทวี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส



กส.๑ สป.๑๑



นายนิพนธ์ จันทร์ช่วง
นายช่างชลประทานอาวุโส

นายพัศณัฏฐ์ ยศสมบัติ
นายช่างชลประทานชำนาญงาน

นายธนาภูมิ คงศรี
นายช่างชลประทานปฏิบัติการ

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑



ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

ฝ่ายก่อสร้างกิจกรรมพิเศษ



กส.๒ ชป.๑๑



นายจรัญ ฑุยะวัฒน์
นายช่างชลประทานอาวุโส

นายวัลลภ บายไม่รู้โรย
นายช่างชลประทานชำนาญงาน

นายภาคภูมิ แก้วคุณเมือง
นายช่างชลประทานชำนาญงาน

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑



ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

ฝ่ายก่อสร้างกิจกรรมพิเศษ



กส.๓ ชป.๑๑

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑



ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

ฝ่ายก่อสร้างกิจกรรมพิเศษ



นายสุรเดช ศรีวิเศษ
วิศวกรชลประทานชำนาญการ

นายปิยราช ทูร์นไธสง
นายช่างชลประทานชำนาญงาน

นายชูวิทย์ วงศ์กาฬสินธุ์
นายช่างชลประทานชำนาญงาน



กพ.คส.๑๑



นายธีรวุฒิ ผลกล้า
นายช่างชลประทานชำนาญงาน

นายเกียรติศักดิ์ ลายหงษ์
นายช่างชลประทานชำนาญงาน

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑



ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

ฝ่ายก่อสร้างกิจกรรมพิเศษ



ประวัติ




ผังองค์กร



ผลงาน

ภารกิจงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ และส่งมอบงานแล้ว (บางส่วน)



งานก่อสร้างประตูละบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบ้านเจ้าขาว ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐



ประวัติ



ผังองค์กร



ผลงาน



งานปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งขวา ประตุนระบายน้ำคลองลาดโพธิ์ ต.ทรงคนอง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



ประวัติ



ผังองค์กร



ผลงาน





ประวัติ



ผังองค์กร



ผลงาน

งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (ติดแม่น้ำท่าจีน) ต.บ้านเกาะ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



งานก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลอง ๑๘ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒




ประวัติ



ผังองค์กร



ผลงาน

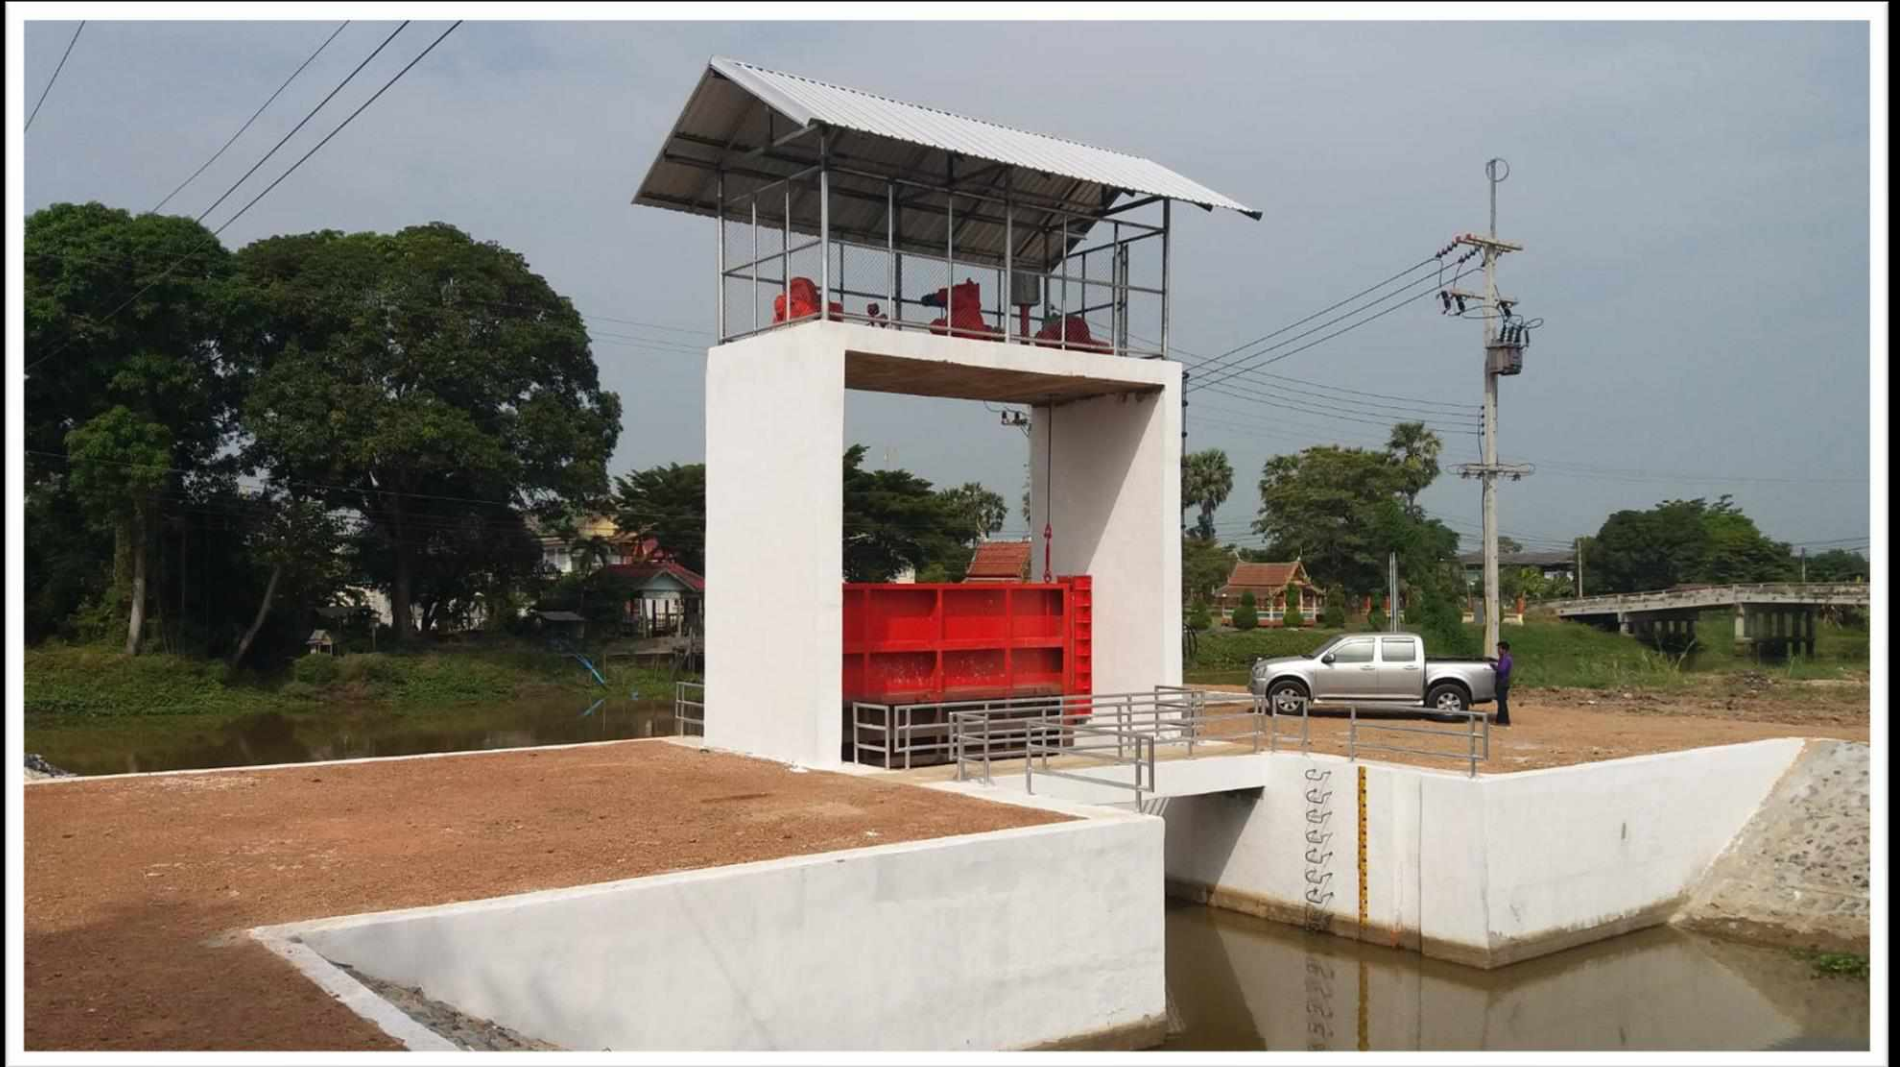



ประวัติ



ผังองค์กร



ผลงาน



ภารกิจงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
๒. งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๓. งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายย้อย จ.ปทุมธานี
๔. งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจิ้น จ.ปทุมธานี
๕. งานปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ ๓ กรุงเทพมหานคร
๖. แก้มลิงคลองเปรมประชากรพร้อมอาคารประกอบ กรุงเทพมหานคร
๗. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพร้อมชุดลอกบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๘. งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำปลายคลองบางซอ จ.สุพรรณบุรี
๙. งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองแจ๊กเพชร จ.สมุทรสาคร





รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของ สำนักงานชลประทานที่ 11





ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 มีดังนี้

1. ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรวม **3,490** ราย (เพิ่มขึ้น 10 ราย)
เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศทั้งหมด เข้าพักที่ state Quarantine
สถานที่กักกันรัฐบาล

- มาจากประเทศเยเมน **4** ราย
- มาจากประเทศอินเดีย **2** ราย
- มาจากประเทศอินโดนีเซีย **2** ราย
- มาจากประเทศพม่า **1** ราย
- มาจากประเทศเอธิโอเปีย **1** ราย

รักษาหายรวม **3,316** ราย (เพิ่ม 1) เสียชีวิต **58** ราย (ไม่เพิ่ม)





2. จังหวัดในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้แก่

1. จังหวัดสมุทรปราการ
 2. จังหวัดนนทบุรี
 3. จังหวัดปทุมธานี
 4. จังหวัดสมุทรสาคร
- ไม่มีผู้ติดต่อเพิ่ม

3. จังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้แก่

1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. นครปฐม
 3. ฉะเชิงเทรา
- ไม่มีผู้ติดต่อเพิ่ม





4. บุคลากรในสังกัด สำนักงานชลประทานที่ 11 ไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่พบกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
5. มาตรการลดความแออัดในสถานที่ทำงาน จากบุคลากรในสังกัด สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 806 ราย มีปฏิบัติงานหลัอมเวลา 467 ราย 58% ปฏิบัติงานจากบ้าน – (ไม่มี) ปฏิบัติงานภาคสนาม 339 ราย 42%
6. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานชลประทานที่ 11 ยังปฏิบัติการต่อเนื่อง ผู้เข้าสถานที่ทำงาน ของสำนักงานชลประทานที่ 11 ต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ไม่เกิน 37.50 องศา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล เข้าอุโมงค์มาเชื้อ และรักษาระยะห่างเวลาจัดกิจกรรม



ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่รัฐบาลได้ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพิ่ม 1-30 กันยายน 2563
ยังต้องรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านของเรา
สถานการณ์ในอาเซียน

- ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น
มากกว่า 3,500 ราย
- พม่า ขยับอันดับผู้ติดเชื้อสะสมแซงหน้าไทยแล้ว มีผู้ติดเชื้อ 3,502 ราย
และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในหลัก 300 รายต่อวัน และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง




จบการรายงาน



รายงานการบุกรุก ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ผู้บุกรุกเดิม (อดีต-2546)

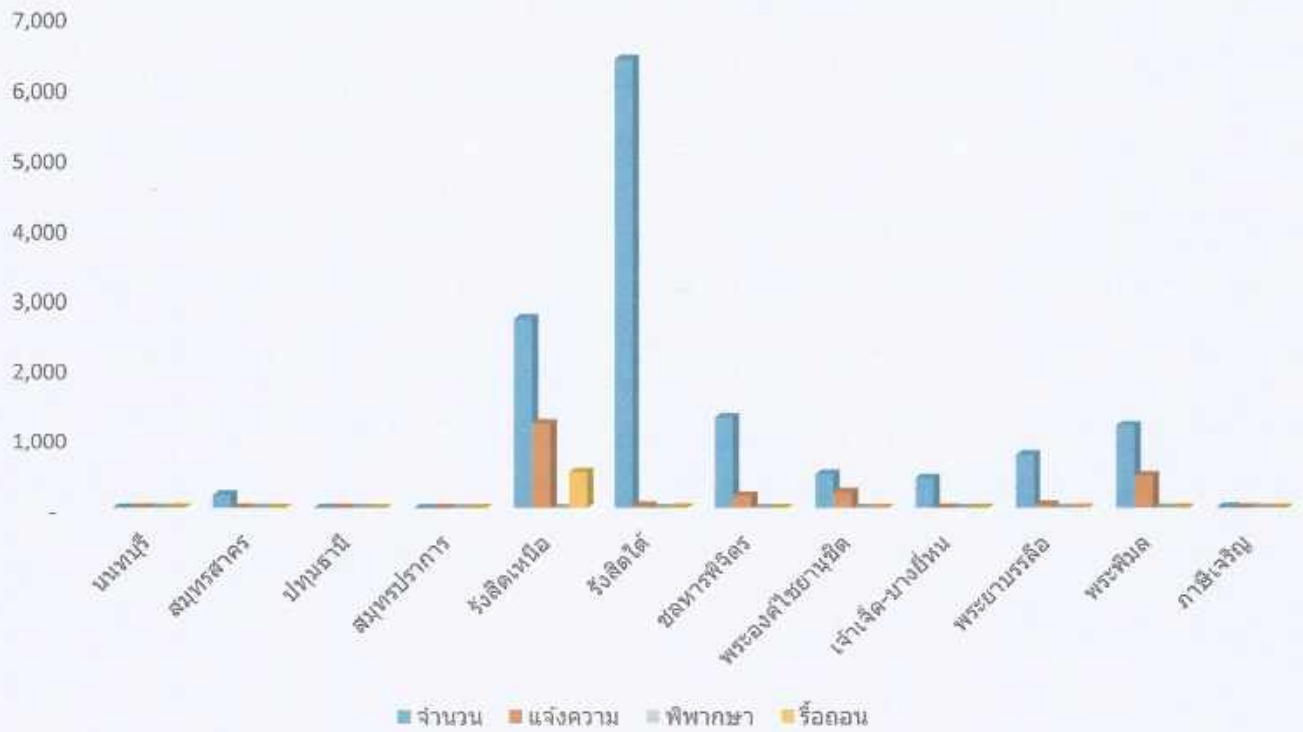

บุกรุกใหม่ (2547-ปัจจุบัน)



สถานการณ์น้ำและผลการเพาะปลูก


17 กันยายน 2563

พายุระดับ 3



(โซนร้อน) "โนอึล (NOUL)"

วันที่ 16 กันยายน 2563
เวลา 17.00 น.

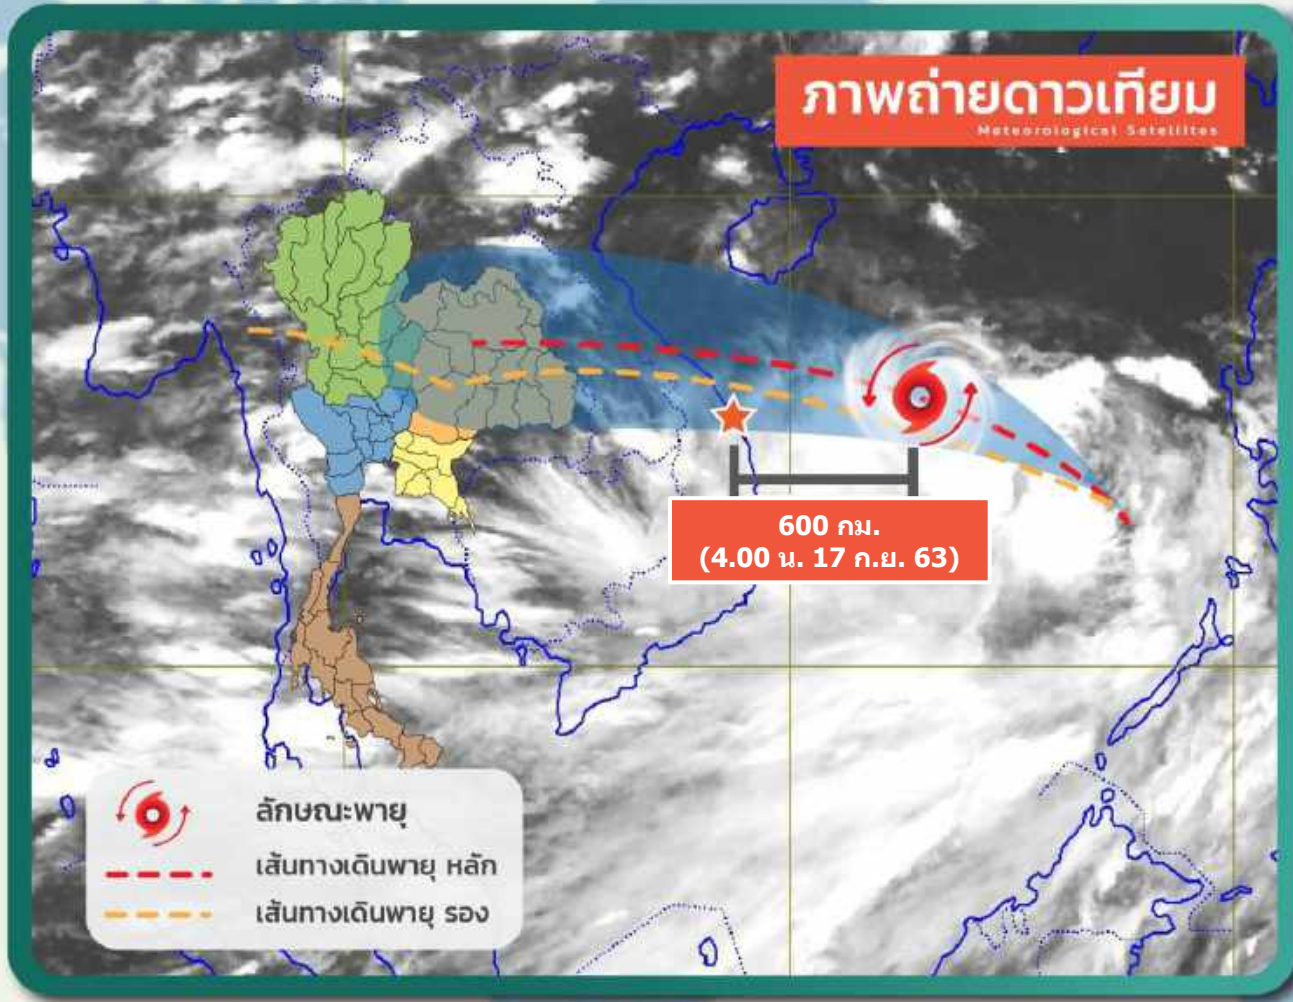

พายุระดับ 3 (โซนร้อน) **"โนอึล"**
มีศูนย์กลางห่างจากเมืองดานัง
ประเทศเวียดนามประมาณ **900**
กิโลเมตร

ละติจูด **11 องศาเหนือ**
ลองจิจูด **105 องศาตะวันออก**

ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง
80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม
วันที่ 18 ก.ย. 63

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ระหว่างวันที่ 18 ก.ย. – 20 ก.ย. 63) และความน่าจะเป็นของพายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล"



พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก
ระหว่างวันที่ 18 ก.ย. – 20 ก.ย. 63)

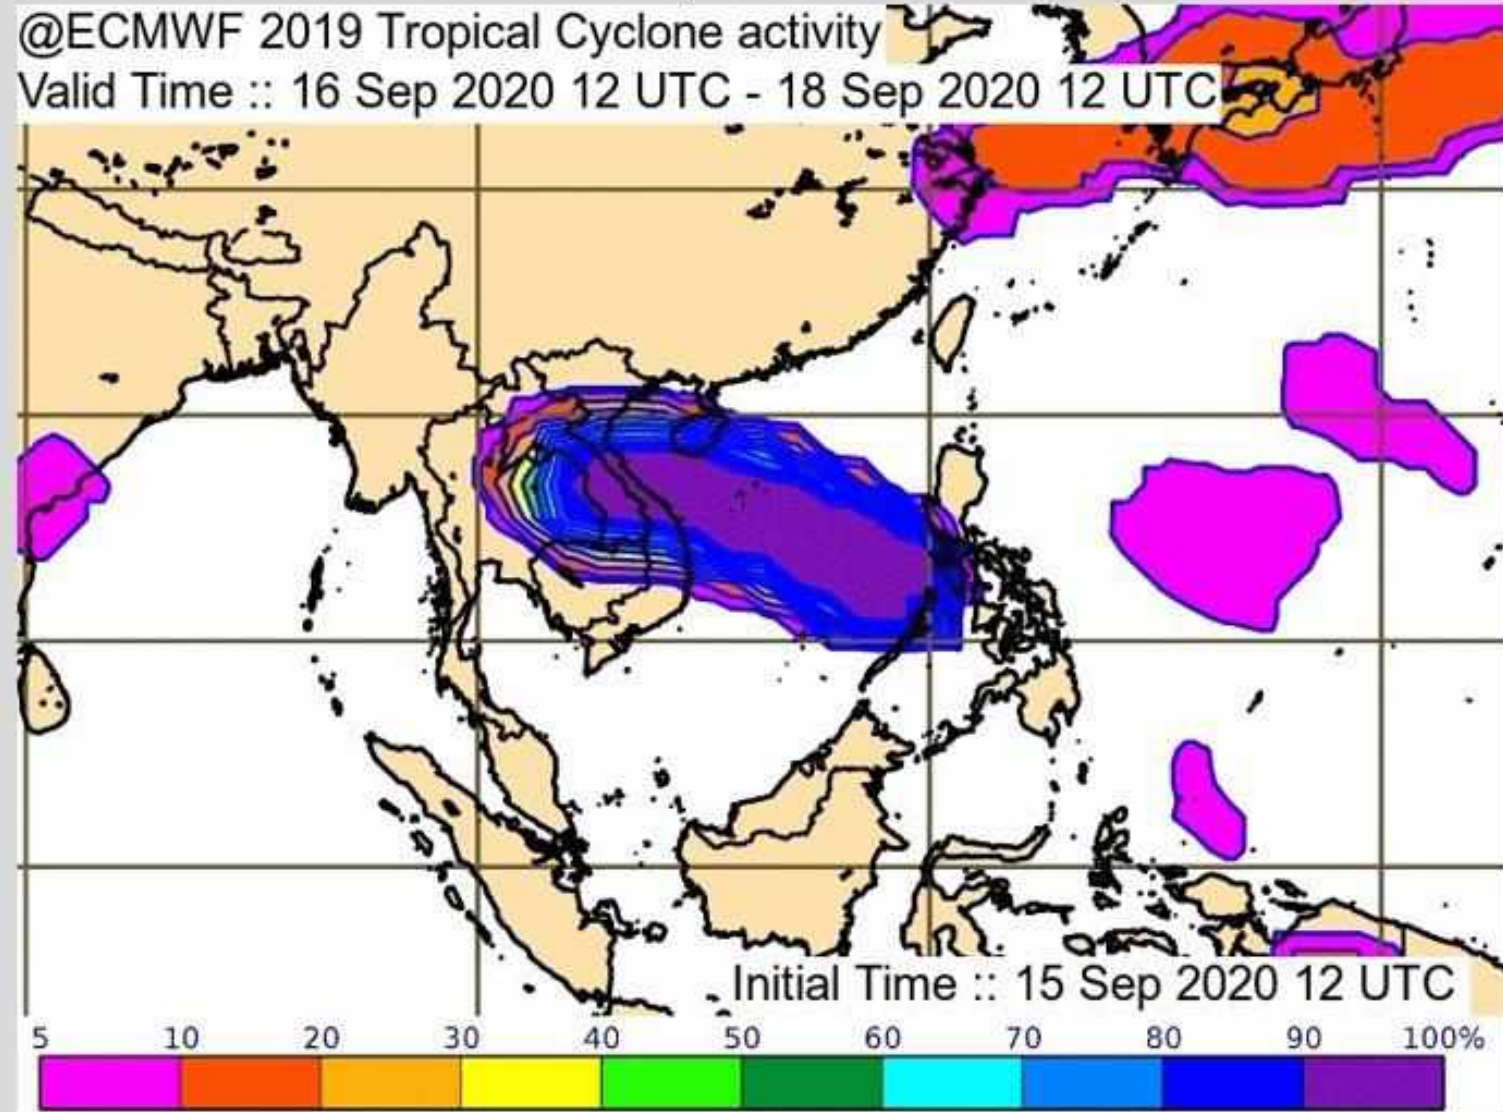

ความน่าจะเป็นของการก่อตัวเป็นพายุโซนร้อน จาก
ศูนย์พยากรณ์ยุโรประยะกลาง (ECMWF)



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เอกสารแนบ 5 / หน้า 4

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ โทร ๐ ๒๖๖๙ ๒๕๖๐

ที่ สบอ(ปน.)๐๘/ ๓๕๐ / ๒๕๖๓ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุระดับ ๓ (โซนร้อน) “โนอึล” (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓)

เรียน ผส.ชป.๑ - ๑๗ และ ผส.คก. สำเนาเรียน อธช. รองอธิบดี และ ผทว.บร.

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง "พายุระดับ ๓ (โซนร้อน) “โนอึล” (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓)" เนื่องจาก พายุระดับ ๓ (โซนร้อน) “โนอึล” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ ๕ (ไต้ฝุ่น) คาดว่าเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง และจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากนั้นภาคเหนือและภาคอื่นๆ จะมีผลกระทบในระยะต่อไป ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน จึงขอให้สำนักงานชลประทานที่ ๑-๑๗ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการโครงการชลประทานและ/หรือมอบหมายบุคลากรประจำอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หากมีกรณีฝนตกหนัก หรือลมกระโชกแรงจนส่งผลกระทบต่ออาคารชลประทาน และทรัพย์สินของทางราชการให้เข้าไปดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้คอยติดตาม ตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม


๒. ให้ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งร่วมบูรณาการกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ และสำเนาเรื่องมายังกรมชลประทานเพื่อแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมออกเป็นคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในการแจ้งเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

๓. เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบคโฮ/รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที รวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ในกรณีเกิดสถานการณ์ ให้สรุปรายงานสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมถ่ายภาพ และดำเนินการช่วยเหลือให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) โดยช่องทาง e-mail: wmsc.1460@gmail.com, Line Square: SWOC CENTER, Line: SWOC Executive และLine: SWOC F&D


จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป


(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)
รชบ.


16 กันยายน 2563

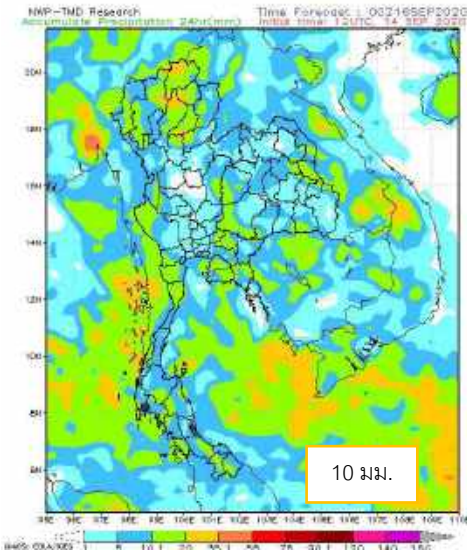


17 กันยายน 2563

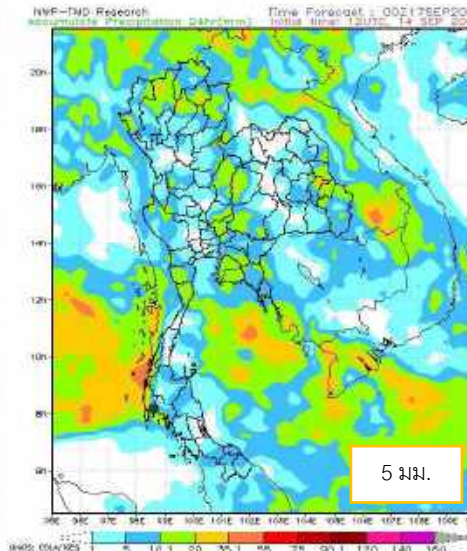


18 กันยายน 2563

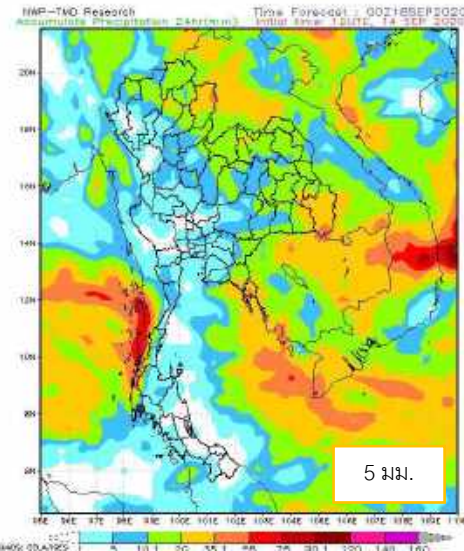


19 กันยายน 2563

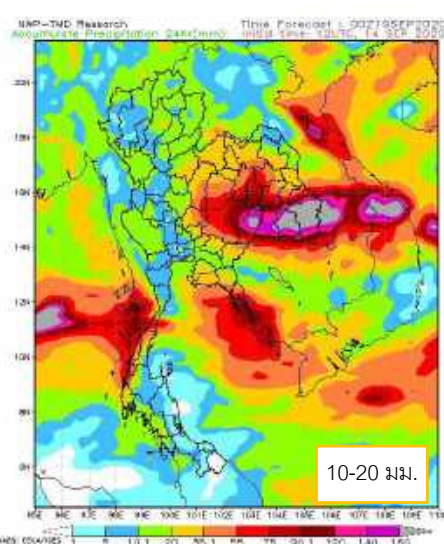


20 กันยายน 2563

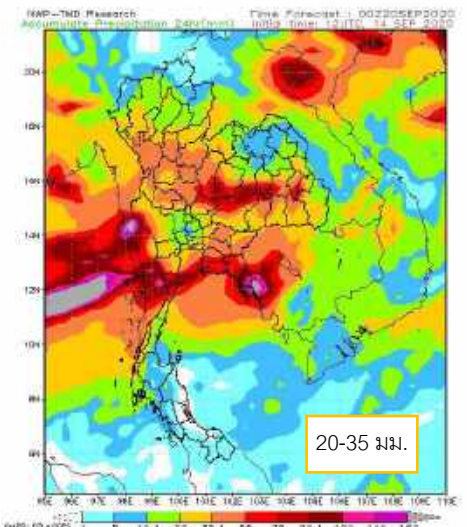

21 กันยายน 2563

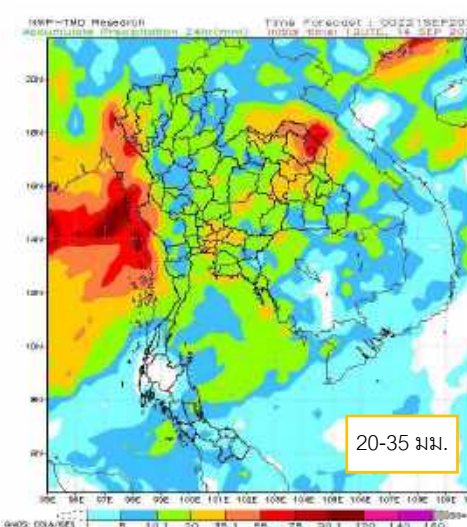


22 กันยายน 2563

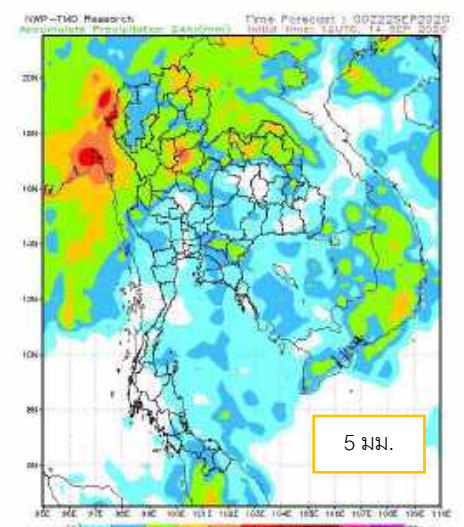

หมายเหตุ


1. ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
2. แสดงค่าเฉพาะในเขต สขบ.11

แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง 7 วัน ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 11

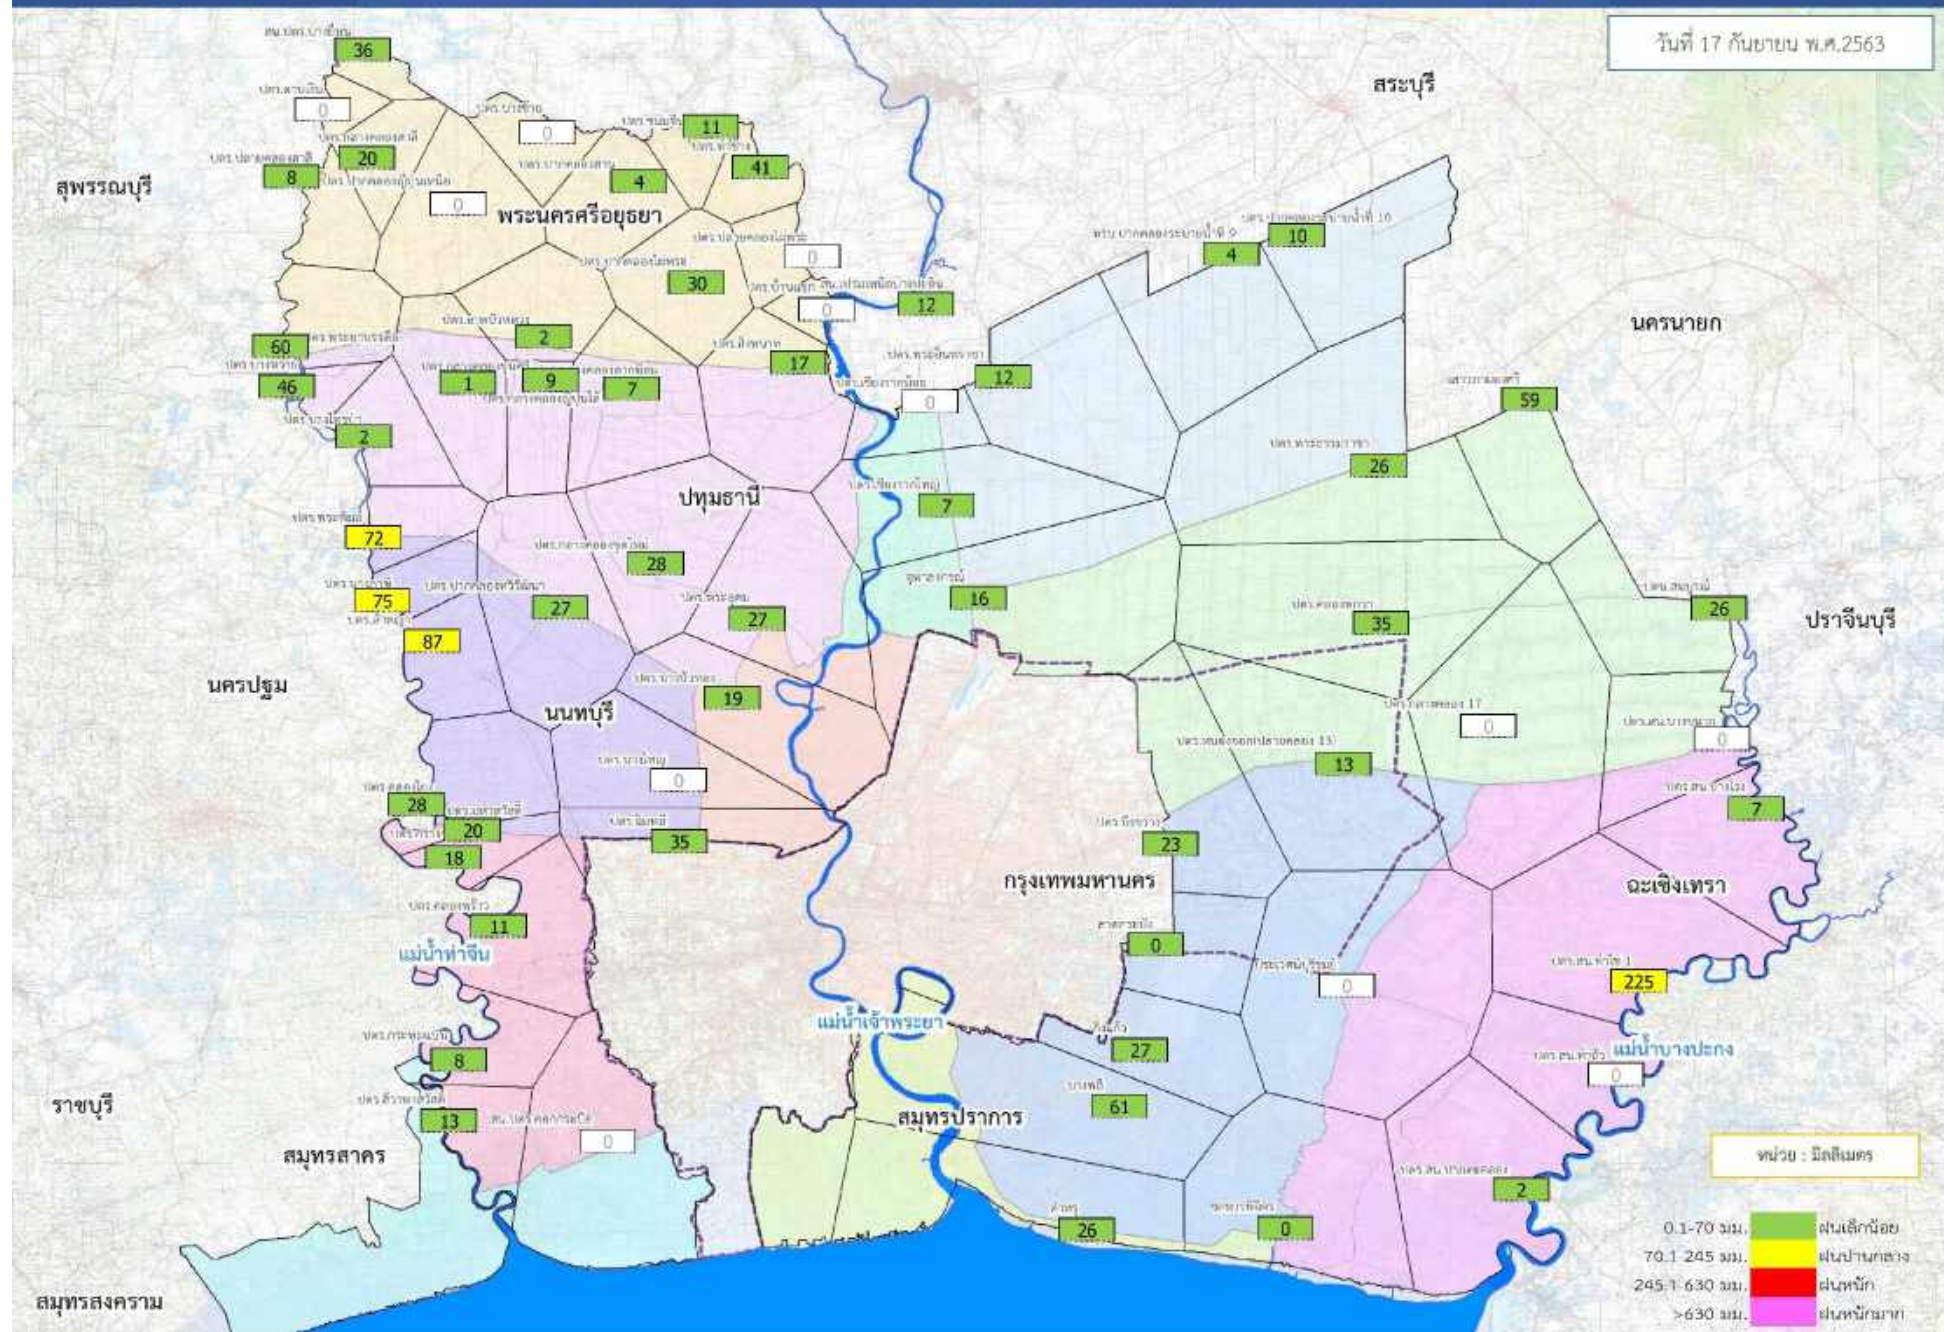



รวม 4 เขื่อน	ปริมาณน้ำทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)
16 ก.ย. 63	10,152 (41%)	3,456 (19%)
16 ก.ย. 62	11,808 (47%)	5,112 (28%)

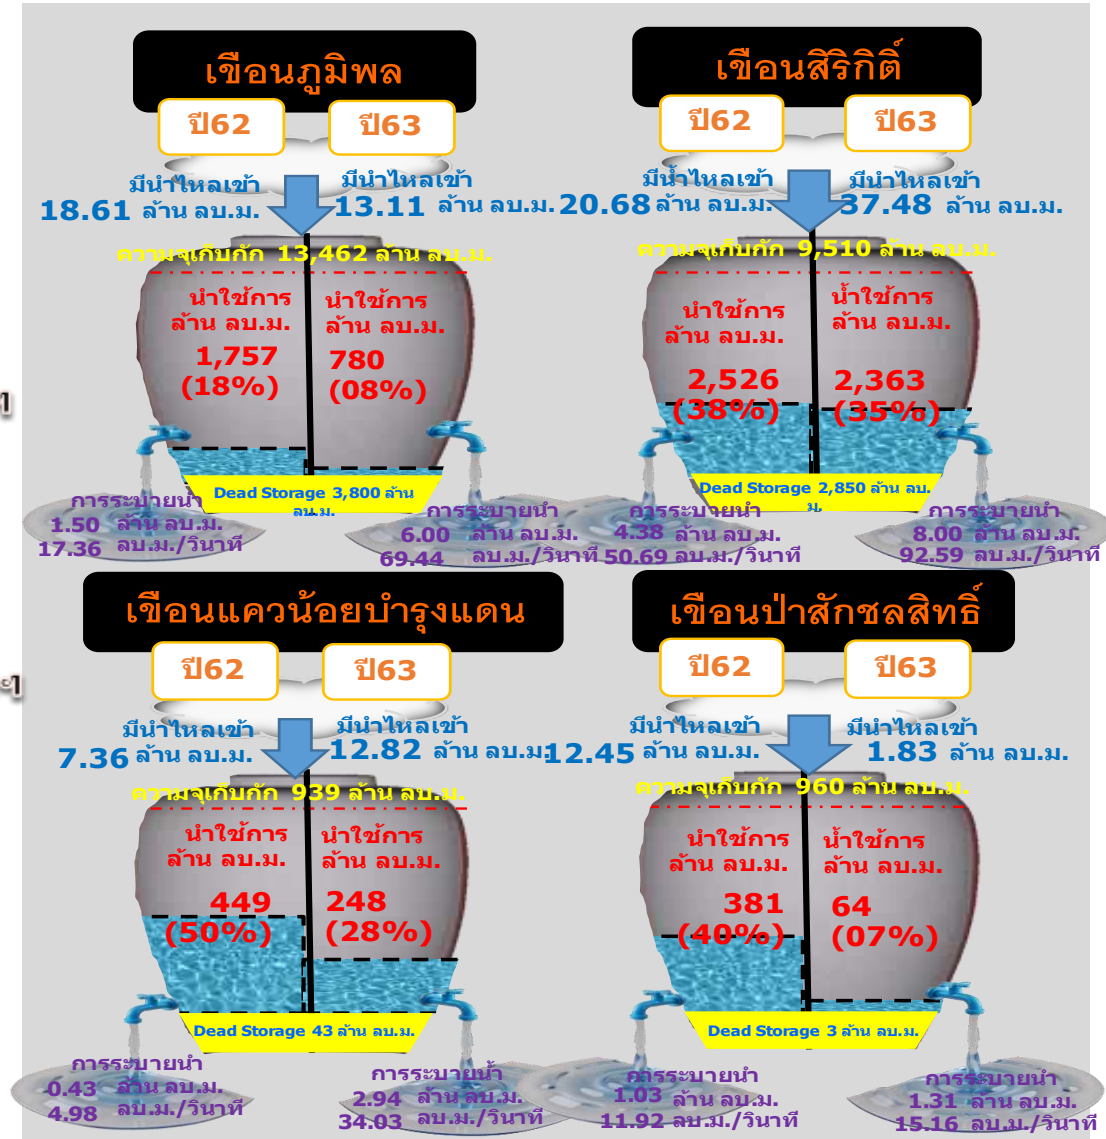



คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การใน 4 เขื่อนหลัก ณ วันที่ 1 พ.ย. 2563

ปี	ปริมาณ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1-พ.ย.-61	9,706	72	5,906	61
1-พ.ย.-62	5,934	44	2,134	22
1 พ.ย.63 (น้ำมาก)	6,769	50	2,969	31
1 พ.ย.63 (น้ำเฉลี่ย)	5,552	58	2,702	41
1 พ.ย.63 (น้ำน้อย)	5,312	56	2,462	37
1 พ.ย.63 กรณี ปี 2538	6,412	48	2,612	27
1 พ.ย.63 กรณีน้ำ AVG-5%	5,778	43	1,978	20
1 พ.ย.63 กรณี ปี 2553	7,288	54	3,488	36

เขื่อนภูมิพล

1 พฤศจิกายน 2560
น้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก 14,187 ล้าน ลบ.ม.

1 พฤศจิกายน 2561
น้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก 12,840 ล้าน ลบ.ม.

1 พฤศจิกายน 2562
น้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก 5,377 ล้าน ลบ.ม.

คาดการณ์ 1 พฤศจิกายน 2563
น้ำใช้การ 4 เขื่อนน้ำAVG-5% 5,678 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์

ปี	ปริมาณ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1-พ.ย.-61	8,348	88	5,498	83
1-พ.ย.-62	5,294	56	2,444	37
1 พ.ย.63 (น้ำมาก)	6,031	63	3,181	48
1 พ.ย.63 (น้ำเฉลี่ย)	5,552	58	2,702	41
1 พ.ย.63 (น้ำน้อย)	5,312	56	2,462	37
1 พ.ย.63 กรณี ปี 2538	6,465	68	3,615	54
1 พ.ย.63 กรณีน้ำ AVG-5%	5,452	57	2,602	39
1 พ.ย.63 กรณี ปี 2553	6,363	67	3,513	53

เขื่อนแควน้อย

ปี	ปริมาณ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1-พ.ย.-61	740	79	697	78
1-พ.ย.-62	495	53	452	50
1 พ.ย.63 (น้ำมาก)	578	62	535	60
1 พ.ย.63 (น้ำเฉลี่ย)	474	50	431	48
1 พ.ย.63 (น้ำน้อย)	332	35	289	32
1 พ.ย.63 กรณี ปี 2538	568	60	525	59
1 พ.ย.63 กรณีน้ำ AVG-5%	454	48	411	46
1 พ.ย.63 กรณี ปี 2553	695	74	652	73

คาดการณ์ปริมาณน้ำรวม 4 เขื่อนหลัก 5 กรณี

ปี	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1 พ.ย.61	19,536	79	12,840	71
1 พ.ย.62	12,073	49	5,377	30
1 พ.ย.63 (น้ำมาก)	14,339	58	7,643	42
1 พ.ย.63 (น้ำเฉลี่ย)	12,681	51	5,985	33
1 พ.ย.63 (น้ำน้อย)	11,526	46	4,830	27
1 พ.ย.63 กรณี ปี 2538	14,404	58	7,708	42
1 พ.ย.63 กรณีน้ำ AVG-5%	12,374	50	5,678	31
1 พ.ย.63 กรณี ปี 2553	15,307	62	8,611	47

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ปี	ปริมาณ (ล้าน ลบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	%
1-พ.ย.-61	742	77	739	77
1-พ.ย.-62	349	36	346	36
1 พ.ย.63 (น้ำมาก)	960	100	957	100
1 พ.ย.63 (น้ำเฉลี่ย)	769	80	766	80
1 พ.ย.63 (น้ำน้อย)	415	43	412	43
1 พ.ย.63 กรณี ปี 2538	960	100	957	100
1 พ.ย.63 กรณีน้ำ AVG-5%	689	72	686	72
1 พ.ย.63 กรณี ปี 2553	960	100	957	100


ข้อมูลวันที่ 17 ก.ย. 63




สัญลักษณ์	สถานะ
▲ (Red Triangle)	วิกฤตน้ำท่วม
▲ (Yellow Triangle)	เฝ้าระวังน้ำท่วม
● (Green Circle)	ปกติ
▼ (Yellow Inverted Triangle)	เฝ้าระวังน้ำแล้ง
▼ (Red Inverted Triangle)	วิกฤตน้ำแล้ง
⊙ (Blue Circle)	ไม่ได้รับรายงานข้อมูล



แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก 16 กันยายน 2563

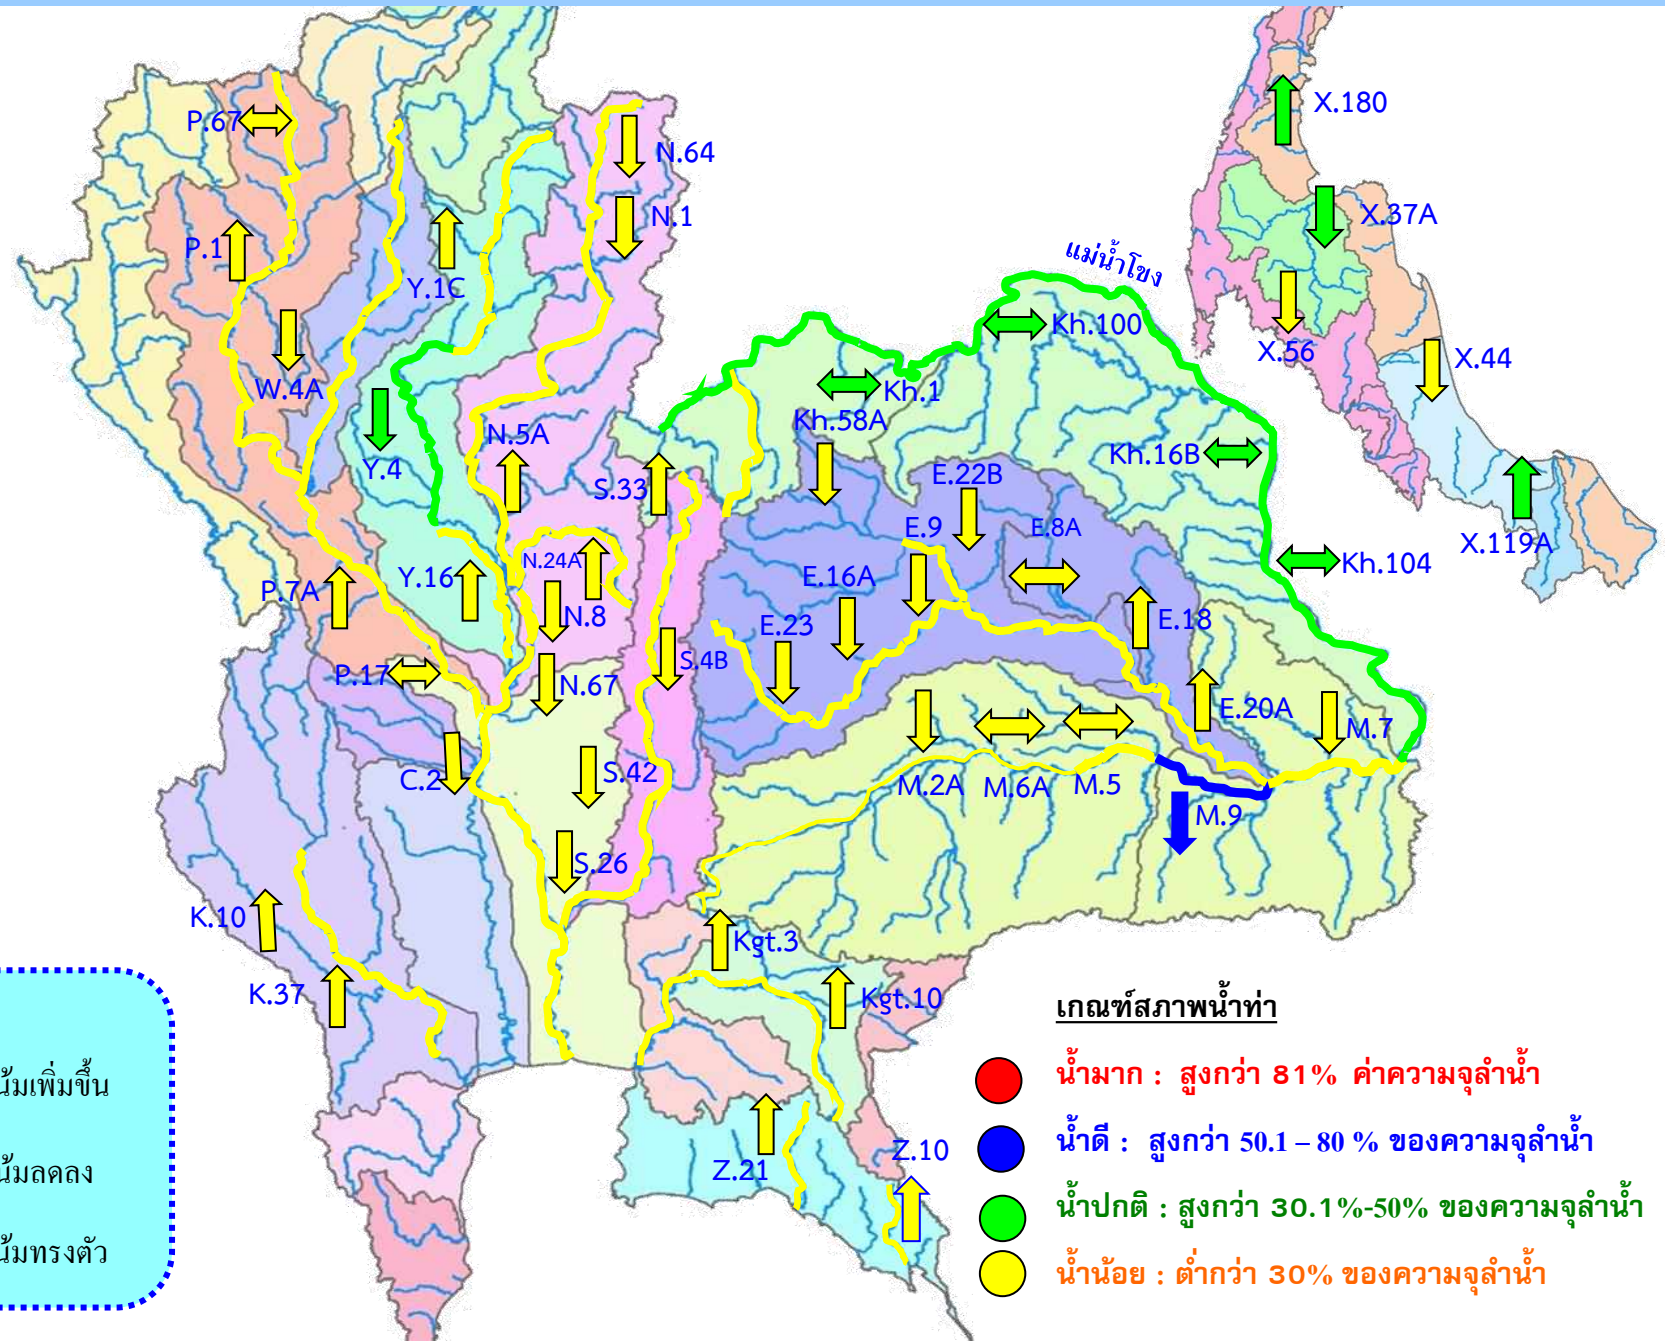

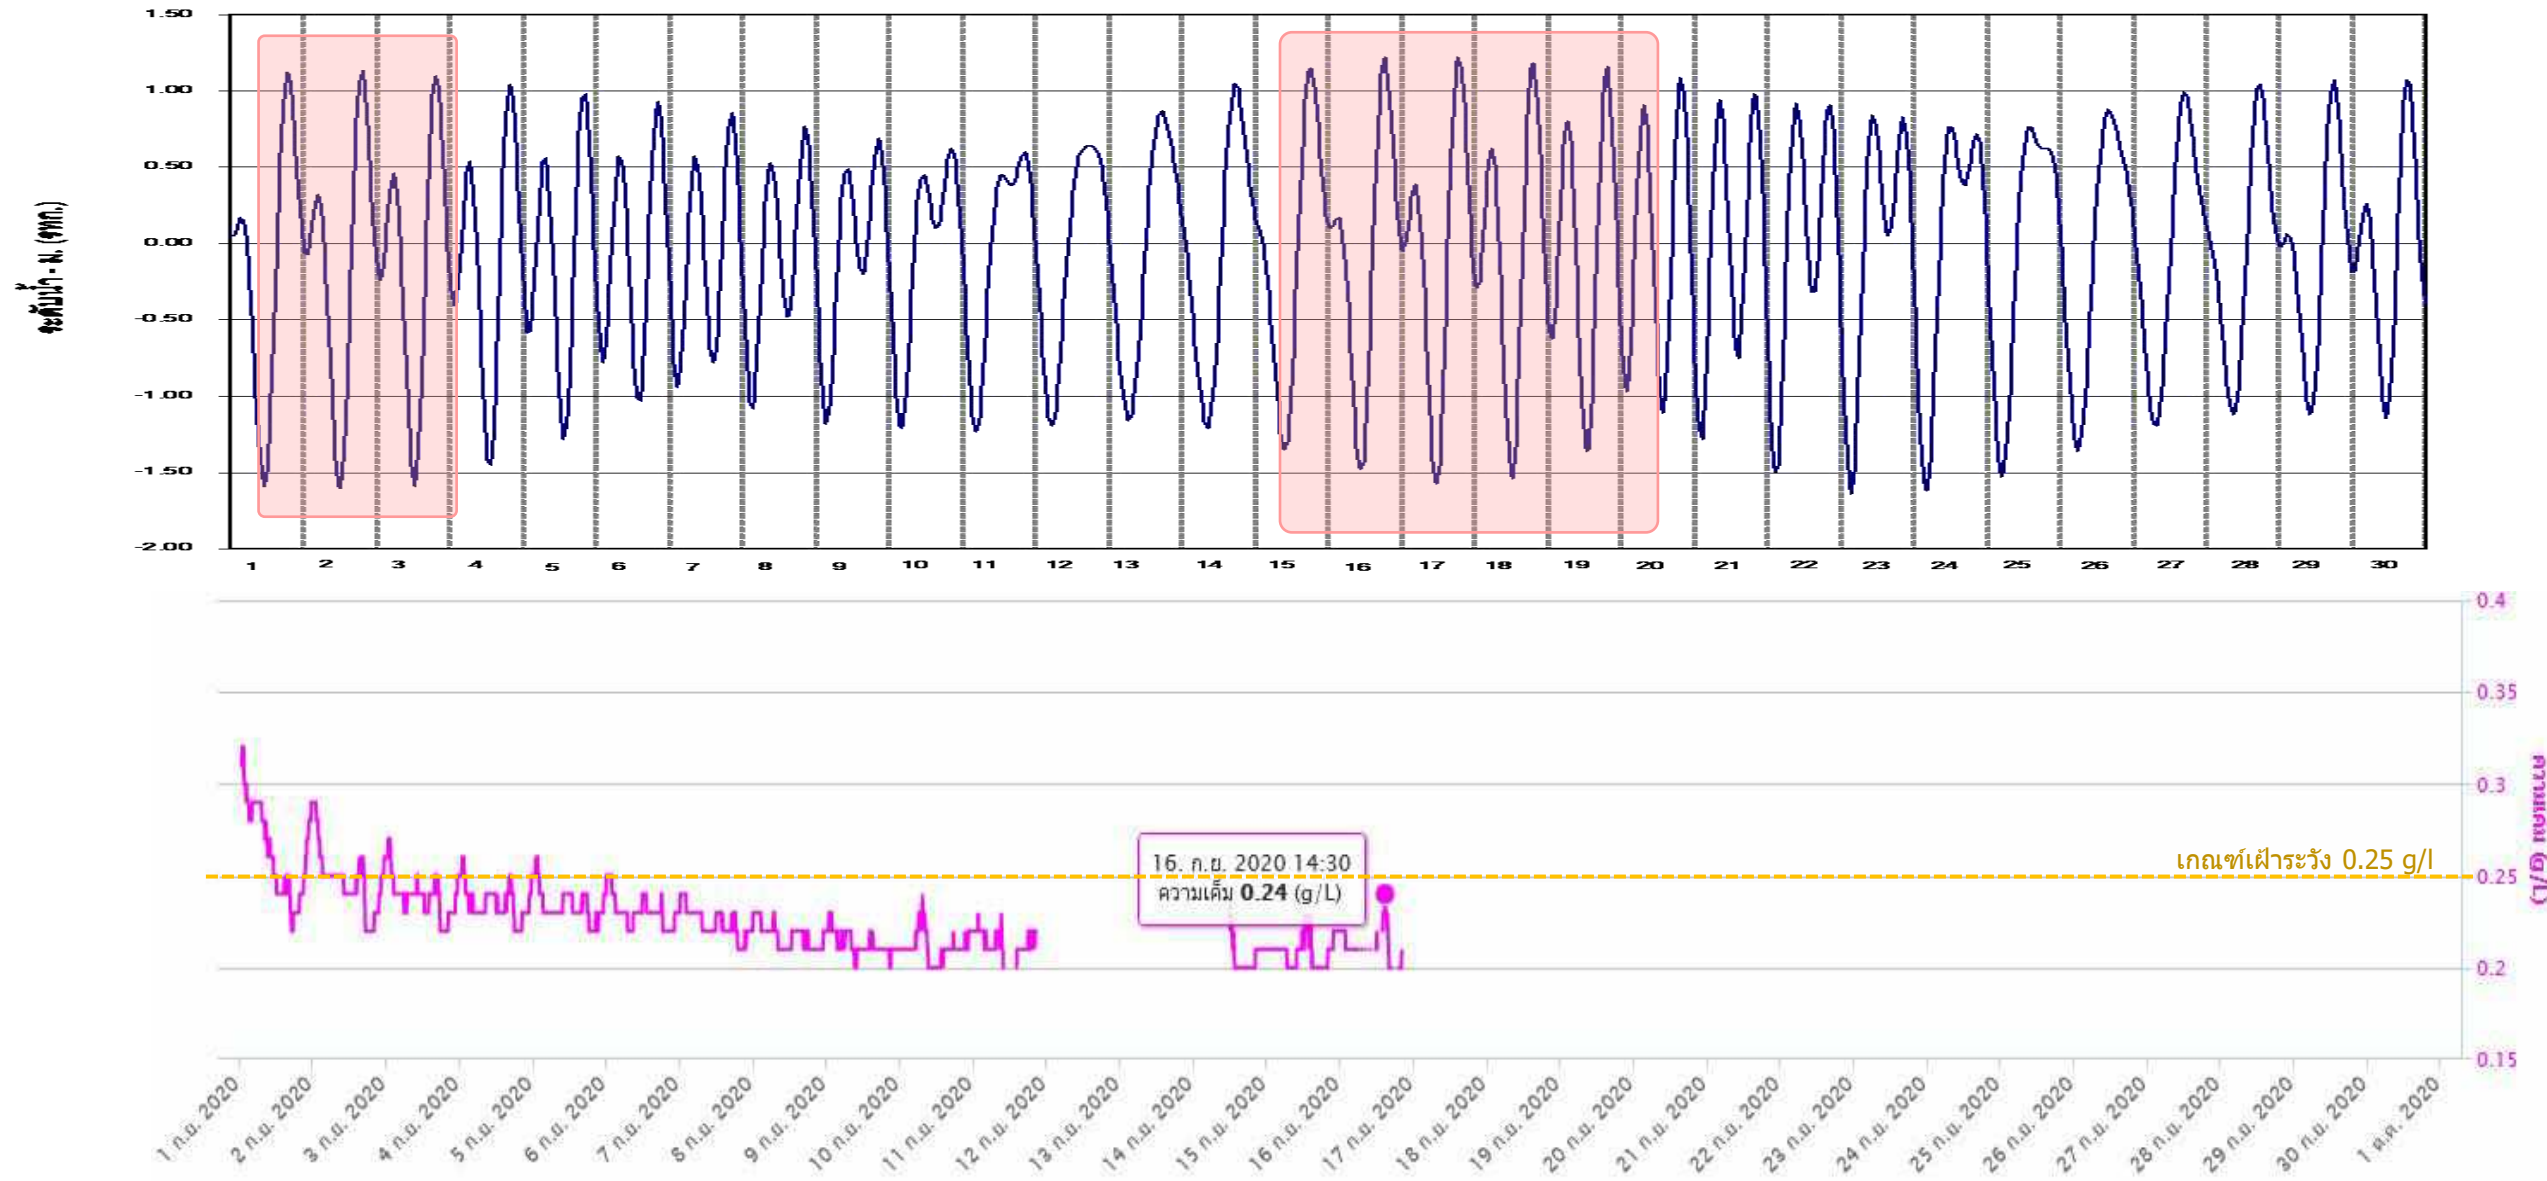




รายงานค่าความเค็ม ระดับน้ำและปริมาณน้ำที่สูบน้ำได้ สถานีสูบน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-บางพระ เดือน กันยายน 2563



วันที่	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)	คลองพระองค์ (ต้นทาง)		อ่างเก็บน้ำบางพระ(ปลายทาง)		หมายเหตุ
			สูบได้วัน	บจกสะสม	สูบได้วัน	บจกสะสม	
22 มี.ย 63 - 31 ส.ค 63			8,373,800.00		5,735,390		
1	0.45	0.488	414,900	414,900	411,450	411,450	M3,4,5
2	0.47	0.489	415,500	830,400	416,570	831,020	M3,4,5
3	0.43	0.492	413,500	1,244,200	412,680	1,243,700	M3,4,5
4	0.40	0.481	415,100	1,659,300	420,630	1,664,830	M3,4,5
5	0.39	0.488	412,800	2,072,100	411,750	2,076,410	M3,4,5
8	0.42	0.486	413,900	2,486,000	412,130	2,488,540	M3,4,5
7	0.51	0.497	410,500	2,896,500	411,260	2,899,800	M3,4,5
6	0.51	0.490	408,300	3,305,100	408,420	3,308,220	M3,4,5
9	0.48	0.498	407,700	3,712,800	413,530	3,722,050	M3,4,5
10	0.44	0.491	410,100	4,122,900	414,630	4,138,680	M3,4,5
11	0.37	0.498	408,900	4,529,800	407,710	4,544,390	M3,4,5
12	0.32	0.491	410,100	4,939,900	408,600	4,950,990	M3,4,5
13	0.30	0.486	407,500	5,347,400	407,970	5,358,960	M3,4,5
14	0.25	0.486	405,400	5,752,800	407,650	5,768,610	M3,4,5
15	0.24	0.499	403,900	6,156,700	408,580	6,176,190	M3,4,5
16	0.28	0.497					
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
27							
28							
29							
30							
31							
รวมสะสมรายเดือน			6,156,700		6,176,190		
รวมสะสมทั้งปี			12,530,500		11,914,550		

รวมสูบน้ำต้นทาง 12,530,500 ลบ.ม.

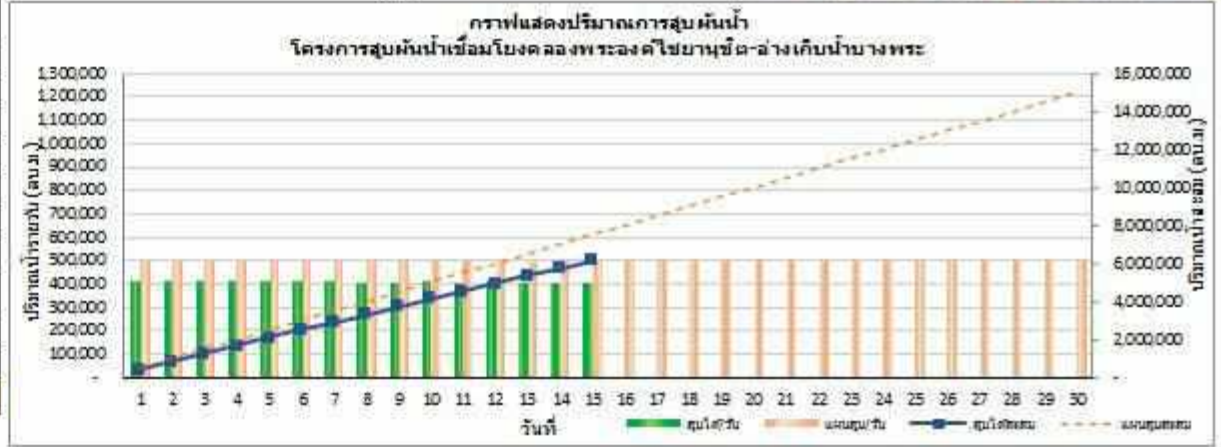


หมายเหตุ - คัดลอกหน้าจอน้ำ 8.00น.เมื่อวาน - 8.00น.วันนี้


กราฟแสดงระดับน้ำรายวัน
(หน้าสถานีสูบน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต)



กราฟแสดงค่าความเค็มรายวัน
(หน้าสถานีสูบน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต)

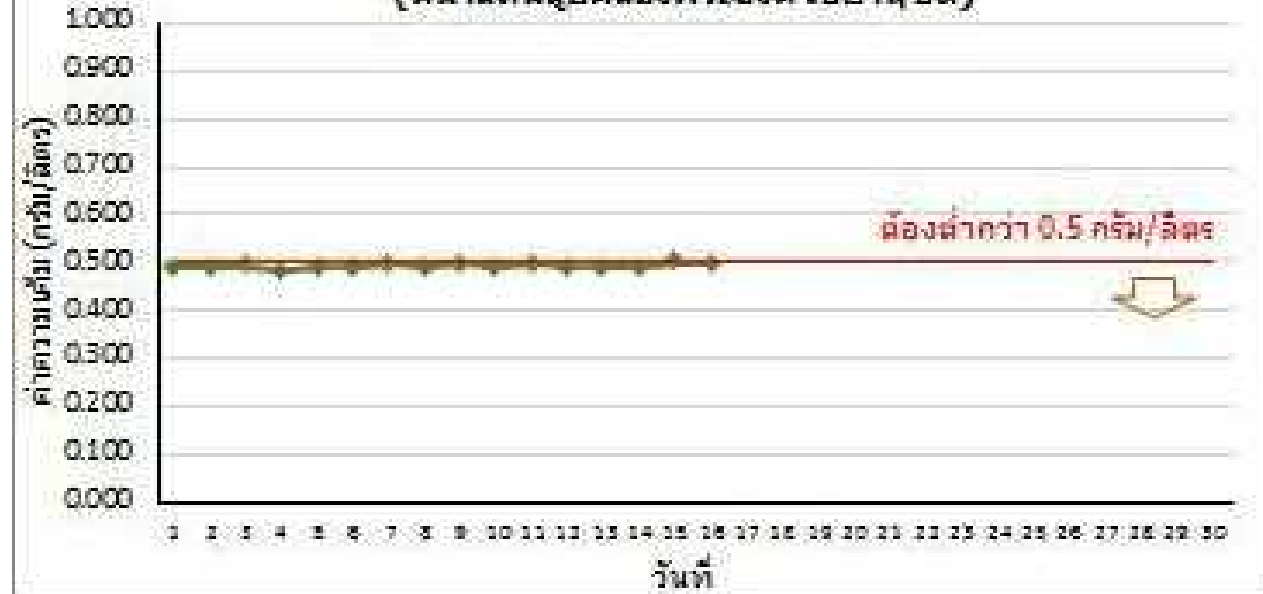

รายงานสถานะพื้นที่เพาะปลูกข้าวโครงการฯ สขป.11 ปี 2563

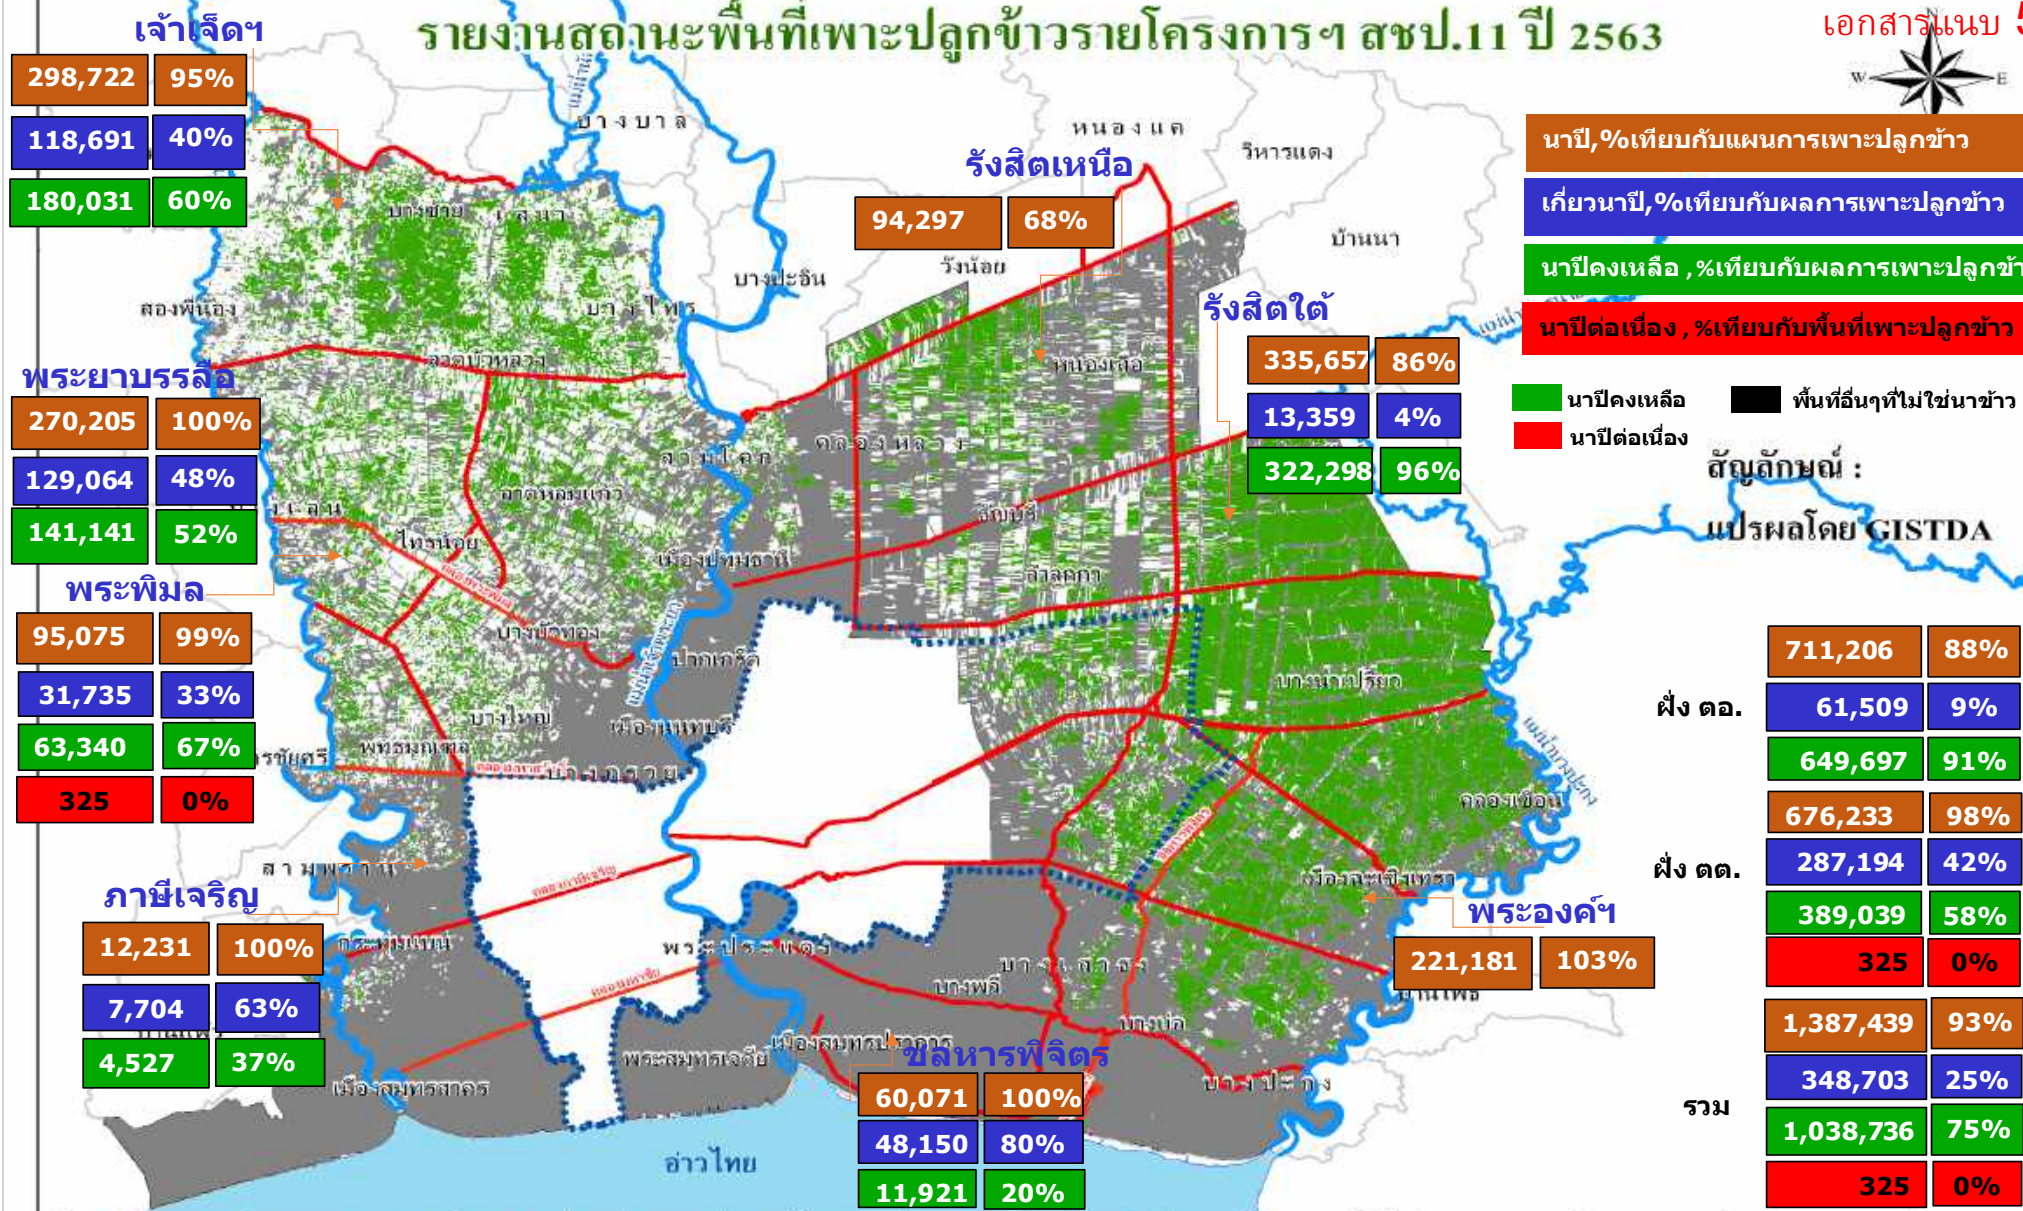

สัญลักษณ์ :
 ■ นาปีคงเหลือ ■ พื้นที่อื่นที่ไม่ใช่ข้าว
 ■ นาปีคตเนื่อง

แปรผลโดย GISTDA

ที่มา : ระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)
 คำเตือน พื้นที่ปลูกข้าวจากข้อมูลดาวเทียมที่แสดงในแผนที่นี้ แสดงไว้โดยประมาณเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลผลการเพาะปลูกกรมชลประทาน จากระบบฐานข้อมูลเกษตร กรมชลฯ 8 ก.ย. 63
 2) แผนที่การแปรผลพื้นที่เพาะปลูกข้าว GISTDA จากระบบติดตามการเพาะปลูกจากข้อมูลดาวเทียม ณ 31 ส.ค. 63

ที่ กษ ๐๓๒๐/๕๔๖



สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปรัง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ตามที่กรมอุตุพยากรณ์อากาศเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งปัจจุบันปริมาณฝนที่ตกในเขตภาคกลางมีปริมาณสม่ำเสมอเพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวนาปี แต่เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน นั้น

เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตของเกษตรกร จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปีแล้วให้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อทำการเก็บเกี่ยวแล้วขอให้ชะลอการปลูกข้าวไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ บุญเนตร)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๖๖๐๘

ขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์ชะลอการ
เพาะปลูกข้าวนาปรัง

ผลการตรวจสอบวัชพืช



วันที่ตรวจสอบวัชพืช
17 กันยายน 2563


การกำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร

- กำลังดำเนินการ 14 ชุด
- ระหว่างรอขนย้าย 1 ชุด (จว 29)

สัญลักษณ์

- วัชพืชหนาแน่น (70% - 100%)
- วัชพืชหนาแน่น (40% - 70%)
- แผนที่กำจัดวัชพืชเพิ่มเติมครั้งที่ 1
- แผนที่กำจัดวัชพืชเพิ่มเติมครั้งที่ 2

จว = เรือกำจัดวัชพืช
จต = รถแทรกเตอร์
จถ = รถชุด
จข = เรือชุด

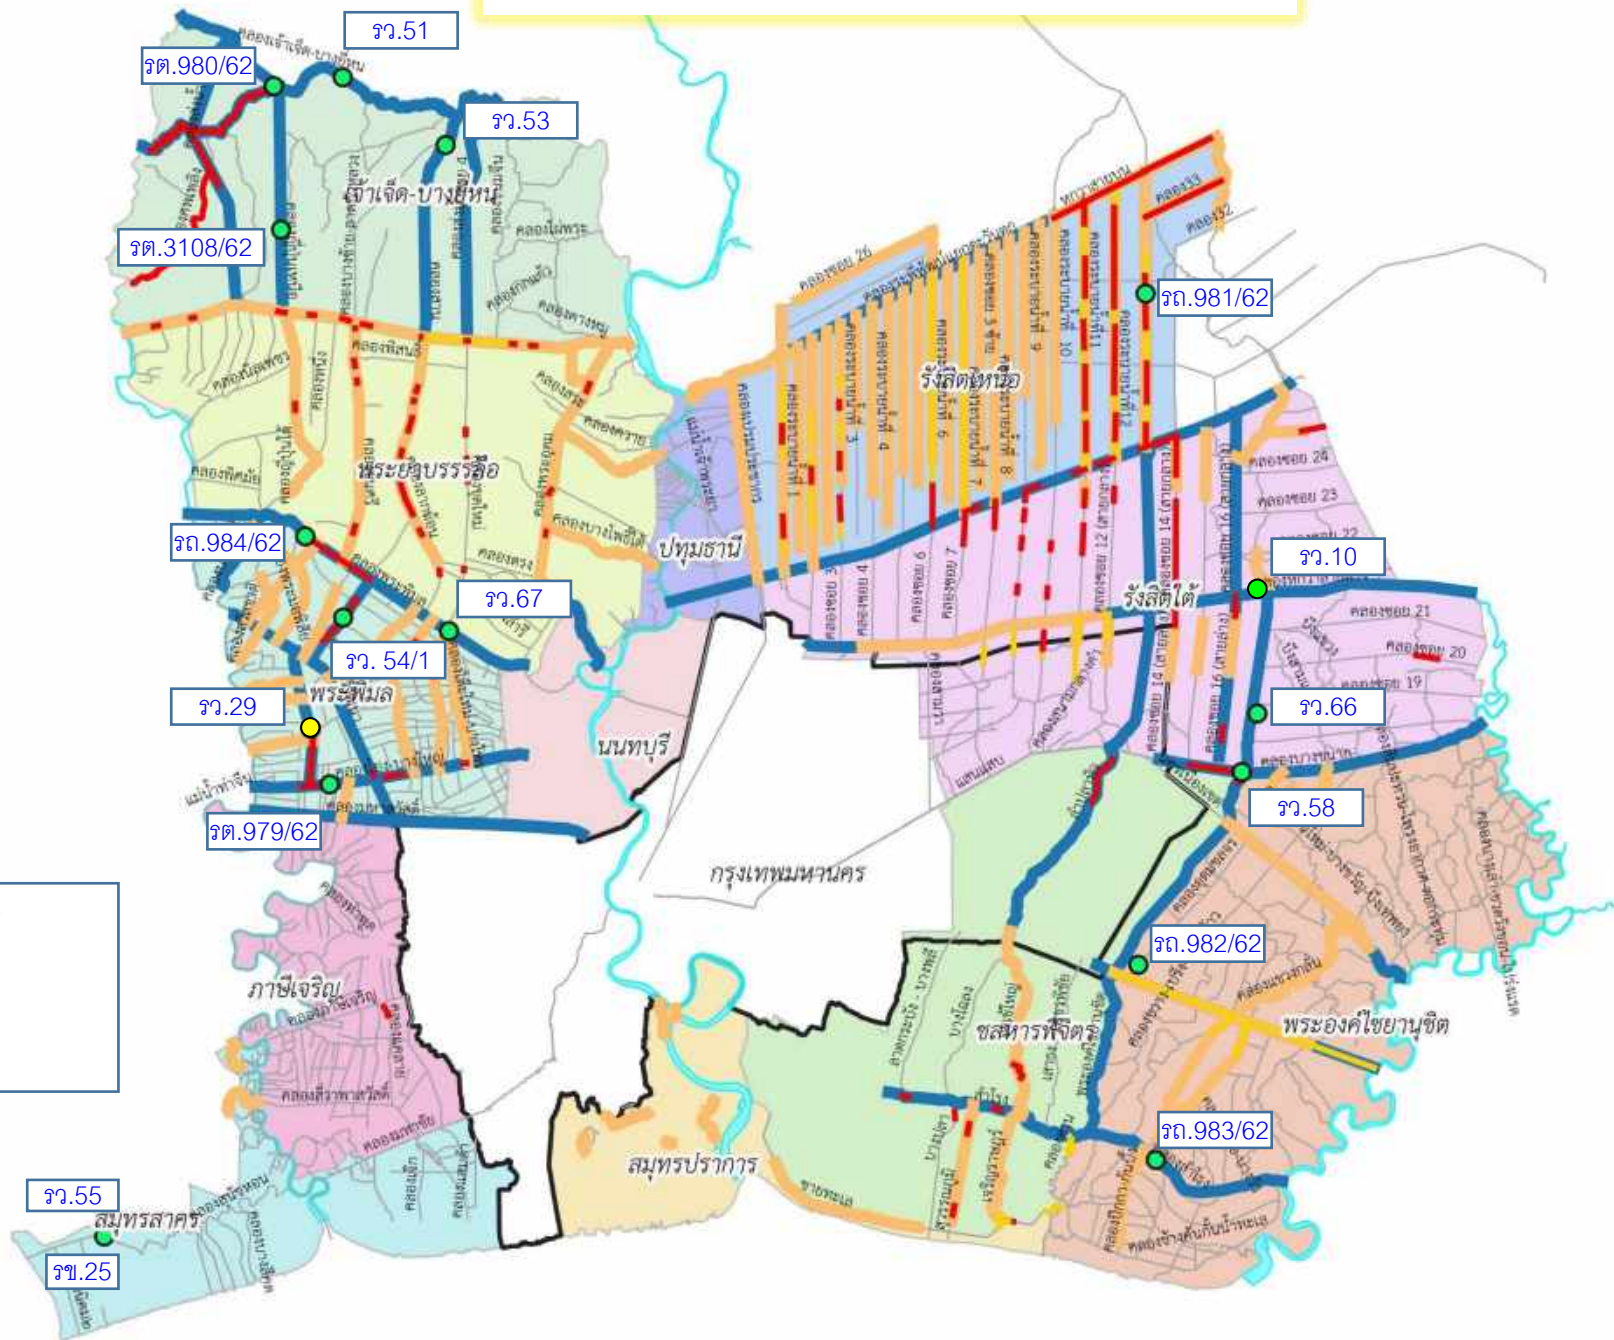



จบการนำเสนอ
ครับ



งบประมาณรายจ่าย
และ
รายละเอียด
ประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของ

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563



ส่วนแผนงาน ฝ่ายติดตามและประเมินผล


สำนักงานชลประทานที่ 11

สำนักงานชลประทานที่ 11 อยู่ลำดับที่ 17 ด้ร้อยละ 38.85

หน่วย : ล้านบาท

ค่าเฉลี่ย ผลการเบิกจ่ายกรมชลประทาน 68.01 %

เปอร์เซ็นต์

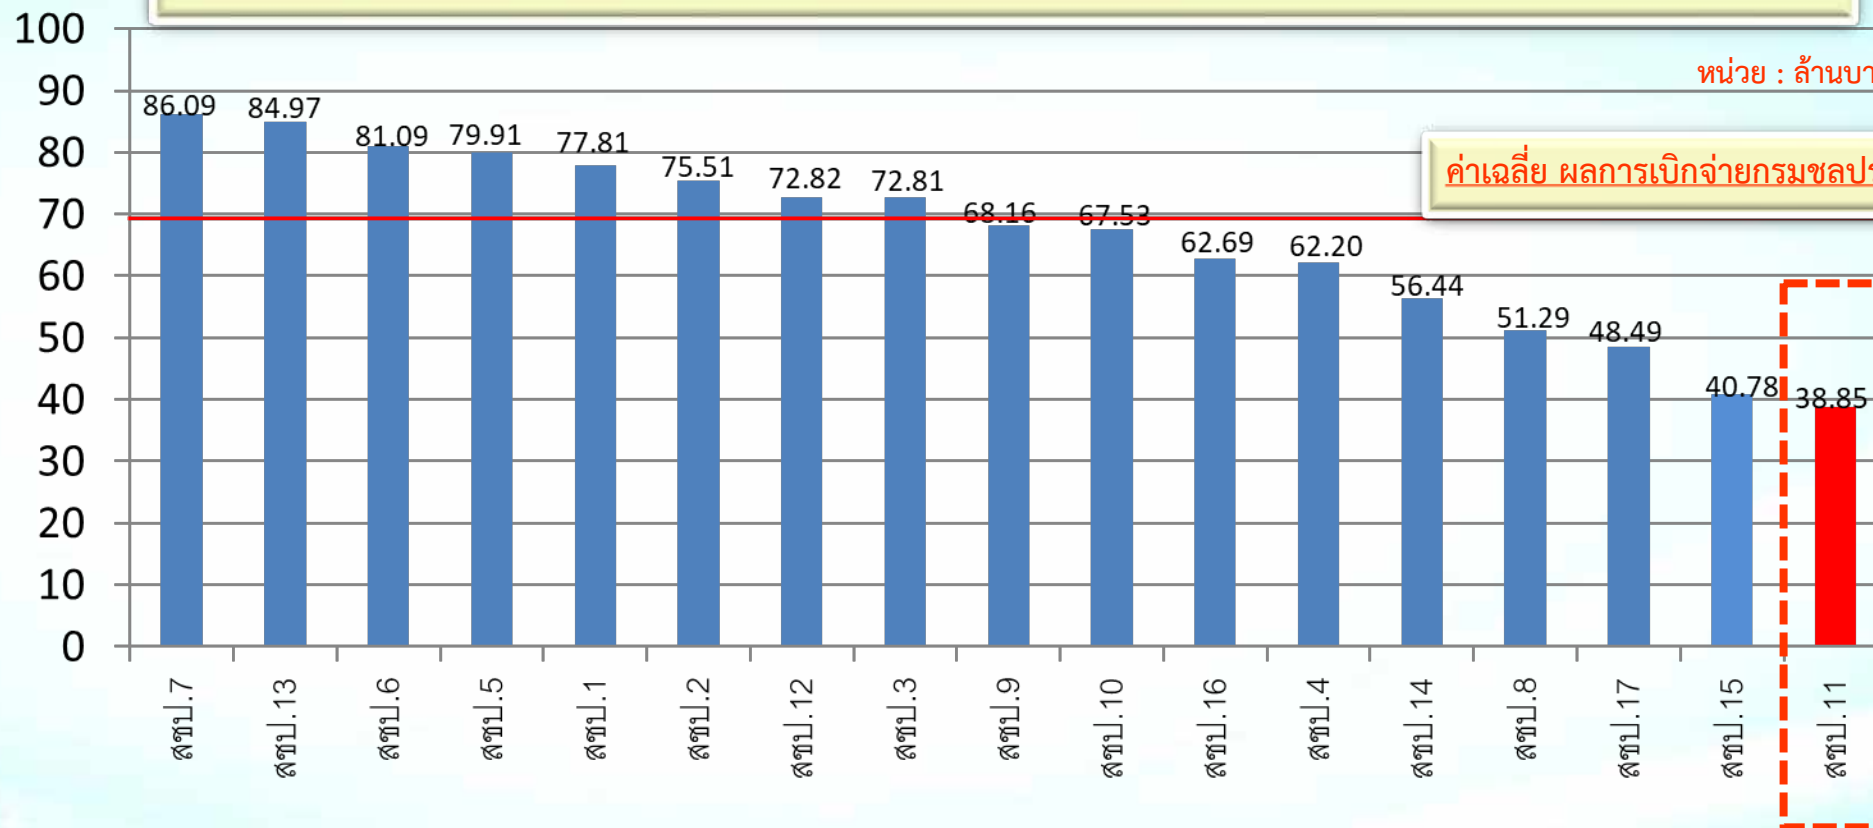

■ ผลการเบิกจ่าย สชป. 1- 17


ผลการเบิกจ่าย สชป.11 ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 ด้ร้อยละ 38.85

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะงบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2563

โครงการ / หน่วยงาน	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
สำนักงานชลประทานที่ 1	1,053,673,122	87,047,416	966,625,706	819,836,007	14,490,090	805,350,979	77.81
สำนักงานชลประทานที่ 2	1,103,689,508	117,518,734	986,170,776	833,408,490	89,327,410	744,081,076	75.51
สำนักงานชลประทานที่ 3	1,047,675,209	169,139,317	878,535,891	762,822,192	61,358,816	701,463,377	72.81
สำนักงานชลประทานที่ 4	1,220,261,543	175,787,076	1,044,474,467	758,946,918	47,408,882	711,538,036	62.20
สำนักงานชลประทานที่ 5	2,011,466,834	346,110,821	1,665,356,013	1,607,266,741	162,944,391	1,444,322,350	79.91
สำนักงานชลประทานที่ 6	2,682,263,163	523,296,927	2,158,975,236	2,174,994,473	281,802,880	1,894,449,639	81.09
สำนักงานชลประทานที่ 7	2,710,277,828	381,229,767	2,329,048,062	2,333,347,109	209,845,619	2,123,502,227	86.09
สำนักงานชลประทานที่ 8	2,271,309,964	732,824,691	1,538,485,273	1,165,033,173	163,340,434	1,001,692,768	51.29
สำนักงานชลประทานที่ 9	2,297,935,654	582,848,340	1,715,087,315	1,566,212,957	343,510,255	1,222,702,703	68.16
สำนักงานชลประทานที่ 10	1,020,732,044	458,271,678	562,317,767	689,293,383	223,967,706	470,613,044	67.53
สำนักงานชลประทานที่ 11	1,702,494,988	1,026,743,146	675,751,842	661,407,584	153,381,037	508,822,547	38.85
สำนักงานชลประทานที่ 12	2,506,989,179	1,211,669,093	1,295,320,086	1,825,643,353	726,745,485	1,098,897,868	72.82
สำนักงานชลประทานที่ 13	1,017,695,148	48,333,807	969,361,341	864,742,319	33,505,232	831,237,088	84.97
สำนักงานชลประทานที่ 14	2,490,328,043	436,217,668	2,054,110,375	1,405,541,717	90,990,226	1,314,551,491	56.44
สำนักงานชลประทานที่ 15	1,401,446,590	964,961,012	436,485,578	571,478,607	209,541,534	363,742,851	40.78
สำนักงานชลประทานที่ 16	1,547,137,082	1,131,410,127	415,726,955	969,938,364	612,608,447	357,329,917	62.69
สำนักงานชลประทานที่ 17	1,075,297,324	893,365,728	168,378,373	521,405,091	376,271,952	150,599,425	48.49

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(พ.ร.บ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลการเบิกจ่าย สขป.11 ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 ได้ร้อยละ 38.85

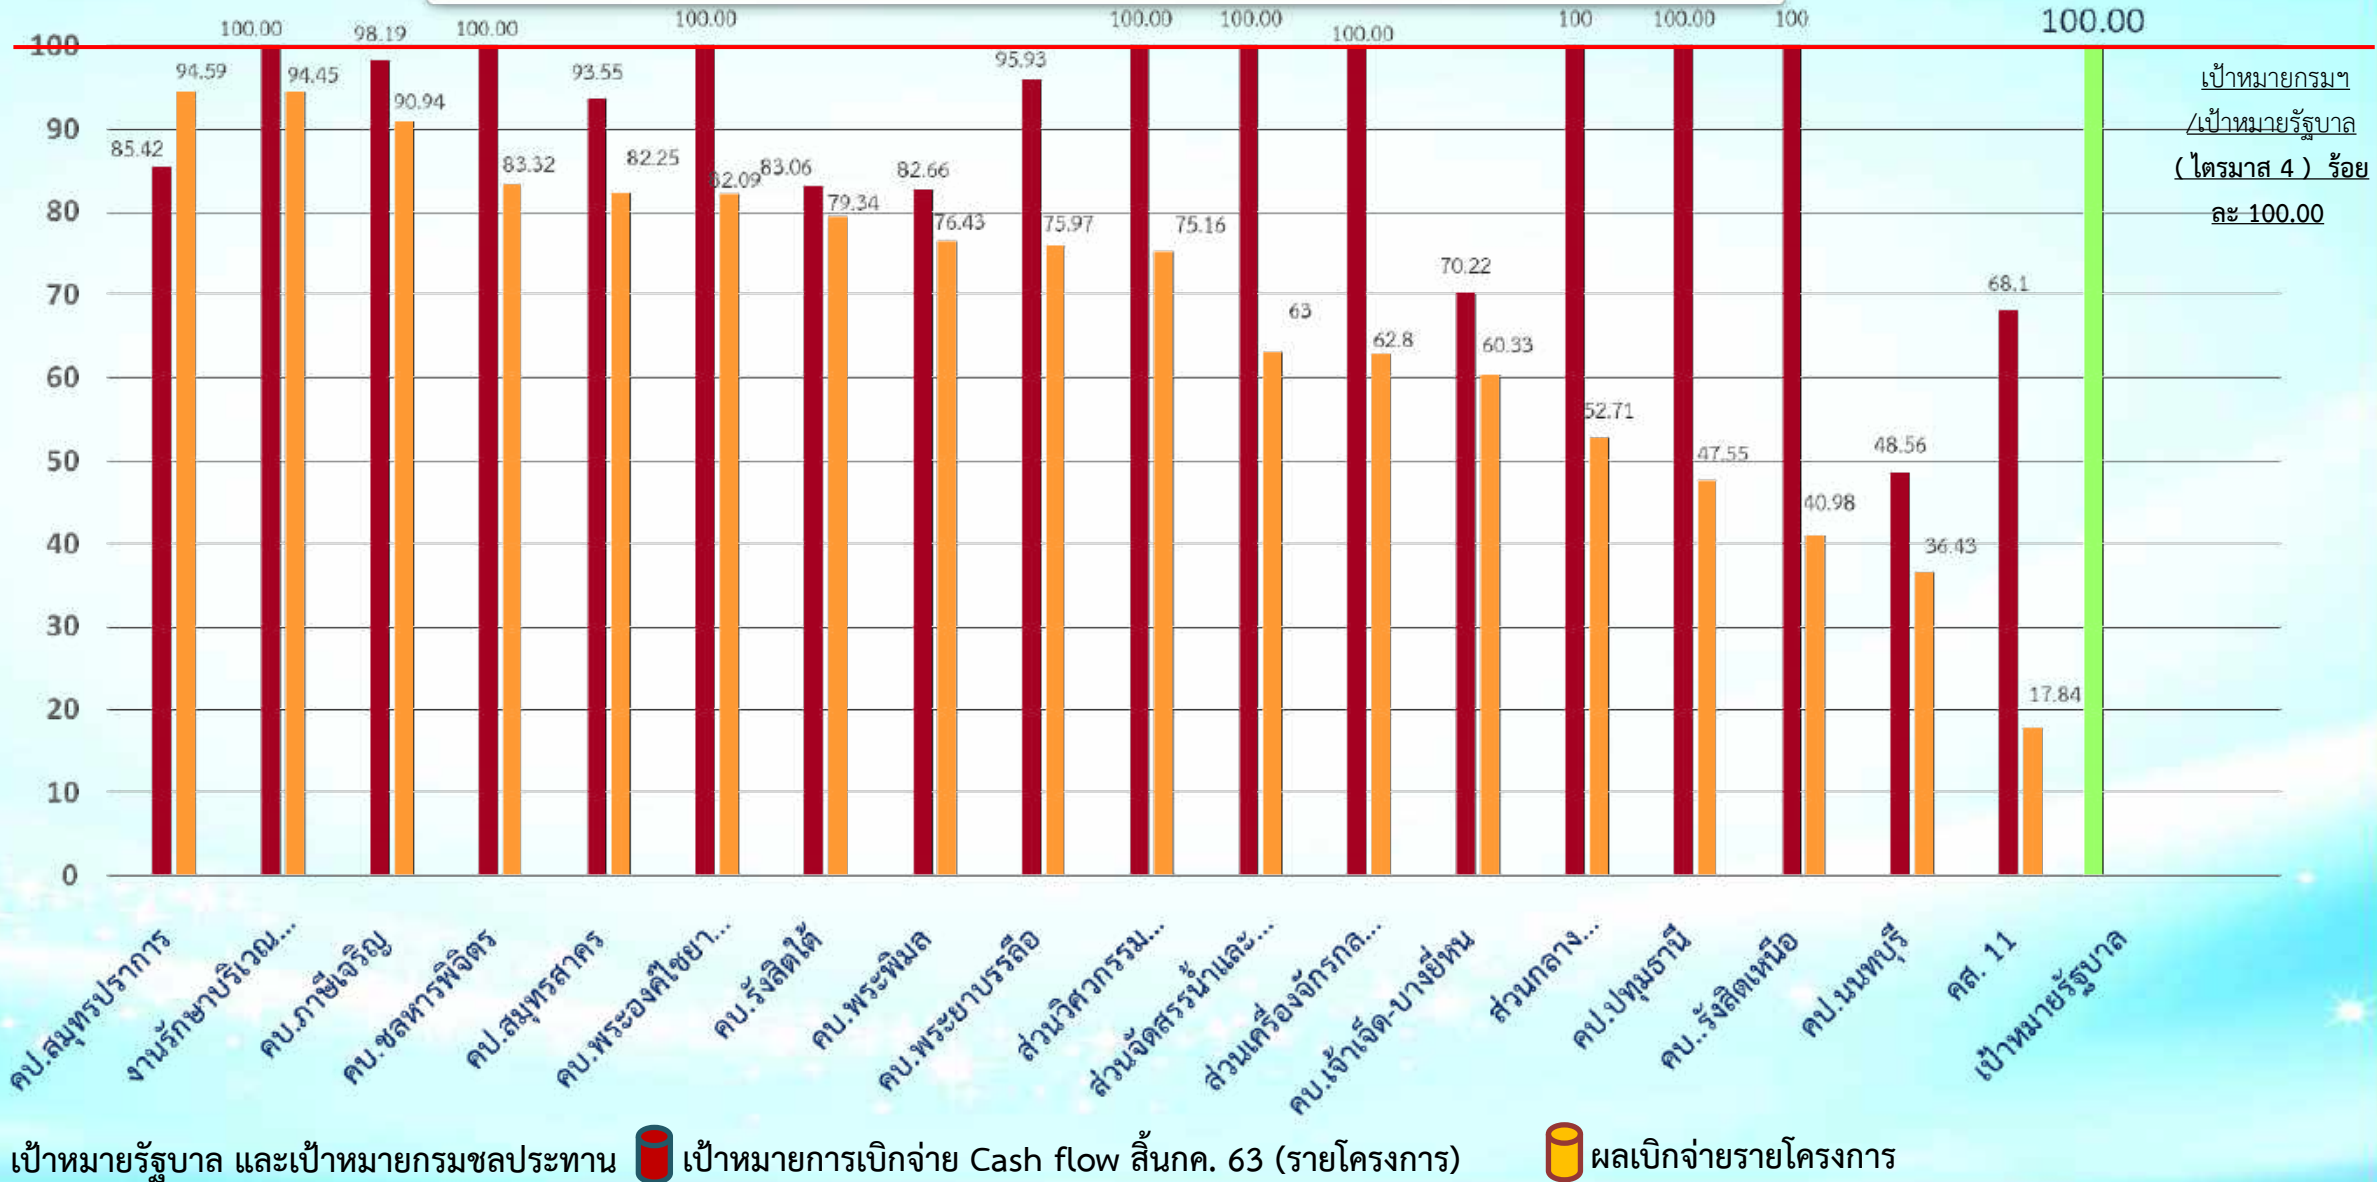

ผลการเบิกจ่าย สขป.11 ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 ได้ร้อยละ 38.85

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะงบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2563

	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	ร้อยละ
ส่วนกลาง สขป.11 (ค่าส่วนราชการ)	11,003,896	0	11,003,896	5,799,831	0	5,799,831	52.71
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.11	10,882,700	0	10,882,700	8,179,350	0	8,179,350	75.16
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.11	1,000,000	0	1,000,000	629,980	0	629,980	63.00
ส่วนเครื่องจักรกล สขป.11	30,589,500	30,589,500	0	19,209,500	19,209,500	0	62.80
งานรักษาบริเวณ สขป.11	1,638,701	0	1,638,701	1,547,742	0	1,547,742	94.45
โครงการชลประทานนนทบุรี	86,482,310	40,064,959	46,417,351	31,507,526	5,663,741	25,843,785	36.43
โครงการชลประทานปทุมธานี	41,044,535	12,979,000	28,065,535	19,518,164	199,000	19,319,164	47.55
โครงการชลประทานสมุทรปราการ	18,656,702	0	18,656,702	17,648,057	0	17,648,057	94.59
โครงการชลประทานสมุทรสาคร	20,697,648	379,750	20,317,898	17,023,045	0	17,023,045	82.25
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	15,425,121	5,189,120	10,236,001	9,305,443	0	9,305,443	60.33
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	44,772,812	21,034,720	23,738,092	37,302,946	17,758,549	19,544,397	83.32
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	53,312,668	2,223,103	51,089,565	40,749,017	796,500	40,749,017	76.43
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	51,087,738	10,800,000	40,287,738	38,810,552	998,286	37,812,266	75.97
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	61,812,663	16,595,519	45,217,144	50,739,397	8,985,436	41,753,960	82.09
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	57,566,729	0	57,566,729	52,350,626	0	52,350,626	90.94
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	83,553,677	6,336,875	77,216,802	66,288,448	6,336,875	59,951,573	79.34
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	199,797,529	150,360,900	49,436,629	81,869,276	42,337,599	39,531,678	40.98
โครงการก่อสร้าง 1/11 (2554)	0	0	0	0	0	0	0.00
โครงการก่อสร้าง 2/11 (2554)	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 11	0	0	0	0	0	0	0.00
โครงการก่อสร้าง 11	913,170,060	730,189,700	182,980,360	162,928,685	51,095,551	111,833,134	17.84
รวม	1,702,494,988	1,026,743,146	675,751,842	661,407,584	153,381,037	508,026,547	38.85

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานชลประทานที่ 11 : แสดงรายการตามหน่วยงานระดับโครงการ เฉพาะ งบรายจ่ายประจำปี - งบลงทุน พ.ร.บ.2563

แผนการเบิกจ่าย ลิ้นเดือน กันยายน 2563


ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30น

โครงการ	งบโอนจัดสรร			ผลเบิกจ่าย		แผนการ เบิกจ่าย เดือน ก.ย. 63	ส่วนต่าง
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	เบิกจ่ายร้อยละ		
ส่วนกลาง สขป.11 (ค่าส่วนยกวาง)	11,003,896	0	11,003,896	5,799,831	52.71	100.00	-47.29
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.11	10,882,700	0	10,882,700	8,179,350	75.16	100.00	-24.84
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.11	1,000,000	0	1,000,000	629,980	63	100.00	-37.00
ส่วนเครื่องจักรกล สขป.11	30,589,500	30,589,500	0	19,209,500	62.8	66.07	-3.27
งานรักษาระยะไกล สขป.11	1,638,701	0	1,638,701	1,547,742	94.45	100.00	-5.55
โครงการชลประทานนนทบุรี	86,482,310	40,064,959	46,417,351	31,507,526	36.43	45.72	-9.29
โครงการชลประทานปทุมธานี	41,044,535	12,979,000	28,065,535	19,518,164	47.55	100.00	-52.45
โครงการชลประทานสมุทรปราการ	18,656,702	0	18,656,702	17,648,057	94.59	100.00	-5.41
โครงการชลประทานสมุทรสาคร	20,697,648	379,750	20,317,898	17,023,045	82.25	100.00	-17.75
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน	15,425,121	5,189,120	10,236,001	9,305,443	60.33	65.63	-5.30
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	44,772,812	21,034,720	23,738,092	37,302,946	83.32	77.23	6.09
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	53,312,668	2,223,103	51,089,565	40,749,017	76.43	94.51	-18.08
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบวรลือ	51,087,738	10,800,000	40,287,738	38,810,552	75.97	82.66	-6.69
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยยานุชิต	61,812,663	16,595,519	45,217,144	50,739,397	82.09	93.89	-11.80
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาชีเจริญ	57,566,729	0	57,566,729	52,350,626	90.94	93.89	-2.95
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังสิดใต้	83,553,677	6,336,875	77,216,802	66,288,448	79.34	83.06	-3.72
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังสิดเหนือ	199,797,529	150,360,900	49,436,629	81,869,276	40.98	41.95	-0.97
โครงการก่อสร้าง 11	913,170,060	730,189,700	182,980,360	162,928,685	17.84	61.12	-43.28
รวมทั้งสิ้น	1,702,494,988	1,026,743,146	675,751,842	661,407,584	38.85	65.84	-26.99

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (พ.ร.บ. 63) สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

ลำดับที่	โครงการ	โอนจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	
			พ.ร.บ.63	ร้อยละ
1	สขป.11 (คำอำนวยการ)	11,003,946.00	5,799,831.00	52.71
2	ส่วนวิศวกรรม	10,882,700.00	8,179,350.00	75.16
3	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1,000,000.00	620,980.00	62.10
4	ส่วนเครื่องจักรกล	19,209,500.00	19,209,500.00	100.00
5	รักษาบริเวณ	1,638,701.00	1,547,742.00	94.45
6	คป.นนทบุรี	58,580,274.00	23,035,903.00	39.32
7	คป.ปทุมธานี	15,838,835.00	8,980,017.00	56.70
8	คป.สมุทรปราการ	4,707,151.00	4,707,151.00	100.00
9	คป.สมุทรสาคร	14,211,714.00	13,678,938.00	96.25
10	คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	14,666,121.00	9,305,443.00	63.45
11	คบ.ชลหารพิจิตร	41,672,912.00	37,302,946.00	89.51
12	คบ.พระพิมล	52,846,050.00	40,282,399.00	76.23
13	คบ.พระยาบรรลือ	41,350,438.00	29,589,632.00	71.56
14	คบ.พระองค์ไชยานุชิต	57,400,732.00	48,861,346.00	85.12
15	คบ.ภาษีเจริญ	44,757,859.00	43,570,961.00	97.35
16	คบ.รังสิตใต้	83,553,677.00	66,288,448.00	79.34
17	คบ.รังสิตเหนือ	127,978,330.00	81,385,270.00	63.59
18	โครงการก่อสร้าง	809,164,857.00	160,414,470.00	19.82
รวม		1,410,463,797.00	602,760,327.00	42.73

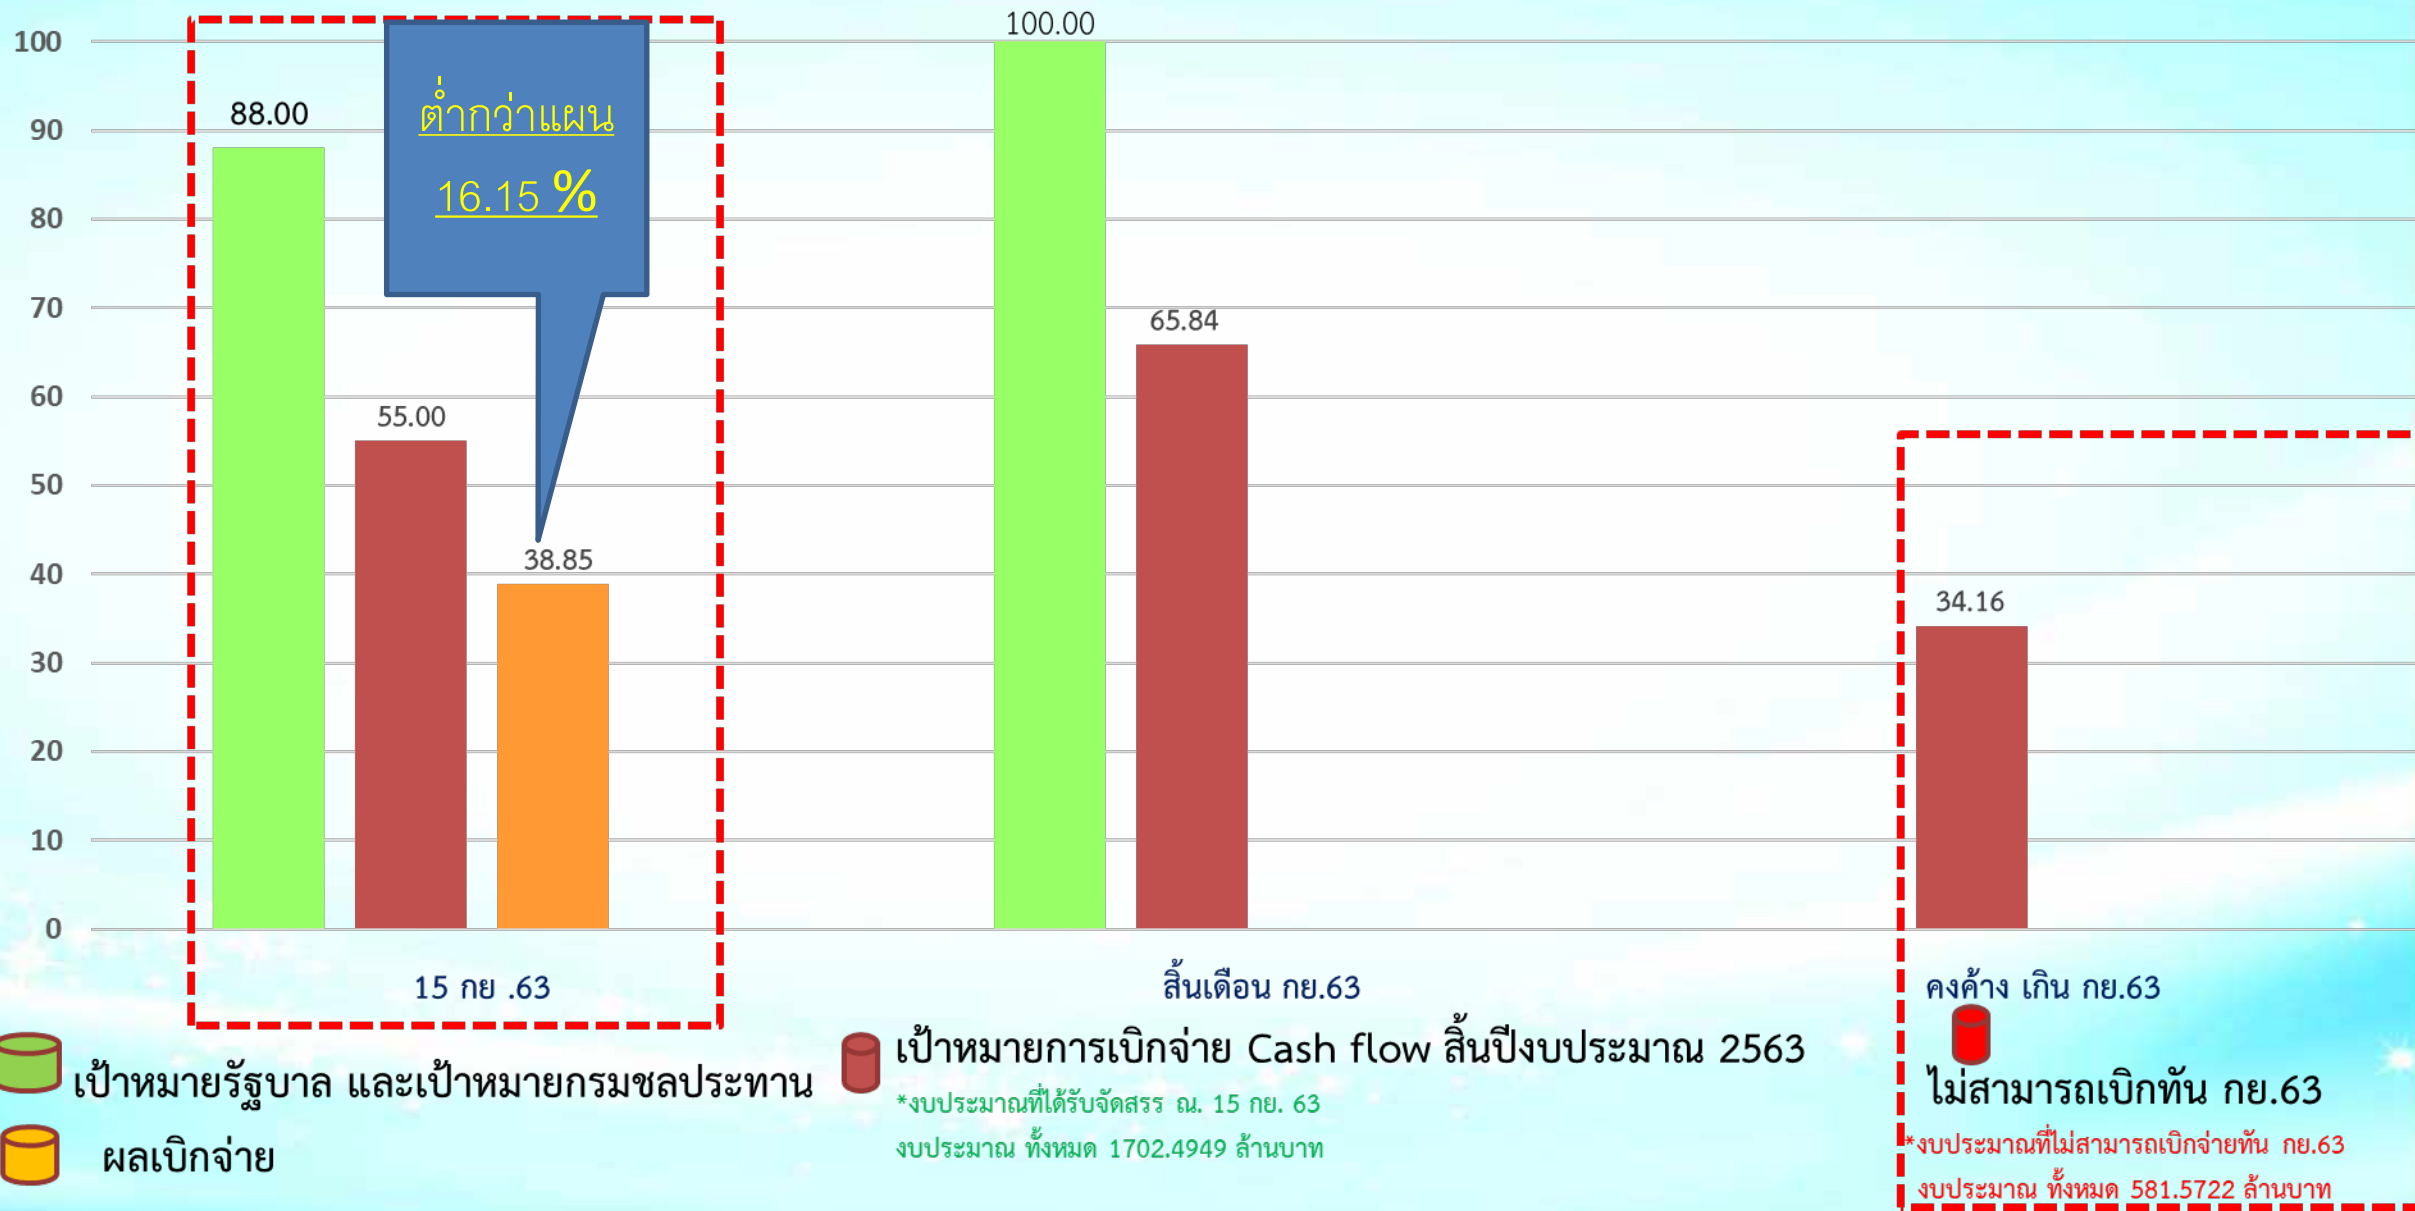

[ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 2563]

งานสัญญากรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	หน่วยปฏิบัติงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	งานที่ก่อกำหนดแล้วโปรดระบุ เลขที่สัญญา	ความก้าวหน้างาน	หมายเหตุ
1	ปตร.กึ่งถาวร ในคลองเชื่อมต่อกับคลองเปรม ประชากร ช่วงตั้งแต่คลองรังสิตฯ - สถานีสูบน้ำเปรม เหนือบางปะอิน จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษารังสิตเหนือ ขนาด ขนาด 6 x 4 ม.1 ช่อง จำนวน 2 แห่ง ขนาด 6 x 4 ม. 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษารังสิตเหนือ	80	79.12	เลขที่สัญญา กจ.28/2563 (สพด.) สั่งเข้าลงงานเริ่มนับอายุสัญญา วันที่ 9 มิ.ย. 63 ครบอายุสัญญา 3 กพ. 64 (อายุสัญญา 240 วัน)	-ความก้าวหน้างาน 53.40 % (ส่งงวดที่ 2 9กค.-8สค. 63) -ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างต่อม่ออาคาร / พื้นฐานรากอาคาร ประตุ ระบายน้ำคลอง พุทธา1 พุทธา2 และคลองเชียงรากน้อย - เบิกจ่ายงวดที่ 3 ประมาณวันที่ 8 กย. 63 (เบิก 5.51 ล้านบาท)	-คาดว่า สิ้น กย. ผลเบิกจ่าย 70 % ปัจจุบันเบิกจ่าย 51.68 %
2	ปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	โครงการก่อสร้าง สขป.11	350	335.28	เลขที่สัญญา กจ.26/2563 (สพด.) สั่งเข้าลงงานเริ่มนับอายุสัญญา วันที่ 2 มิ.ย. 63 ครบอายุสัญญา 28 มีค. 64 (อายุสัญญา 300 วัน)	- แผนงานสะสม 67.20 % - ผลงานสะสม 67.2086 % - คาดการณ์เบิกจ่าย 223 ล้าน เดือน ก.ย. 67.20 %	แต่ติดเรื่องหนังสือขอโอน สิทธิ์ รอให้กรมอนุมัติ ก่อน คาดว่า สิ้น ก.ย. ผลเบิกจ่าย 70%
3	แก้มลิงคลองเปรมประชากรพร้อมอาคารประกอบ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	โครงการก่อสร้าง สขป.11	280	274.97	เลขที่สัญญา กจ.29/2563 (สพด.) สั่งเข้าลงงานเริ่มนับอายุสัญญา วันที่ 3 มิ.ย. 63 ครบอายุสัญญา 31 มีค. 64 (อายุสัญญา 300 วัน)	- แผนงานสะสม 67.29% - ผลงานสะสม 67.2882% - คาดการณ์เบิกจ่าย 182 ล้าน เดือน ก.ย. 67.29 %	แต่ติดเรื่องหนังสือขอโอน สิทธิ์ รอให้กรมอนุมัติ ก่อน - คาดว่า สิ้น ก.ย. ผล เบิกจ่าย 70%

[ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 2563]

งานสัญญากรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	หน่วยปฏิบัติงาน	เงินงบประมาณ พ.ศ.2563 (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ได้รับโอนจัดสรร (ล้านบาท)	งานที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วโปรดระบุเลขที่สัญญา	การดำเนินงานปัจจุบัน	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพร้อมชุดลอก บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	โครงการก่อสร้าง สขป.11	300	-	-	15 ก.ย.63 : เชิญผู้รับจ้างเสนอราคา 17 ก.ย.63 : ผู้รับจ้างเสนอราคา 18 ก.ย.63 : คณะกรรมการฯสรุปผลการ พิจารณาและเสนอกองพัสดุ 21 ก.ย.63 : ผอ.พด. ทำบันทึกเสนอกรมลงนามไปกระทรวง 22 ก.ย.63 : กรมลงนามบันทึกเสนอกระทรวงฯ ขออนุมัติรับราคา (รองปลัดฯ) 22-24 ก.ย.63 : กระทรวงพิจารณาฯ 25 ก.ย.63 : กระทรวงอนุมัติ 28 ก.ย.63 : เอกสารกลับกรม/ดำเนินการประกาศผู้ชนะ 30 ก.ย.63 : ลงนามในสัญญา	เนื่องจากเป็นงานตามนโยบายในพื้นที่สำคัญของ กรมชลประทาน และจะต้องดำเนินการก่อสร้างทดแทนอาคารเดิมที่ใช้งานมานานมีสภาพทรุดโทรม ภายในปี 2563 *คาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ ภายในกันยายน 2563*
2	งานกำแพงกันดินพร้อมส่วนประกอบอื่นบริเวณแก้มลิงคลองเปรมประชากร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	โครงการก่อสร้าง สขป.11	97.52	97.52	-	- ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 17 กันยายน 2563	
3	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในคลองเปรมประชากร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางขุนอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี	คบ.รังสิตเหนือ	75.00	71.40	-	- อนุมัติรับราคา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 - คาดว่าประกาศผู้ชนะ 19 กันยายน 2563 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 29 กันยายน 2563	

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้เหลือมปี/กันขยาย พ.ศ.2555-2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

[ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 2563]

สำนักงานชลประทานที่ 11

ลำดับที่	โครงการ	รายการ	ผลการปฏิบัติงาน (%)	งบประมาณ (บาท)			ยอดเงินกู้คงเหลือ	วิธีดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้า และปัญหา/อุปสรรค	ยืนยันเบิกจ่าย ทัน (30 กันยายน 2563)	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ทัน	จำนวนคงเหลือ(บาท) เบิกจ่ายไม่ทันตาม กำหนด (30 กันยายน 2563)	หมายเหตุ
				งบเงินกู้คงเหลือยอดยกมา (30ก.ย.62)	เบิกจ่ายเงินกัน (บาท)	ร้อยละ							
				48,107,754.11	14,934,346.00	36.38	26,108,242.67	งานดำเนินการเอง				122,856,020.74	
1	โครงการชลประทานปทุมธานี	งานก่อสร้าง ปตร.สน.คลองบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	95	48,107,754.11	14,934,346.00	36.38	26,108,242.67	งานดำเนินการเอง	ทางบริษัทผู้รับจ้างได้แจ้งว่าจะส่งมอบงาน ในวันที่ 15 กันยายน 2563 และสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563	เบิกจ่ายทันตามกำหนด		-	-
2	โครงการชลประทานปทุมธานี	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางคูวัด)	-							เบิกจ่ายทันตามกำหนด		-	เป็นงานขยายเขตไฟฟ้า ฯ ของงานก่อสร้าง ปตร.สน. คลองบางคูวัด
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	งานปรับปรุง ปตร.กลางคลองขนมจีน ขนาด 1-6 ม. ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	100	17,970,508.02		0.00	17,970,508.02	งานดำเนินการเอง		เบิกจ่ายทันตามกำหนด		-	เบิกจ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	งานปรับปรุงเสริมคันกันน้ำสมบูรณ์-บางนาท ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	100	64,386,899.72	64,386,900.00	100.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ		เบิกจ่ายทันตามกำหนด		-	-

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณเงินก้อนเหลือมปี/กันขยาย พ.ศ.2555-2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

[ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 2563]

สำนักงานชลประทานที่ 11

ลำดับที่	โครงการ	รายการ	ผลการปฏิบัติงาน (%)	งบประมาณ (บาท)				วิธีดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้า และปัญหา/อุปสรรค	ยืนยันเบิกจ่ายทัน (30 กันยายน 2563)	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	จำนวนคงเหลือ(บาท) เบิกจ่ายไม่ทันตามกำหนด (30 กันยายน 2563)	หมายเหตุ
				งบเงินกันคงเหลือยอดยกมา (30ก.ย.62)	เบิกจ่ายเงินกัน (บาท)	ร้อยละ	ยอดเงินกันคงเหลือ						
											122,856,020.74		
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมคันคลองรังสิต ตำบลปึงน้ำรักษ์ อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	65.61	45,121,512.01	23,011,473.85	51.00	22,110,038.16	งานดำเนินการเอง	ติดปัญหาที่ดินแนวเขตชลประทานกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ป้ายโฆษณาและต้นไม้บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแนวท่อประปาเกิดขวางการปฏิบัติงาน ปัจจุบันรอการรื้อย้ายแนวท่อประปา และหนังสือตอบรับจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รอการอนุมัติวงเงินค่าปรับและขยายอายุสัญญา	-	3,258,601.65	22,110,038.16	-
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	งานจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกลางคลองทกวาสายล่าง ระหว่างคลอง 7-8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี	18.67	50,405,272.00	7,674,651.33	15.23	42,730,620.67	งานดำเนินการเอง	ติดปัญหาเรื่องแนวท่อประปาเกิดขวางการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตอกเสาเข็มบริเวณกำแพงปีกทั้งสองฝั่ง ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี ได้ดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อประปาดังกล่าวเสร็จแล้ว และได้สั่งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง รอการอนุมัติวงเงินค่าปรับและขยายอายุสัญญา	-	4,736,744.77	42,730,620.67	-

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณเงินก้อนปี/กันขยาย พ.ศ.2555-2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

[ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 2563]

สำนักงานชลประทานที่ 11

ลำดับ	โครงการ	รายการ	ผลการปฏิบัติงาน (%)	งบประมาณ (บาท)			ยอดเงินกันคลัง	วิธีดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้า และปัญหา/อุปสรรค	ยืนยันเบิกจ่าย ทัน (30 กันยายน 2563)	จำนวนคงเหลือ(บาท)		หมายเหตุ
				งบเงินกันคลังยกมา (30ก.ย.62)	เบิกจ่ายเงินกัน (บาท)	ร้อยละ					อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	เบิกจ่ายไม่ทันตามกำหนด (30 กันยายน 2563)	
												122,856,020.74	
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมคันคลองหกวา ตำบลพีชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	54.26	45,813,961.83	12,535,311.63	27.36	33,278,650.20	งานดำเนินการเอง	ติดปัญหาบ้านรูกกล้า ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม วัด และตลาดชุมชนคลอง 16 ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ รอการอนุมัติวงเงินค่าปรับและขยายอายุสัญญา	-	5,639,813.02	33,278,650.20	-
8	โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งานปรับปรุงและขยายอาคารโรงจอดเรือ	60	25,070,711.71	133,720.35	0.53	24,736,711.71	จ้างเหมาทั้งโครงการ	มีการสั่งหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 และมีการแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่มปฏิบัติงานอีกครั้ง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 อนุมัติวงเงินค่าปรับและขยายอายุสัญญา ครบกำหนดอายุสัญญา วันที่ 5 มกราคม 2564	-	14,500,000.00	24,736,711.71	-

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

17 กันยายน 2563

ฝ่าย	งานตามแผน (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อย ละ (%)	งานนอกแผน (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อยละ (%)	งานนโยบาย	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อยละ (%)	รวม งาน ทั้งหมด (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อยละ (%)
ฝ่ายพิจารณาโครงการ	57	57	100.00	-	-	-	-	-	-	57	57	100.00
ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	45	45	100.00	-	-	-	-	-	-	45	45	100.00
ฝ่ายปลูกพืชและธรณีวิทยา	16	16	100.00	-	-	-	-	-	-	16	16	100.00
ฝ่ายออกแบบ	39	39	100.00	-	-	-	-	-	-	39	39	100.00
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ	-	-	-	335	326	97.31	-	-	-	335	326	97.31
รวม	157	157	100.00	335	326	97.31	-	-	-	492	483	98.17

ผลงานออกแบบ ปีงบประมาณ 2563

สรุปวันที่ 15 กันยายน 2563

ลำดับ	โครงการ/รายการ	แผนดำเนินการ	ผลงานที่ได้	ผลงานสะสมรวม 100.00%
1	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.คลองกว้าง ขนาด 1 ลบ.ม. จำนวน 2 เครื่อง ตบ.ภาษีเจริญ	100%	100%	2.56%
2	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.คลองพิบูล ขนาด 1 ลบ.ม. จำนวน 2 เครื่อง ตบ.ภาษีเจริญ	100%	100%	2.56%
3	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางปลากรด	100%	100%	2.56%
4	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลองขุนเจม	100%	100%	2.56%
5	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลองสะเทิน	100%	100%	2.56%
6	ปรับปรุง ท่อระบายน้ำปลายคลองสกัดห้า (คลองแยกหนึ่งขวา)	100%	100%	2.56%
7	ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางสีทอง	100%	100%	2.56%
8	ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางไผ่	100%	100%	2.56%
9	ปรับปรุง ทรบ.รางขวิด	100%	100%	2.56%
10	ปรับปรุง ทรบ.อ่าวตาสอน ต.ตะกั่ว อ.บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี	100%	100%	2.56%
11	ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลอง	100%	100%	2.56%
12	ปรับปรุงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองกระษัฏ	100%	100%	2.56%
13	ปรับปรุงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองแขวงกลิ่นสำ	100%	100%	2.56%
14	ปรับปรุงติดตั้งเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำคลองสามวา	100%	100%	2.56%
15	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำประจักษ์ด้านเหนือ	100%	100%	2.56%
16	โครงการควบคุมการกัดเซาะลำน้ำห้วย	100%	100%	2.56%
17	ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากคลอง 14 (สายกลาง)	100%	100%	2.56%
18	ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากคลอง 15 (สายกลาง)	100%	100%	2.56%
19	ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากคลอง 16 (สายกลาง)	100%	100%	2.56%

20	ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากคลองทวีชะกะบือ	100%	100%	2.56%
21	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเปรมประชากร กม. 4+400	100%	100%	2.56%
22	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเปรมประชากร กม. 4+850	100%	100%	2.56%
23	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเปรมประชากร กม. 7+200	100%	100%	2.56%
24	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเปรมประชากร กม. 12+450	100%	100%	2.56%
25	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเปรมประชากร กม. 16+200	100%	100%	2.56%
26	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเปรมประชากร กม. 20+000	100%	100%	2.56%
27	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเปรมประชากร กม. 21+000	100%	100%	2.56%
28	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเปรมประชากร กม. 23+000	100%	100%	2.56%
29	สะพานคอน.คลองด่าน	100%	100%	2.56%
30	ปรับปรุงคันคลองขุดใหม่ฝั่งขวา กม.0+000 - กม.4+000	100%	100%	2.56%
31	ประตูระบายน้ำคลองสหกรณ์สาย 3/1 (ก่อสร้างใหม่ฝั่งขวาคลองโคกขาม)	100%	100%	2.56%
32	ประตูระบายน้ำคลองสหกรณ์สาย 2 (ก่อสร้างใหม่ฝั่งขวาคลองโคกขาม)	100%	100%	2.56%
33	งานปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.ลำรางทองหลาง	100%	100%	2.56%
34	ปรับปรุง ทรบ.พระอินทร์ราช	100%	100%	2.56%
35	ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองทิววัฒนา กม 0+410	100%	100%	2.56%
36	ก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นฝั่งด้านทิศเหนือคลองบางตลาด ความยาว 2.00 กิโลเมตร โครงการชลประทาน	100%	100%	2.56%
37	ปตร.ปลายคลองบางซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หิน	100%	100%	2.56%
38	ประตูระบายน้ำคลองหนองบัว (ประตูระบายน้ำข้างคลองฝั่งขวา) ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา	100%	100%	2.56%
39	ประตูระบายน้ำกลางคลองวัดพร้าว ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ	100%	100%	2.56%
รวมผลงานสะสมทั้งสิ้น				100.00%



รายงานสภาพเครื่องสูบน้ำ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

ที่	โครงการฯ	เครื่องสูบน้ำถาวร					เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร (สขป.11)					สรุปแต่ละโครงการฯ				
		จำนวนสถานี	จำนวนเครื่อง	ใช้งานได้	ชำรุด	รื้อถอน	จำนวนสถานี	จำนวนเครื่อง	ใช้งานได้	ชำรุด	รื้อถอน	จำนวนสถานี	จำนวนเครื่อง	ใช้งานได้	ชำรุด	รื้อถอน
1	ปทุมธานี	20	50	50	0	0	0	0	0	0	0	20	50	50	0	0
2	นนทบุรี	38	88	87	1	0	3	5	0	0	5	41	93	87	1	5
3	สมุทรปราการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	สมุทรสาคร	5	20	20	0	0	0	0	0	0	0	5	20	20	0	0
5	รังสิตเหนือ	3	12	8	4	0	0	0	0	0	0	3	12	8	4	0
6	รังสิตใต้	7	38	19	14	5	5	59	51	8	0	12	97	70	22	5
7	พระองค์ไชยานุชิต	24	75	73	2	0	6	22	18	0	4	30	97	91	2	4
8	ชลหารพิจิตร	10	119	117	2	0	0	0	0	0	0	10	119	117	2	0
9	เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	5	18	14	4	0	0	0	0	0	0	5	18	14	4	0
10	พระยาบรรลือ	7	25	24	1	0	2	6	5	0	1	9	31	29	1	1
11	พระพิมล	14	73	71	2	0	4	18	4	0	14	18	91	75	2	14
12	ภามิเจริญ	31	79	63	10	6	6	19	9	2	8	37	98	72	12	14
รวมทุกโครงการฯ		164	597	546	40	11	26	129	87	10	32	190	726	633	50	43

หมายเหตุ : เครื่องสูบน้ำ ใช้งานได้ 87.19% ชำรุด 6.887% รื้อถอน 5.923%



โครงการฯ นนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		
	สถานีสูบน้ำถาวร						
1	สน.ปตร.คลองบางตลาด	3	1	1	-	ใบพัดหลุด	อยู่ในแผนซ่อมใหญ่ปี 2564 ส่วนเครื่องจักรกล
	รวม 1 เครื่อง			1	0		



โครงการฯ รั้งสัตเหื้อ สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		
	สถานีสูบน้ำถาวร						
1	สน.ปตร.เปรมเหนือบางปะอิน	3	4	1	-	ขดลวดมอเตอร์ร้อนเกินกว่าปกติ	
			5	1	-	ขดลวดมอเตอร์ร้อนเกินกว่าปกติ	
			7	1	-	ขดลวดมอเตอร์ร้อนเกินกว่าปกติ	
			8	1	-	ขดลวดมอเตอร์ร้อนเกินกว่าปกติ	
	รวม 4 เครื่อง			4	0		



กรมชลประทาน

โครงการฯ รั้งสิทธิ์ได้ สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		
	สถานีสูบน้ำถาวร						
1	สน.จุฬาลงกรณ์ (ใหม่)	6	1	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	
			2	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	
			3	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	
			4	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	
2	สน.ปตร.คลองหกวา	3	3	1	-	ตู้ควบคุมขัดข้อง	
			4	1	-	ตู้ควบคุมขัดข้อง	
			5	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	
			6	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	
			11	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	
3	สน.ปตน.เสาวภาพ่องศรี	3	1	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	
			2	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	
			3	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	
4	สน.ปตร.คลอง 21	3	1	1	-	ตู้ควบคุมขัดข้อง	
			2	1	-	ตู้ควบคุมขัดข้อง	



โครงการฯ รั้งสิทธิ์ได้ สำนักงานชลประทานที่ 11 (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		
	สถานีสูบน้ำกึ่งถาวร						
5	สน.ปตบ.จุฬาลงกรณ์ (กึ่งถาวร)	3	1	1	-	ผู้ควบคุมชำรุด	
			6	1	-	กระแสสูง	
			9	1	-	ผู้ควบคุมขัดข้อง	
			12	1	-	ผู้ควบคุมขัดข้อง	
6	สน.ปตบ.ปากคลองรั้งสิทธิ์	6	1	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	
			2	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	
			4	1	-	ผู้ควบคุมขัดข้อง	
			5	1	-	ผู้ควบคุมขัดข้อง	
	รวม 22 เครื่อง			22	0		



โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		
	สถานีสูบน้ำถาวร						
1	สน.บางพระ	3	2	1	-	ใบพัดขาด	
2	สน.นางหงษ์	3	4	-	1	เครื่องสูบน้ำเสีย	โครงการ ของบประมาณเพิ่มเติมปี 2563
	รวม 2 เครื่อง			1	1		



โครงการฯ ชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		
	สถานีสูบน้ำถาวร						
1	สน.ชลหารพิจิตร 1	3	20	1	-	ผู้ควบคุมเสีย (ไฟใหม่)	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม ส่วนเครื่องจักรกล
2	สน.บางปลาเจ้า	3	2	1	-	มอเตอร์ชำรุด	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม ส่วนเครื่องจักรกล
	รวม 2 เครื่อง			2	0		



โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		
1	สถานีสูบน้ำถาวร สน.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	3	1	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	อยู่ในแผนซ่อมใหญ่ปี 2564 ส่วนเครื่องจักรกล
			2	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม ส่วนเครื่องจักรกล
			4	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม ส่วนเครื่องจักรกล
			6	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม ส่วนเครื่องจักรกล
	รวม 4 เครื่อง			4	0		



โครงการฯ พระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		
	สถานีสูบน้ำถาวร						
1	สน.บางหวาย 1	1	2	1	-	มอเตอร์ลงกราวด์	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม ส่วนเครื่องจักรกล
	รวม 1 เครื่อง			1	0		



โครงการฯ พระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		
	สถานีสูบน้ำถาวร						
1	สน.ปตร.คลองโยง 1	3	3	1	-	ผู้ควบคุมชำรุด	อยู่ในแผนซ่อมใหญ่ปี 2564 ส่วนเครื่องจักรกล
2	สน.ปตร.เจ๊กก๊วย	1	1	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	รอบริษัทเข้าดำเนินการซ่อม
	รวม 2 เครื่อง			2	0		



โครงการฯ ภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	เครื่องที่ ชำรุด	หมายเลขครุภัณฑ์ (เครื่อง)		สาเหตุชำรุด	หมายเหตุ
				มี	ไม่มี		
	สถานีสูบน้ำถาวร						
1	สน.ปตร.โรงคราม	1	2	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	
2	สน.ปตร.สุคต	1	1	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	
			2	1	-	ตู้ควบคุมไฟฟ้าชำรุด	
3	สน.ปตร.บางกระทึก	1	1	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด/ตู้ควบคุม ไฟฟ้าชำรุด	
4	สน.ปตร.ท่าพุด	1	3	1	-	ตู้ควบคุมไฟฟ้าชำรุด	
			4	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	
5	สน.ปตร.คลองครุ	1	1	-	1		
			2	-	1		
			3	-	1		
			4	-	1		
	สถานีสูบน้ำกึ่งถาวร						
6	สน.ปตร.คลองบางกระทึก	3	1	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	
7	สน.ปตร.อ้อมใหญ่	3	1	1	-	เครื่องสูบน้ำชำรุด	
	รวม 12 เครื่อง			8	4		



สรุปเครื่องสูบน้ำที่รอดอนแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน (เครื่อง)	หมายเหตุ
โครงการชลประทานนนทบุรี				
เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร				
1	สน.ปตร.คลองบางตลาด	3	2	รอดอนเก็บที่โครงการ
2	สน.ปตร.คลองอ้อมนนท์	3	2	รอดอนเก็บที่โครงการ
3	ปตร.บางไผ่	3	1	รอดอนเก็บที่โครงการ
	รวม		5	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้				
เครื่องสูบน้ำถาวร				
1	สน.สมบูรณ์	3	5	รอดอนสร้างสถานีใหม่
	รวม		5	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต				
เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร				
1	สน.ปากตะคลอง	3	4	รอดอนเก็บที่โครงการ
	รวม		4	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ				
เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร				
1	สน.คลองสระ	3	1	รอดอนเก็บที่โครงการ
	รวม		1	



สรุปเครื่องสูบน้ำที่รื้อถอนแล้ว (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน (เครื่อง)	หมายเหตุ
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล			
	เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร			
1	สน.มหาสวัสดิ์	3	4	รื้อถอนเก็บที่โครงการ
2	สน.ปตร.คลองโยง	3	6	รื้อถอนเก็บที่โครงการ
3	สน.ปตร.พระพิมล	3	4	รื้อถอนเก็บที่โครงการ
	รวม		14	
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ			
	เครื่องสูบน้ำถาวร			
1	สน.ปตร.กระทู้มแบน	3	6	ก่อสร้างสถานีใหม่
	เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร			
2	สน.ปตร.กระทู้มแบน	3	8	ก่อสร้างสถานีใหม่
	รวม		14	
	รวมทั้งสิ้น		43	



สรุปผลการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 11

เครื่องสูบน้ำทั้งหมด (เครื่อง)	ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์แล้ว (เครื่อง)	ยังไม่ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (เครื่อง)
701	589	112

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563



สรุปจำนวนเครื่องสูบน้ำที่ยังไม่มีทะเบียนครุภัณฑ์ แยกตามโครงการฯ

เอกสารแนบ 9 / หน้า 2

ลำดับที่	โครงการฯ	จำนวน (สถานี)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)			
			อยู่ระหว่างขึ้น ทะเบียนฯ	ข้อมูลพร้อม ขึ้นทะเบียนฯ	ไม่มีข้อมูล/ ข้อมูลไม่ครบ	รวม
1	โครงการชลประทานปทุมธานี	2	-	-	3	3
2	โครงการชลประทานนนทบุรี	4	-	-	20	20
3	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	-	-	-	-	-
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	-	-	-	-	-
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	2	-	-	6	6
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	3	40	-	20	60
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	-	-	-	-	-
8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	-	-	-	-	-
9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	3	6	-	7	13
10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	4	8	-	2	10
	รวม	18	54	0	58	112



โครงการชลประทานปทุมธานี

ลำดับ ที่	สถานที่ตั้ง	ขนาด (ม ³ / _ร)	จำนวน (เครื่อง)	อายุ (ปี)	เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์							หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
					รายงานความ ต้องการพัสดุ	Spec.	ตำแน เล่มสัญญา	ใบส่งของ	Serial Number	รายงานการ ตรวจรับพัสดุ	รูปภาพ ประกอบ		
1	สน. ปตร.คลองพิบูล	3	1	15	-	-	-	-	-	-	-		รอเอกสารประกอบ
2	สน. ปตร.คลองยายช้อย	1	2	15	-	-	-	-	-	-	-	คส.11	รอเอกสารประกอบ
รวม			3										



โครงการชลประทานนนทบุรี

ลำดับ ที่	สถานที่ตั้ง	ขนาด ($\frac{m^3}{s}$)	จำนวน (เครื่อง)	อายุ (ปี)	เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์							หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
					รายงานความ ต้องการวัสดุ	Spec.	ตำเนา เล่มสัญญา	ใบส่งของ	Serial Number	รายงานการ ตรวจรับวัสดุ	รูปภาพ ประกอบ		
1	ปตร.คลองบางกรวย	3	3	5	-	-	-	-	-	-	-	สกก.11	รอเอกสารประกอบ
2	ปตร.คลองบางบัวทอง	6	6	4	-	-	-	-	-	-	-	สกก.11	รอเอกสารประกอบ
3	ปตร.คลองพระอุดม	3	10	4	-	-	-	-	-	-	-	สกก.11	รอเอกสารประกอบ
4	ปตร.คลองบางไผ่	1	1	2	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	คป.นนทบุรี	อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งจังหวัด
รวม			20										



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

ลำดับ ที่	สถานที่ตั้ง	ขนาด (ม ³ / _ร)	จำนวน (เครื่อง)	อายุ (ปี)	เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์							หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
					รายงานความ ต้องการพัสดุ	Spec.	ตำแน เล่มสัญญา	ใบส่งของ	Serial Number	รายงานการ ตรวจรับพัสดุ	รูปภาพ ประกอบ		
1	สน.ประจักษ์	1	2	11	-	-	-	-	-	-	✓	ไม่มีข้อมูล	อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล+ภาพถ่าย
2	สน.นางหงษ์	3	4	22	-	-	-	-	-	-	✓	ไม่มีข้อมูล	อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล+ภาพถ่าย
รวม			6										



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร

ลำดับ ที่	สถานที่ตั้ง	ขนาด ($\frac{m^3}{s}$)	จำนวน (เครื่อง)	อายุ(ปี)	เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์							หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
					รายงานความ ต้องการวัสดุ	Spec.	ตำแน เล่มสัญญา	ใบส่งของ	Serial Number	รายงานการ ตรวจรับวัสดุ	รูปภาพ ประกอบ		
1	สน.ชลหารพิจิตร 2	3	20	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คบ.ชลหารฯ	ลงระบบเรียบร้อยแล้ว
2	สน.หนองจอก	3	20	10	-	-	-	-	-	-	-	สกค.11	รอเอกสารประกอบ
3	สน.ประเวศน์บุรีรัมย์	3	20	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คส.11	ลงระบบเรียบร้อยแล้ว
รวม			60										



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล

ลำดับ ที่	สถานที่ตั้ง	ขนาด (ม ²)	จำนวน (เครื่อง)	อายุ (ปี)	เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์							หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
					รายงานความ ต้องการที่สุด	Spec.	ตำเนา เล่มสัญญา	ใบส่งของ	Serial Number	รายงานการ ตรวจรับที่สุด	รูปภาพ ประกอบ		
1	สน. ปตร.คลองโยง 2	3	6	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คส.11	ลงระบบเรียบร้อยแล้ว
2	สน. ปตร.บางภาษี	3	6	6	-	-	-	-	-	-	-	สกก.11	อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้ง สกก.11
3	สน. ปตร.ยายส่อน	1	1	9	-	-	-	-	-	-	-	สกก.11	อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้ง สกก.11
รวม				13									



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ

ลำดับ ที่	สถานที่ตั้ง	ขนาด ($\frac{m^3}{s}$)	จำนวน (เครื่อง)	อายุ (ปี)	เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์							หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
					รายงานความ ต้องการวัสดุ	Spec.	ตำแน เล่มสัญญา	ใบส่งของ	Serial Number	รายงานการ ตรวจรับวัสดุ	รูปภาพ ประกอบ		
1	ปตร.สวนฝ้าย	1	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คส.11	ลงระบบเรียบร้อยแล้ว
2	สน. ปตร.ไหหลำบน	1	2	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คบ.ภาษีเจริญ	ลงระบบเรียบร้อยแล้ว
3	สน. ปตร.คลองตันเจริญสุข	1	2	9	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	คบ.ภาษีเจริญ	
4	ปตร.คลองครุ	1	4	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คบ.ภาษีเจริญ	ลงระบบเรียบร้อยแล้ว
รวม			10										
