

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

ผู้มาประชุม

๑. นายสมัย	ธรรมสัถย์	ผวศ.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายชัชชม	ชมประดิษฐ์	ผจบ.ชป.๑๑	
๓. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	แทน ผคก.ชป.๑๑	
๔. นางสินอุดม	อุดมคณานาถ	ผบท.ชป.๑๑	
๕. นายรุ่งธรรม	ป่อเกิด	ผคป.นนทบุรี	
๖. นายชูชาติ	ศุภวรรธนากร	ผคป.ปทุมธานี	
๗. นายไพลิน	นุชถาวร	ผคป.สมุทรสาคร	
๘. นายอนันต์	เจริญรัตน์	ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๙. นายพีระพงศ์	ลิมนาทร	ผคบ.พระยาบรรลือ	
๑๐. นายสากร	ชลศิริ	ผคบ.พระพิมล	
๑๑. นายประสงค์	อินคนตรี	ผคบ.ภาษีเจริญ	
๑๒. นายพิสิษฐ์	พิบูลย์ศิริ	ผคบ.รังสิตเหนือ	
๑๓. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผคบ.ชลหารพิจิตร	
๑๔. นายสุรพล	อนุสรหิรัญการ	ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต	
๑๕. นายเกรียงไกร	ภาคพิเศษ	ผคส.๑๑	
๑๖. นายประพจน์	กระโจมแก้ว	แทน ผสก.๑๑	
๑๗. นายพรชัย	สื้อตระกูล	นิติกร ประจำ สชป.๑๑	
๑๘. นายทรงพล	สวยสม	ผอส.๒ ลก.	
๑๙. นายวิเชียร	แก้ววรรณดี	แทน ผบค.๖ คก.	
๒๐. นายอากาศ	สนิกะวาที	วศ.คป.นนทบุรี แทน จน.คป.นนทบุรี	
๒๑. นายภูริต	โกมลเกษรภัช	วศ.คป.ปทุมธานี	
๒๒. นายรัฐพล	บุญณะ	วศ.คป.สมุทรปราการ	
๒๓. นายศุภชัย	มะพล	วศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๔. นายรมย์วินท์	กตินศรีสุข	วศ.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๕. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	วศ.คบ.พระพิมล	
๒๖. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	วศ.คบ.รังสิตเหนือ	
๒๗. นายมนตรี	มณีวงษ์	วศ.คบ.รังสิตใต้	
๒๘. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	วศ.คบ.ชลหารพิจิตร	
๒๙. นายสนธยา	จันบำรุง	วศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต	
๓๐. นายชยุต	ธรรมนิตยกุล	วศ.คส.๑๑	
๓๑. นายสุภชัย	ยังพึ้ง	จน.คป.ปทุมธานี	
๓๒. นายนิริวัฒน์	ปานตัน	จน.คป.สมุทรปราการ	

๓๓. นายน้ำมนต์...

๓๓. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	จน.คป.สมุทรสาคร
๓๔. นายรุ่งโรจน์	พึงอ่อน	จน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๓๕. นายเสกสรร	ทรัพย์เจริญ	จน.คป.พระยาบรรลือ
๓๖. นายอนุสรณ์	เจริญผล	จน.คป.รังสิตเหนือ
๓๗. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	จน.คป.ชลหารพิจิตร
๓๘. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	บป.ชป.๑๑
๓๙. นายศราวุธ	สากล	ปบ.ชป.๑๑
๔๐. นายรัฐธีรย์	ทัศนนะนาคะจิตต์	ปน.ชป.๑๑
๔๑. นายทองธัช	เฟื่องถิ	สป.ชป.๑๑
๔๒. นายกฤษณะ	จักราวินท์	แทน ยศ.ชป.๑๑
๔๓. นายทวีวัฒน์	บุรมย์ชัย	แทน ผง.ชป.๑๑
๔๔. นายกมลภพ	แสงจินดา	แทน คพ.ชป.๑๑
๔๕. นายสหะ	อังสนันท์สุข	ตป.ชป.๑๑
๔๖. นายเอวิสันต์	กู่เกียรติศักดิ์	พค.ชป.๑๑
๔๗. นายวรชัย	สุขผลธรรม	อบ.ชป.๑๑
๔๘. นายคมกริช	หงษ์ทอง	ตว.ชป.๑๑
๔๙. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ฟท.ชป.๑๑
๕๐. นางสาวสุภาพร	คุมดวง	ธก.ชป.๑๑
๕๑. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	บส.ชป.๑๑
๕๒. นางนุจรี	บางน้อย	งบ.ชป.๑๑
๕๓. นางสาวอรญา	เจริญนฤภัทร	พต.ชป.๑๑
๕๔. นางมาลีรัตน์	เทียนถวาย	ปท.ชป.๑๑
๕๕. นางประจวบ	พ่วงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผส.ชป.๑๑	ติตราชการ
๒. นายธีระพล	ตั้งสมบุญ	ผชช.ชป.๑๑	ติตราชการ
๓. นายณัฐพงศ์	ศิริโชค	ผผง.ชป.๑๑	ติตราชการ
๔. นายมนัส	นิลคุปต์	ผคป.สมุทรปราการ	ติตราชการ
๕. นายพฤติพงศ์	ทัศนย์อุชุลีกุล	ผคป.รังสิตใต้	ติตราชการ
๖. นายเสรี	ปิมณี	จน.คป.พระพิมล	
๗. นายวิรัช	สาทรานวัฒน์	จน.คป.ภาษีเจริญ	
๘. นายพร	วินโกมินทร์	จน.คป.รังสิตใต้	
๙. นายจิรศักดิ์	ลิปการวงศ์	จน.คป.พระองค์ไชยานุชิต	
๑๐. นายจิตเทพ	แก้วพัฒนสกุล	ปช.ชป.๑๑	
๑๑. นายสินธิ	มีพงษ์	สป.ชป.๑๑	
๑๒. นายธีระวุฒิ	ศิลป์คุปต์	ปธ.ชป.๑๑	
๑๓. นายอำนาจ	ถิ้ววน	ชบ.ชป.๑๑	
๑๔. นายชาญ	พรรณเทวี	ผย.ชป.๑๑	

๑๕. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ปส.ชป.๑๑	
๑๖. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผด.๑๑ สธ.	ติตราชการ
๑๗. นายนิรันดร์	แสงใน	สร.รว.๑๑	ติตราชการ
๑๘. นายนพดล	พิมพ์จันทร์	ผบค.๕ คก.	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุนัย	กฤษณจินดา	วศ.ผอส.๒ ลก.
๒. นายสิทธิพร	สิทธิรักษ์	จส. ผอส.๒ ลก.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผศบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน : กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสัจจร แนะนำหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน และนำเสนอสถานการณ์น้ำและภารกิจสำคัญของโครงการ โดยมีคณะกรรมการจัดการน้ำฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก (ตามเอกสารแนบ ๑-๖)

ประธาน : กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผบท.ชป.๑๑ : เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การขึ้นบัญชีครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ

ผู้แทน ผคก.ชป.๑๑ : สชป.๑๑ มีเครื่องสูบน้ำ ๑๕๙ สถานี จำนวน ๖๓๔ เครื่อง ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์แล้ว ๑๑๕ สถานี จำนวน ๔๖๗ เครื่อง ขออนุมัติทะเบียนครุภัณฑ์ ๕ สถานี จำนวน ๓๐ เครื่อง ยังไม่ได้รับการตอบรับ และอีก ๔๔ สถานี จำนวน ๑๖๑ เครื่อง ขณะนี้ได้จัดทำรายละเอียดเสนอกรมเพื่อขอขึ้นบัญชีครุภัณฑ์

ผศบ.ปทุมธานี : เมื่อวันก่อน ผวจ.ปทุมธานี ได้มาตรวจเครื่องสูบน้ำพบว่าเครื่องสูบน้ำของโครงการฯ ปทุมธานี เสีย ๑ เครื่อง ขอให้แก้ไขให้เรียบร้อย โดยจะพานักข่าวมาตรวจสอบทุกวัน ขอความกรุณา ผคก.ชป.๑๑ จัดส่งช่างมาดำเนินการแก้ไขให้ด้วย

ประธาน : ผคก.ชป.๑๑ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำ

ผู้แทน ผคก.ชป.๑๑ : สชป.๑๑ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ๑๐ ล้านบาท ขณะนี้ได้จัดทำประมาณการแล้ว เครื่องสูบน้ำของโครงการฯ ปทุมธานี ที่เสียรวมอยู่ในนี้ด้วย ซึ่งต้องได้รับอนุมัติงบประมาณก่อนถึงจะดำเนินการได้

ผศบ.พระยาบรรลือ : งบประมาณเป็นส่วนหนึ่ง เครื่องสูบน้ำที่เสียซ่อมฉุกเฉินได้หรือไม่ หรืออาจจะต้องสับเปลี่ยน/หมุนเวียน เพื่อให้ทำงานได้ก่อน เพราะโครงการฯ ปทุมธานี เป็นเมืองหน้าด่าน

ประธาน : ผคก.ชป.๑๑ ประสาน/ติดตาม

ผศบ.ปทุมธานี : เรื่องเครื่องสูบน้ำ ผวจ.ปทุมธานี กังวลมาก และอีกประมาณ ๒ ชั่วโมง

จะพาคณะ...

จะพาคณะผู้บริหารจังหวัด การไฟฟ้า ส่วนราชการทั้งหมด ไปตรวจเครื่องสูบน้ำที่โครงการฯ รั้งลิตได้ ส่วนเครื่องสูบน้ำของโครงการฯ ปทุมธานี ที่เสียประมาณหนึ่งเดือนจะซ่อมให้แล้วเสร็จ

ประธาน : เรื่องเกี่ยวกับสภาพความพร้อมของเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำประจำ ประตูระบายต่างๆ ธรบ. ผาก สำนักงานชลประทานต่างๆ จะต้องมีความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์น้ำที่จะมาถึง ตรวจสอบ/ขึ้นป้ายให้ชัดเจน ถ้ามีปัญหาให้รายงานเสนอกรมและดำเนินการซ่อมเพื่อให้พร้อมใช้งาน ผากโครงการตรวจสอบ

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ การประกาศทางน้ำชลประทานตาม พรบ. มาตรา ๕ และมาตรา ๘

บน.ชป.๑๑ : แผน-ผล การขอประกาศทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา ๕ ปี ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ ๗)

-แผน/ผล การขอออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา ๘ มาตรา ปี ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ ๘) ของโครงการฯ ภาษีเจริญ ทั้ง ๒ ทางน้ำที่มีปัญหาคือแนวเขตการปกครอง คลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามประกาศมาตรา ๕ คาดว่าอาจจะต้องยกเลิก และขอเปลี่ยนเป็นทางน้ำอื่น และในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรมเชิญประชุม Workshop แจงที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

บน.ชป.๑๑ : สภาพอากาศทั่วไปจากแผนที่อากาศผิวพื้น วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. (ตามเอกสารแนบ ๙)

- การคาดการณ์ปริมาณฝนจากแบบจำลองสภาพอากาศ WRF-ROMS ช่วงวันที่ ๑๑-๑๓, ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ ๑๐, ๑๐/๑)

-สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน น้ำใน ๔ เขื่อนหลัก ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เทียบกับ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ ๑๑)

- สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ตามเอกสารแนบ ๑๒)

- แผนผังสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ ๑๓)

- จุดและเกณฑ์ควบคุมน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูฝนปี ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ ๑๔)

- สถานการณ์น้ำ ณ จุดควบคุม วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ ๑๕)

- จุดเฝ้าระวังระดับน้ำ ในเขต สชป.๑๑ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระดับน้ำจุดต่างๆ

ขณะนี้ต่ำกว่าจุดวิกฤต ส่งผลให้บางโครงการเกิดปัญหาถนนบนคันคลองเสียหาย (ตามเอกสารแนบ ๑๖, ๑๖/๑)

- สถานการณ์ความเค็มของแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำนครนายก จุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม สชป.๑๑ (ตามเอกสารแนบ ๑๗)

- รายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๙ ในเขต สชป.๑๑ (ตามเอกสารแนบ ๑๘) ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) แผนจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ปี ๒๕๕๙

บน.ชป.๑๑ : แผนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) (ตามเอกสารแนบ ๑๙)

- แผนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มบริหาร) (ตามเอกสารแนบ ๒๐)

ประธาน : ...

ประธาน : ผวก บ.น.ชป.๑๑ เนื่องจากขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน ช่วยเตือนข้อมูลกับโครงการสภาวะไหนที่ต้องเตรียมความพร้อมสถานการณ์น้ำ

บ.น.ชป.๑๑ : ช่วงนี้ยังไม่เข้าฤดูฝนทีเดียวเพราะยังมีฝนทิ้งช่วง เห็นควรกักเก็บน้ำอยู่ในระดับปกติไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย โครงการทราบอยู่แล้ว จุดไหน ระดับเท่าใดที่จะเหมาะสม ตรงไหนที่มีน้ำเสียก็ระบายน้ำตามจังหวะการขึ้นลง ขณะนี้แม่น้ำท่าจีนเริ่มมีปัญหา น้ำเริ่มเสีย กรมทราบแล้ว โดยจะเพิ่มน้ำจากโพธิ์พระยามาให้ เมื่อสัปดาห์ก่อนน้ำเสียจะอยู่แถวโครงการฯ เจ้าเจ็ด โครงการฯ พระยาบรรลือ ขณะนี้ น้ำเสียลงมาถึงโครงการฯ พระพิมล แล้ว

ผค.บ.พระยาบรรลือ : แม่น้ำท่าจีนจะมีปัญหาฝักตบชวา

ผค.บ.พระพิมล : น้ำเริ่มเสีย คุณภาพน้ำเริ่มไม่ดี ที่แม่น้ำท่าจีนอยู่ในเกณฑ์เริ่มเฝ้าระวังประเด็นปัญหา ขณะนี้ได้รับการประสานใน กทม. น้ำลดต่ำลงมากและมีน้ำเสียในพื้นที่ กรมประสานให้รับน้ำตามรอบเวรที่กรมกำหนด รับน้ำเข้าประตุมหาสวัสดิ์ วันละประมาณ ๕ ชั่วโมง ตั้งแต่วັນนี้เป็นเวลา ๓ วัน สลับกับพื้นที่ตอนบน เพราะในพื้นที่ยังมีคลองพระยาภิรมย์กับคลองทวีวัฒนาที่ค่าความเค็มยังคงค้างช่วงกลางคลองอยู่ที่ประมาณ ๐.๗ กรัม/ลิตร

ประธาน : ผวกโครงการฯ พระพิมล ประสานเจ้าหน้าที่ กทม. /ท้องถิ่น อย่างใกล้ชิด

บ.น.ชป.๑๑ : เรื่องการตรวจสอบสถานีสูบน้ำ ที่คณะทำงานออกไปตรวจ วันนี้ไปตรวจที่โครงการฯ รังสิตใต้ วันพรุ่งนี้ไปตรวจที่โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ทุกโครงการรวบรวมเอกสารส่งที่บ.น.ชป.๑๑ เพื่อจะได้สรุปเสนอกรม ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ส่วนแผนงาน

(๑) ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online

ตป.ชป.๑๑ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ ๒๑)

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะงบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. ๒๕๕๙ รายสำนัก ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ ๑๑/๗/๒๕๕๙ สชป.๑๑ อยู่ลำดับที่ ๑๔ ได้ ๗๔.๐๗% (ตามเอกสารแนบ ๒๒)

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะงบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. ๒๕๕๙ รายโครงการ (ตามเอกสารแนบ ๒๓)

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สชป.๑๑ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ ๒๔)

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) ผลการดำเนินงานกำจัดวัชพืชตามนโยบายรัฐบาล

- แผนกำจัดวัชพืชในเขต สชป.๑๑ ปี ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ ๒๕)

- ขณะนี้มีงานใหม่ส่งเข้ามาใน Online ๗๐ กว่างาน เจ้าหน้าที่กำลังจะจัดให้แต่ละโครงการ ผส.ชป.๑๑ กำชับ เรื่องการรายงานติดตามในระบบ Online ขอให้โครงการตรวจสอบ เพราะเป็นตัวชี้วัดและเป็นภาพรวมของสำนัก

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญของ สชป.๑๑

ว.ค.บ.รังสิตเหนือ : งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน สัญญาเลขที่ กจ. ๓๙/๒๕๕๘ (กสพ.) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้รับจ้าง บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด อายุสัญญาเริ่ม

๒๖ พฤษภาคม...

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รวมอายุสัญญา ๗๒๐ วัน วงเงินสัญญา ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แผนปฏิบัติงานสะสม ๓๘.๖๒% ผลปฏิบัติงานสะสม ๑๘.๕๒% ซ้ำกว่าแผน ๒๐.๑๐%
 - งานจ้างเหมาติดตั้งคอนกรีตคอง ๙ ซ้าย ระพีพัฒน์แยกตก (ระยะที่ ๓) สัญญาเลขที่ e-bidding รน.จ.๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้รับจ้าง บริษัท เอ.พี.ซีพหลาย แอนด์ พาร์ท จำกัด อายุสัญญาเริ่ม ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ วงเงินสัญญา ๑๑,๙๘๙,๘๗๗.๕๐ บาท แผนปฏิบัติงานสะสม ๑๐๐% ผลปฏิบัติงานสะสม ๘๒.๔๔% ซ้ำกว่าแผน ๑๗.๕๖%

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญของหน่วยงานสนับสนุน

(๑) โครงการสำคัญของ กพท.

ผู้แทน ผสท.๑๑ : งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ ๒ สัญญาเลขที่ กจ.๑๖/๒๕๕๘ (กสพ.) ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกเวนเนส จำกัด วงเงินตามสัญญา ๓๑๒,๖๒๓,๔๕๘.๕๖ บาท อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ แผนการดำเนินงานสะสม ๒๙.๓๓๕% ผลการดำเนินงานสะสม ๒๗.๕๗๑% ซ้ำกว่าแผนงาน ๑.๗๖๔% อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างกำแพงตั้ง

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสามวา งานดำเนินการเอง ๒ ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ ๑๖๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๘๗,๗๕๐,๐๐๐ บาท แผนงานสะสม ๔๑.๖๓% ผลงานสะสม ๒๕.๖๑% ซ้ำกว่าแผน ๑๖.๐๒% อยู่ระหว่างดำเนินการงานป้องกันบ่อก่อสร้างและตอกเสาเข็มฐานรากตัวอาคาร

- งานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำชลหารพิจิตร สัญญาเลขที่ กจ. ๒/๒๕๕๙ (สพด.) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้รับจ้าง บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด วงเงินตามสัญญา ๖๑๘,๑๗๘,๒๒๕.๗๘ บาท อายุสัญญา ๙๐๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แผนการดำเนินงานสะสม ๐.๕๖๘% ผลการดำเนินงานสะสม ๒๕.๙๑๑% เร็วกว่าแผนงาน ๒๕.๓๔๓% อยู่ระหว่างดำเนินการป้องกันบ่อก่อสร้างอาคารและก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วม

ทั้ง ๓ โครงการสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญาที่วางไว้

ผคบ.พระพิมล : รายงานความก้าวหน้า งานโครงการก่อสร้างที่ ๘ ที่ดำเนินการในเขตโครงการฯ พระพิมล จำนวน ๒ โครงการ คือ

- สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล ๒ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓ ปีงบประมาณ เริ่มปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบประมาณ ๒๐๔ ล้านบาทเศษ สำหรับแผนงานงบประมาณในปี ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติงบประมาณ ๖๗ ล้านบาทเศษ ผลการเบิกจ่าย ๒๕ ล้านบาทเศษ ผลงานสะสม ๙๔.๕๕%

- สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ ๒ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓ ปีงบประมาณ เริ่มปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ๑๒๖ ล้านบาทเศษ ผลการเบิกจ่าย ๑๒๕ ล้านบาทเศษ ผลงานสะสม ๙๗.๕๐% สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ

ประธาน : งานที่เกี่ยวข้องกับกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่อยู่ในเขตโครงการ ผากโครงการประสานข้อมูลเพื่อนำเสนอความก้าวหน้า

วศ.คบ.รังสิตเหนือ : งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ ๒ ล่าสุดที่มีการประชุมร่วมกับสำนัก...

สำนักออกแบบฯ เรื่อง การแก้ไขตัวกำแพงเพื่อไม่ให้ขีดขวางทางน้ำ ไม่ทราบว่า ผสภ.๑๑ ดำเนินการถึงไหนแล้ว

ผู้แทน ผสภ.๑๑ : ทำเรื่องเสนอกกรม สำนักออกแบบฯ ตรวจสอบแล้วต้องมีการขอแก้ไขแบบ และเมื่ออนุมัติแบบแล้วต้องขอแก้ไขสัญญา

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ ส่วนวิศวกรรม

(๑) งานศึกษาพิจารณาโครงการ สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบวิเคราะห์ และธรณีวิทยา

ผศ.ชป.๑๑ : ส่วนวิศวกรรม รับผิดชอบ ๕ ฝ่าย ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สรุปภาพรวม ๗๔ งาน แล้วเสร็จ ๕๓ งาน คิดเป็น ๗๑.๖๒% งานนอกแผน ๓๓๑ งาน แล้วเสร็จ ๓๓๐ งาน (ตามเอกสารแนบ ๒๖)

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ ส่วนเครื่องจักรกล

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้แทน ผคภ.ชป.๑๑ : ส่วนเครื่องจักรกล มีเครื่องสูบน้ำถาวรและกึ่งถาวร ๖๓๔ เครื่อง ใช้งานได้ ๕๘๕ เครื่อง คิดเป็น ๙๒.๒๗% ซ้ำรูป ๔๙ เครื่องคิดเป็น ๗.๗๓% (ตามเอกสารแนบ ๒๗)

- ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส่วนเครื่องจักรกล ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน

ที่ประชุมรับทราบ

บน.ชป.๑๑ : ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ประสานว่าจะเข้าไปตรวจเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวรที่ยังไม่ได้โอนให้ สชป.๑๑ การตรวจมี ๒ แบบ คือตรวจ/เช็คระบบไฟไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าตรวจ เดินสายไฟใหม่ มีค่าใช้จ่าย โครงการไหนมีความจำเป็นต้องตรวจสอบเร่งด่วน วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แจ้ง บน.ชป.๑๑

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๖ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

นิติกร สชป.๑๑ : ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ผอส.๒ ลก : ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผน/ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ที่ประชุมรับทราบ

ผู้แทน ผบค.๖ คภ. : ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๖ ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ในเขตพื้นที่ สชป.๑๑ โดยการทำจัดวัชพืชและงานขุดลอก โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ได้แก่ งานขุดลอกคลองวิหารแดง บางพระ ผลงาน ๘๑% ผลเบิกจ่าย ๗๐% งานขุดลอกบางซื่อ คลองวีว ผลงาน ๖๕% ผลเบิกจ่าย ๙๕% และงานขุดลอกคลองอ้อม ผลงาน ๑๐๐% ผลเบิกจ่าย ๑๐๐% งานขุดลอกคลองบางจาก บ้านหมู ยังไม่มีความก้าวหน้า ทั้ง ๔ คลอง จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โครงการฯ พระพิมล งานขุดลอกคลองมะสง เสรีวง ผลงาน ๗๓% โครงการฯ สมุทรสาคร งานขุดลอกคลองพระราม ผลงาน ๗๐% ผลเบิกจ่าย ๙๕% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ส่วนงานกำจัดวัชพืชโครงการฯ รังสิตใต้ จากที่ได้เข้าประชุม ขณะนี้ได้ส่งเครื่องจักรไปที่คลองหกวาสายล่าง เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส่วนที่เหลืออีก ๓ คลองจะเร่งดำเนินการจัดส่งเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานให้ทันฤดูน้ำหลากนี้

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ


๕.๑ การจ่ายค่าจ้างและเงินช่วยเหลือในกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย จำนวน ๓ เท่า
ของค่าจ้าง


งบ.ชป.๑๑ : ผส.ชป.๑๑ ให้แนะนำข้อมูลในเรื่องนี้ก็คือบางโครงการยังไม่ทราบว่าเวลาที่
ลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรมจะต้องมีเงินช่วยเหลือ ๓ เท่า ตามเอกสารที่แจก ผคป. ผคบ. เพื่อจะได้นำเรียนให้
หน่วยงานทราบ การจ่ายค่าจ้างและเงินช่วยเหลือในกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายตัวนี้หมายรวมถึงลูกจ้าง
ชั่วคราวรายวัน ลูกจ้างประจำ/ข้าราชการทราบอยู่แล้ว ขอสงสัยลูกจ้างชั่วคราวรายวันว่าจะจ่ายให้อย่างไร
ลูกจ้างชั่วคราวรายวันปัจจุบันปกติจะจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ ๓๔๕ บาท ลูกจ้างชั่วคราวจะมาทำงานในเดือนที่ถึงแก่
ความตาย คือมาทำงานไม่เต็มเดือนแต่ถือเสมือนว่ามาทำงานเต็มเดือนเพื่อจะนำเงินค่าจ้างรายเดือนนั้นคุณ
สามเท่าเรียกว่าเงินช่วยเหลือ/เงินช่วยค่าทำศพ เพราะฉะนั้นลูกจ้างชั่วคราวรายวันมีสิทธิที่จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือพิเศษตัวนี้ด้วย ส่วนค่าแรงเบิกจ่ายหมวด ๗๐๐ ของโครงการจ้าง ถึงวันที่เซ็นชื่อทำงาน แต่จะจ่ายให้
ญาติหลังจากสืบสวนมรดกจบแล้ว โครงการจัดทำใบสำคัญค่าแรงส่งหน่วยเบิกจ่ายที่สังกัดของเงินหมวด ๗๐๐
ส่วนเงินช่วยเหลือสามเท่า โครงการทำเรื่องเสนอ ผส.ชป.๑๑ ผ่าน ผคป./ผคบ. เพื่อขออนุมัติให้เบิกจ่าย โดย
สชป. ๑๑ จะจ่ายให้ทายาท จากเงินงบบกลาง


ที่ประชุมรับทราบ


ท้ายการประชุม ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



.....
(นางสาวสุภาพร คุมดวง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม




.....
(นางประจวบ พ่วงศรี)
ผู้จดยานงานการประชุม

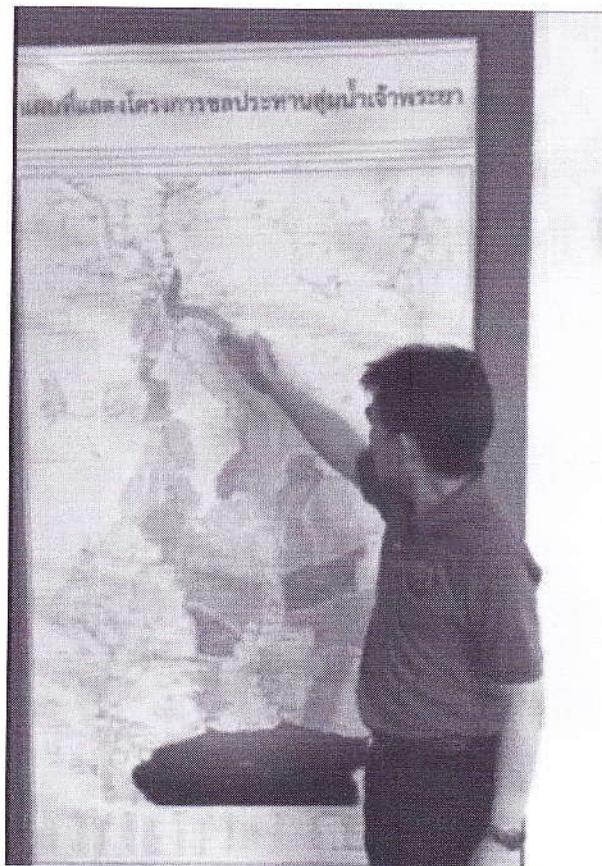

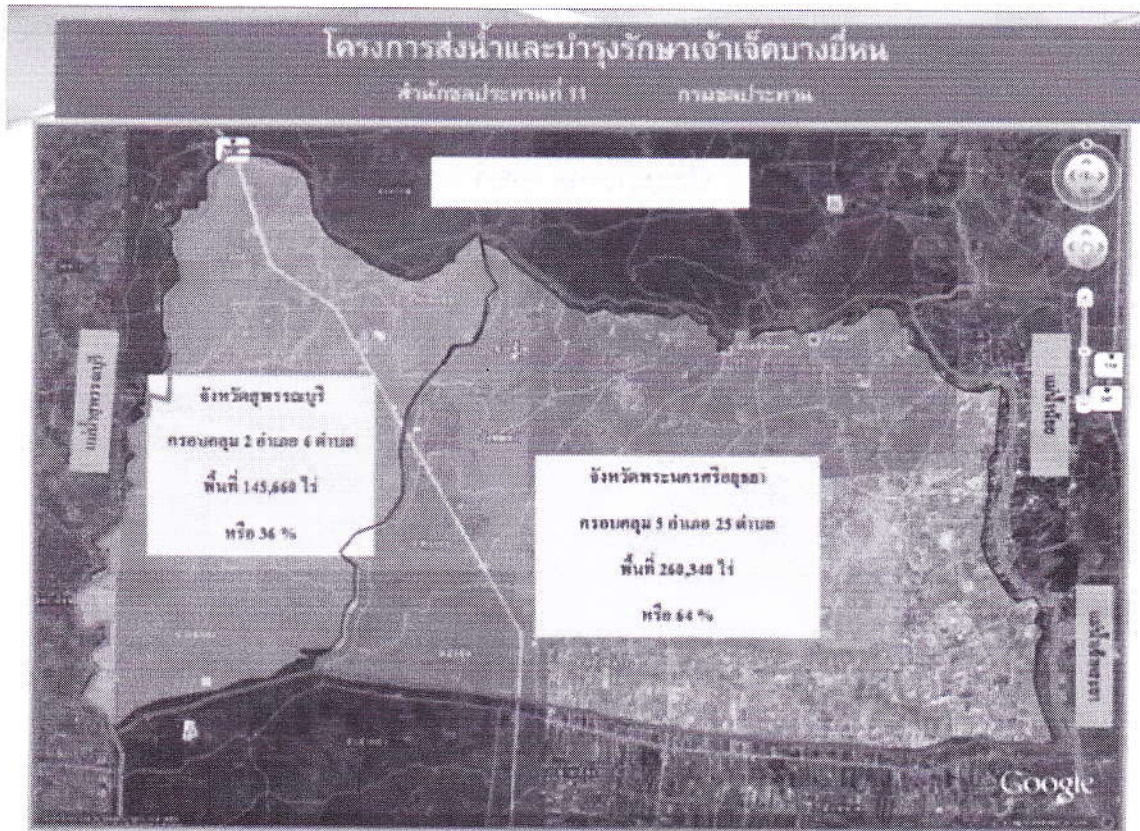

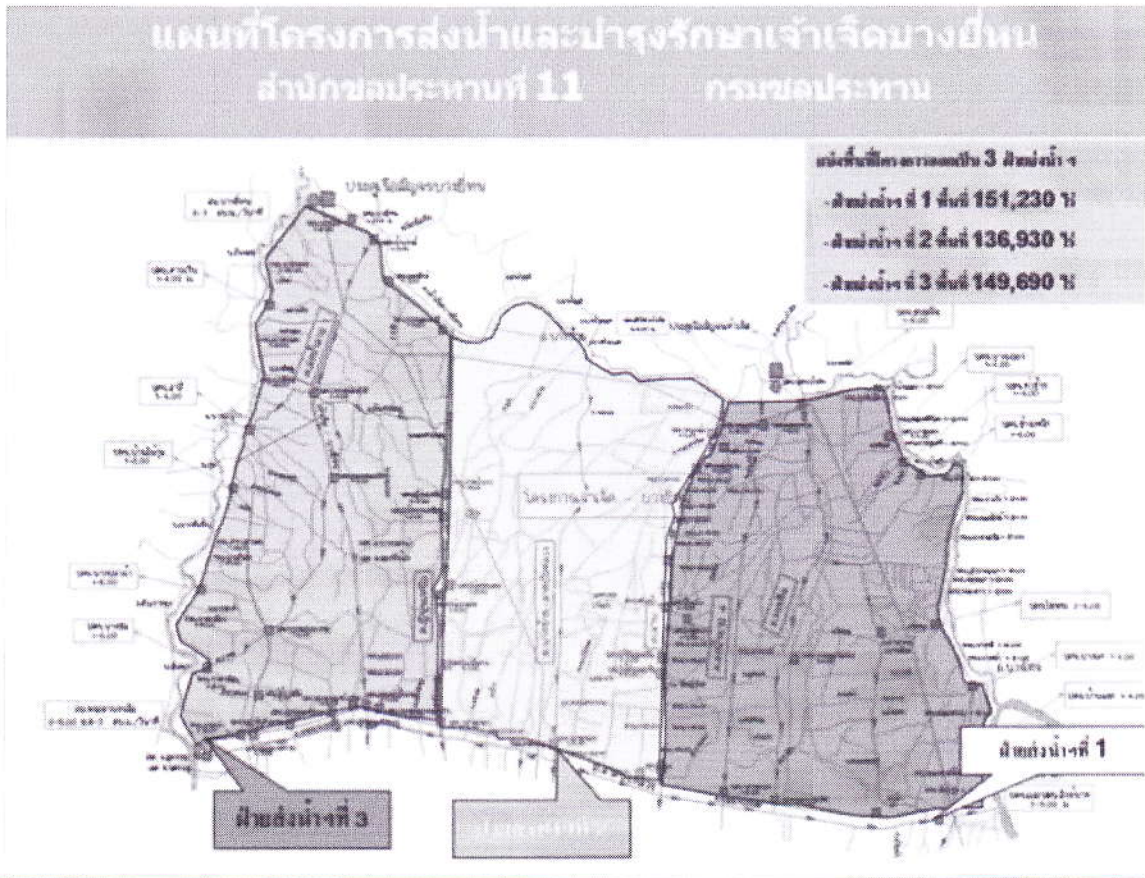





แผน-ผล การขอประกาศทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา 5 ปี 2559

สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ลำดับที่	การขอประกาศทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา ๕ (ปี ๒๕๕๙)	สถานะผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล		
	1.1 ทางน้ำคลองบางแก้วฟ้า	เป็น ม.๕ ๒๒ มี.ค ๕๙	
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้		
	2.1 คลอง 14	อยู่ระหว่างโครงการจัดทำ	
	รวม	๒	


แผน — ผล การขออนุญาตออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา 8 ปี 2559

สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ลำดับที่	แผนปฏิบัติการขออนุญาตออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา ๘ (ปี ๒๕๕๙)	สถานะผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน		
	1.1 คลองบางซ้าย-ลาดบัวหลวง	อยู่ระหว่างโครงการจัดทำ	
๒	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากาญจนาภิเษก		
	2.1 คลองสี่วาตากล่อม	อยู่ระหว่างโครงการแก้ไขและเพิ่มเติมเอกสารและแผนที่	ส่งเรื่องคืนโครงการฯ เพื่อให้ตรวจสอบใหม่เนื่องจากแนวเขตการปกครอง คลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามประกาศ ม.๕ เดิม
	2.2 คลองบางน้ำจืด	อยู่ระหว่างโครงการแก้ไขและเพิ่มเติมเอกสารและแผนที่	ส่งเรื่องคืนโครงการฯ เพื่อให้ตรวจสอบใหม่เนื่องจากแนวเขตการปกครอง คลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามประกาศ ม.๕ เดิม
๓	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ		
	3.1 คลองระบายน้ำที่ 1		ส่งเรื่องให้เงินทุน วันที่ ๓ พ.ค. ๕๙
๔	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้		
	4.1 คลองซอยที่ 13	อยู่ระหว่างโครงการจัดทำ	
	รวม	๕	


การคาดการณ์ปริมาณฝนจากแบบจำลองสภาพอากาศ WRF-ROMS (ความละเอียด 3x3 กม.) ช่วงวันที่ 11-13 ก.ค. 59

10-Jul-2016 19:00 to 11-Jul-2016 19:00 (Bangkok Time)

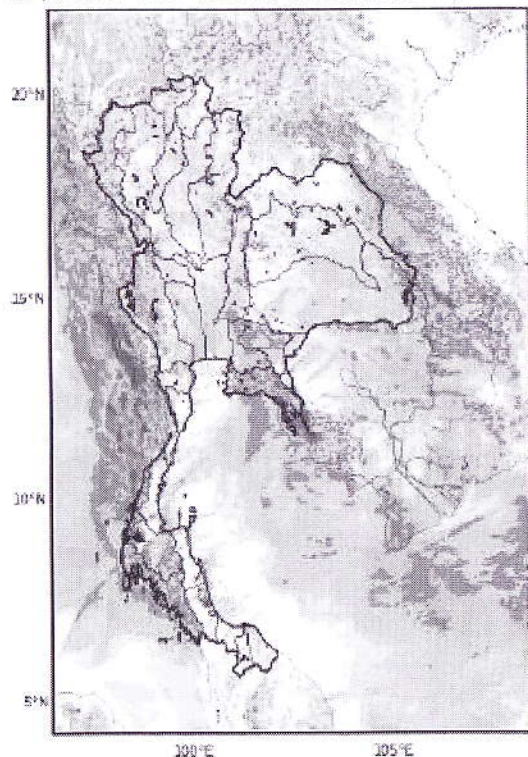


11 ก.ค. 59

11-Jul-2016 19:00 to 12-Jul-2016 19:00 (Bangkok Time)

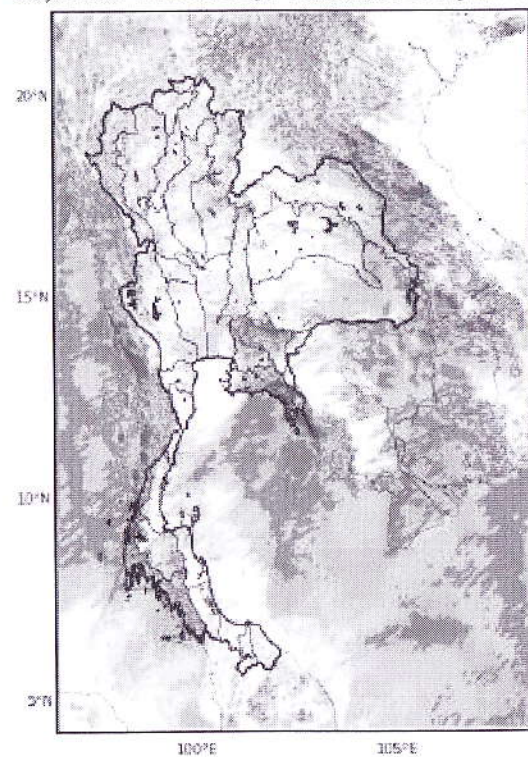

12 ก.ค. 59

12-Jul-2016 19:00 to 13-Jul-2016 19:00 (Bangkok Time)

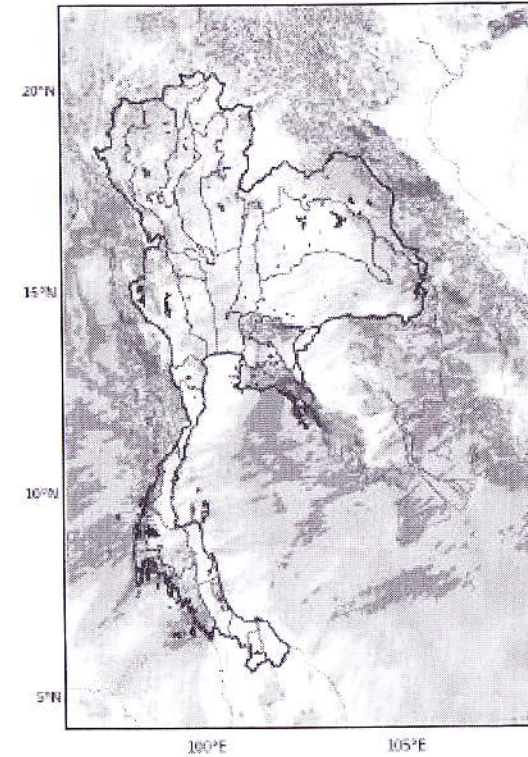

13 ก.ค. 59

