



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๔

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 5/2565



ส่วนแผนงาน

สำนักงานชลประทานที่ 11

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11

รายละเอียดข้อมูล



- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



- รายงานผลการเบิกจ่าย งบรายจ่ายประจำปีงบลงทุน 2566



- รายงานผลการเบิกจ่าย งบกลางปี 2565




- รายงานผลการเบิกจ่าย งบกันเหลื่อมปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



- รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณที่ถูกพับปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564



*ข้อมูลจากระบบ Cen-Project ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

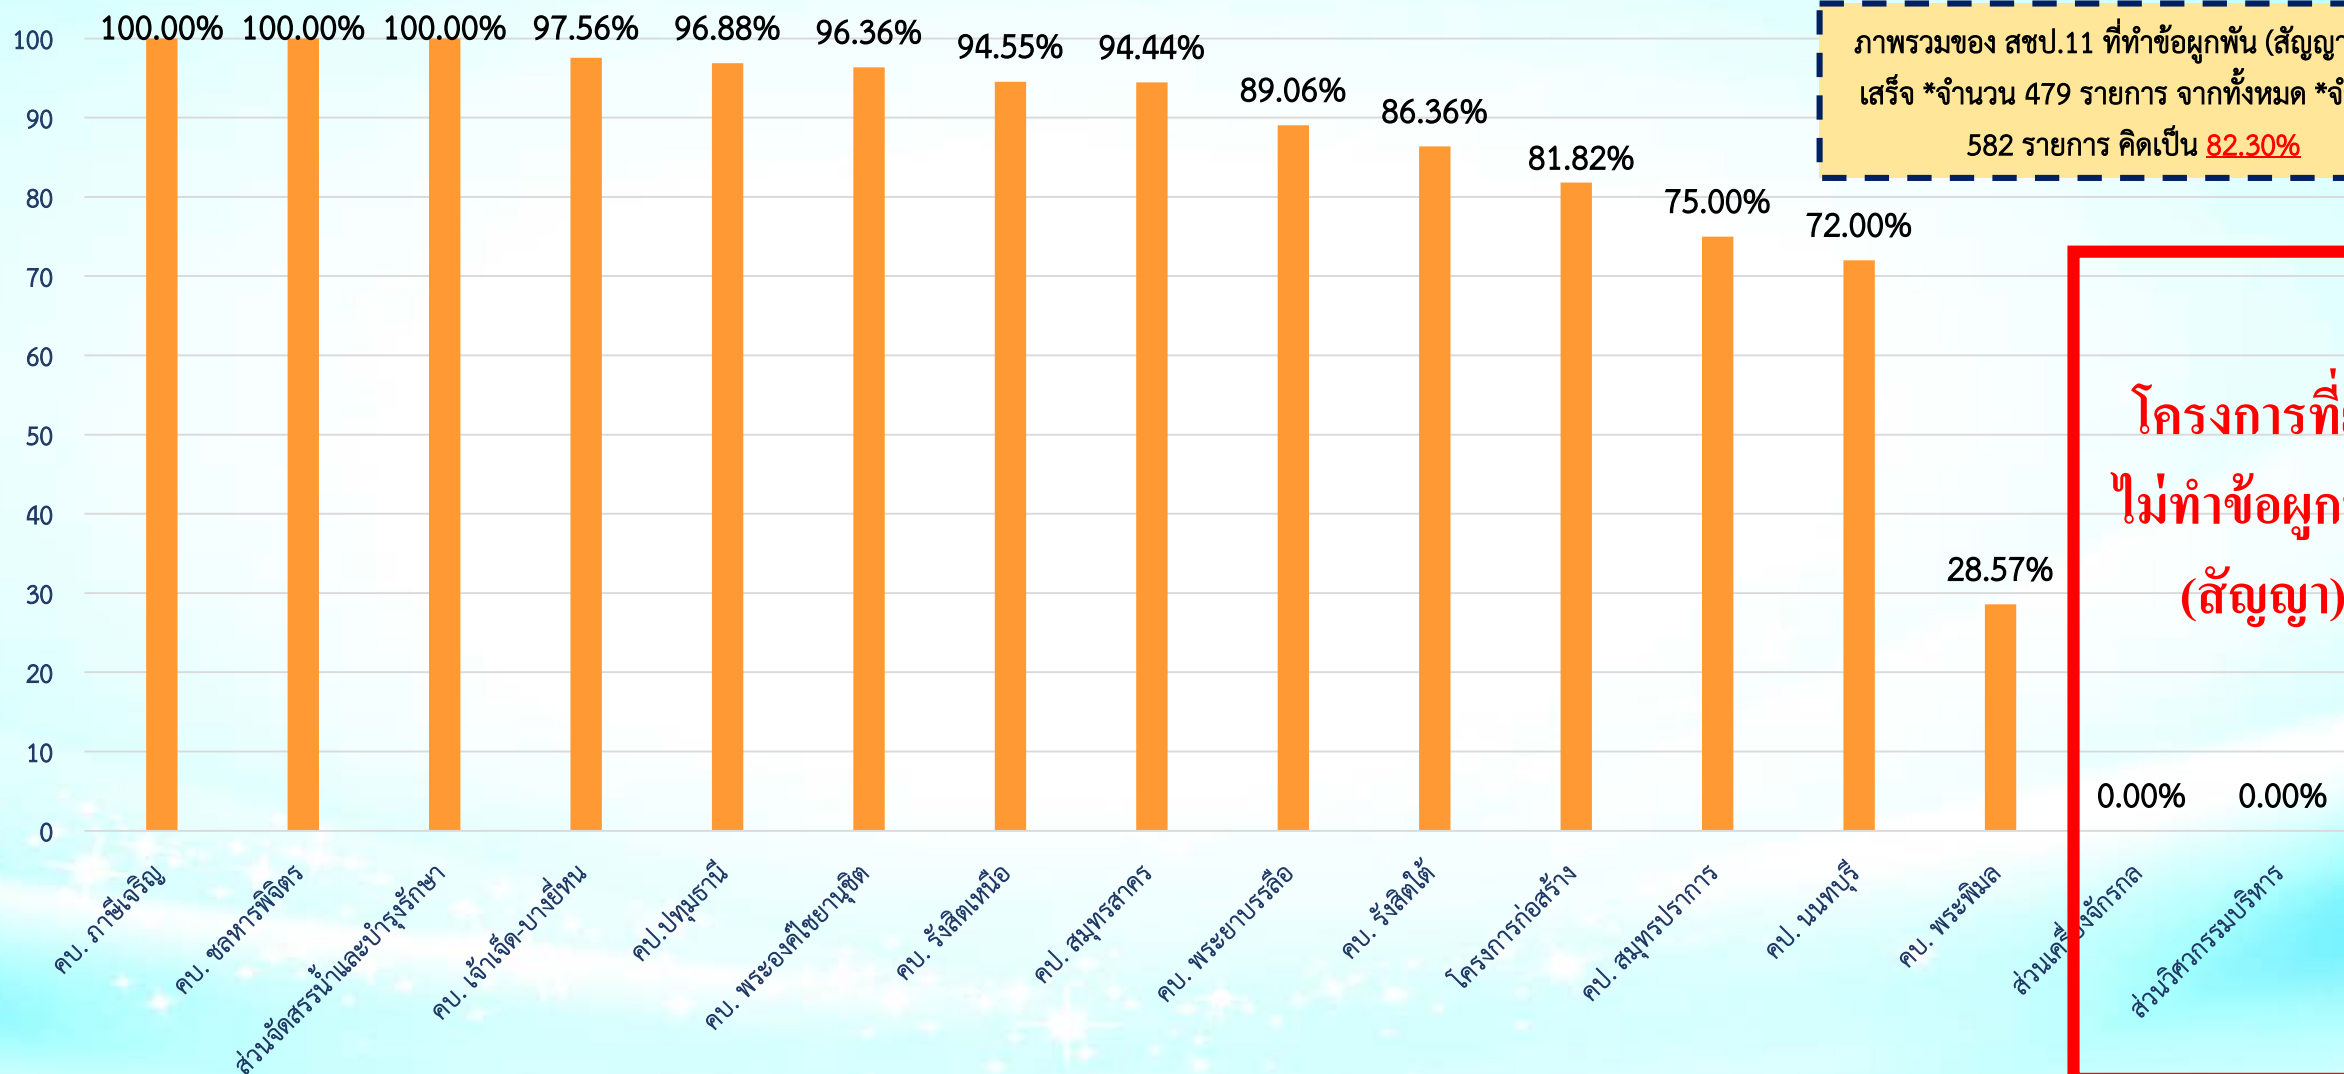

ภาพรวมของ สชป.11 ที่ทำข้อผูกพัน (สัญญา) แล้วเสร็จ *จำนวน 479 รายการ จากทั้งหมด *จำนวน 582 รายการ คิดเป็น **82.30%**


โครงการที่ยังไม่ทำข้อผูกพัน (สัญญา)

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง

โอน

จัดสรร

หน่วยงาน	รวมที่ต้องดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ		1.อยู่ระหว่างเตรียมการ		2.อนุมัติแผน		3.ประกาศ TOR		4.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง		5.เปิดซอง		6.อนุมัติรับราคา		7.ทำข้อผูกพัน (สัญญา)		โอน จัดสรร
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	
โครงการก่อสร้างชลประทานที่ 11	12	759.2781	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	180.0000	0	0.0000	2	98.5000	9	480.7781	10
โครงการชลประทานนทบุรี	25	33.8256	0	0.0000	0	0.0000	1	1.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	6	10.6450	18	22.1806	24
โครงการชลประทานปทุมธานี	32	17.2721	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	1.0000	31	16.2721	31
โครงการชลประทานสมุทรปราการ	20	15.0723	0	0.0000	0	0.0000	4	0.9323	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	0.4000	15	13.7400	20
โครงการชลประทานสมุทรสาคร	18	19.0742	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	1.0000	17	18.0742	17
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน	41	30.6826	0	0.0000	0	0.0000	1	1.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	40	29.6826	41
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	51	397.8323	0	0.0000	0	0.0000	1	26.4000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	50	371.4323	50
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	84	71.1956	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	60	52.7938	24	18.4018	74
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	64	43.6160	0	0.0000	0	0.0000	4	3.0700	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	3	1.8600	57	38.6860	61
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	110	98.2149	0	0.0000	3	24.0000	1	1.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	106	73.2149	106
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาชีเจริญ	21	12.6585	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	21	12.6585	21
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	45	33.7413	0	0.0000	0	0.0000	6	5.6860	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	0.7500	38	27.3053	44
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	55	80.0256	0	0.0000	0	0.0000	2	10.8500	1	25.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	52	44.1756	53
ส่วนเครื่องจักรกล สขป .11	2	29.5000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	2	29.5000	0	0.0000	1
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สขป .11	1	0.9346	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	0.9346	1
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป .11	1	13.9592	0	0.0000	0	0.0000	1	13.9592	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1
สำนักงานชลประทานที่ 11	1	0.0326	0	0.0000	1	0.0326	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
รวม	583	1,656.9155	0	0.0000	4	24.0326	21	63.8975	1	25.0000	1	180.0000	0	0.0000	77	196.4488	479	1,167.5366	555

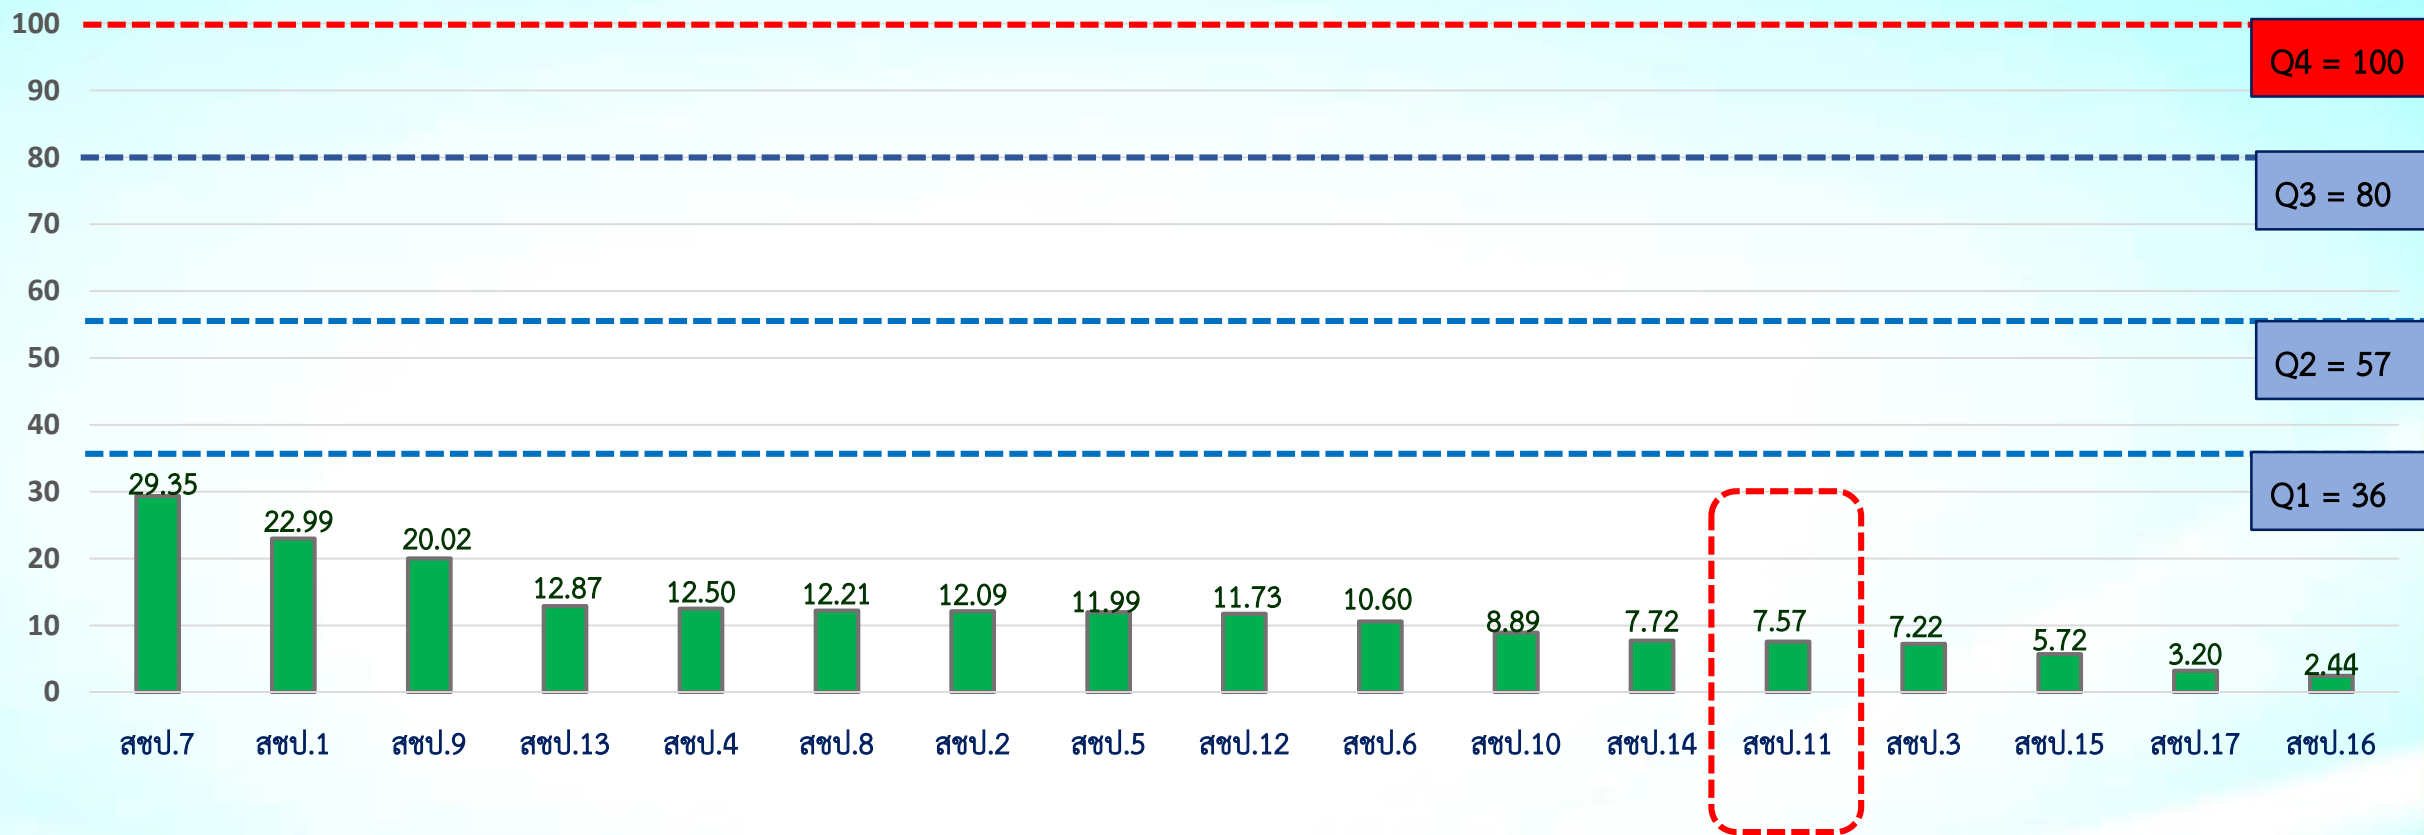


คาดการณ์เบิกจ่าย สขป.11 ไตรมาส 1 ร้อยละ 13.66 %



ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

- ได้รับการโอนจัดสรร 1,103,279,165 บาท
- ผลเบิกจ่าย 83,558,775 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 7.57 %

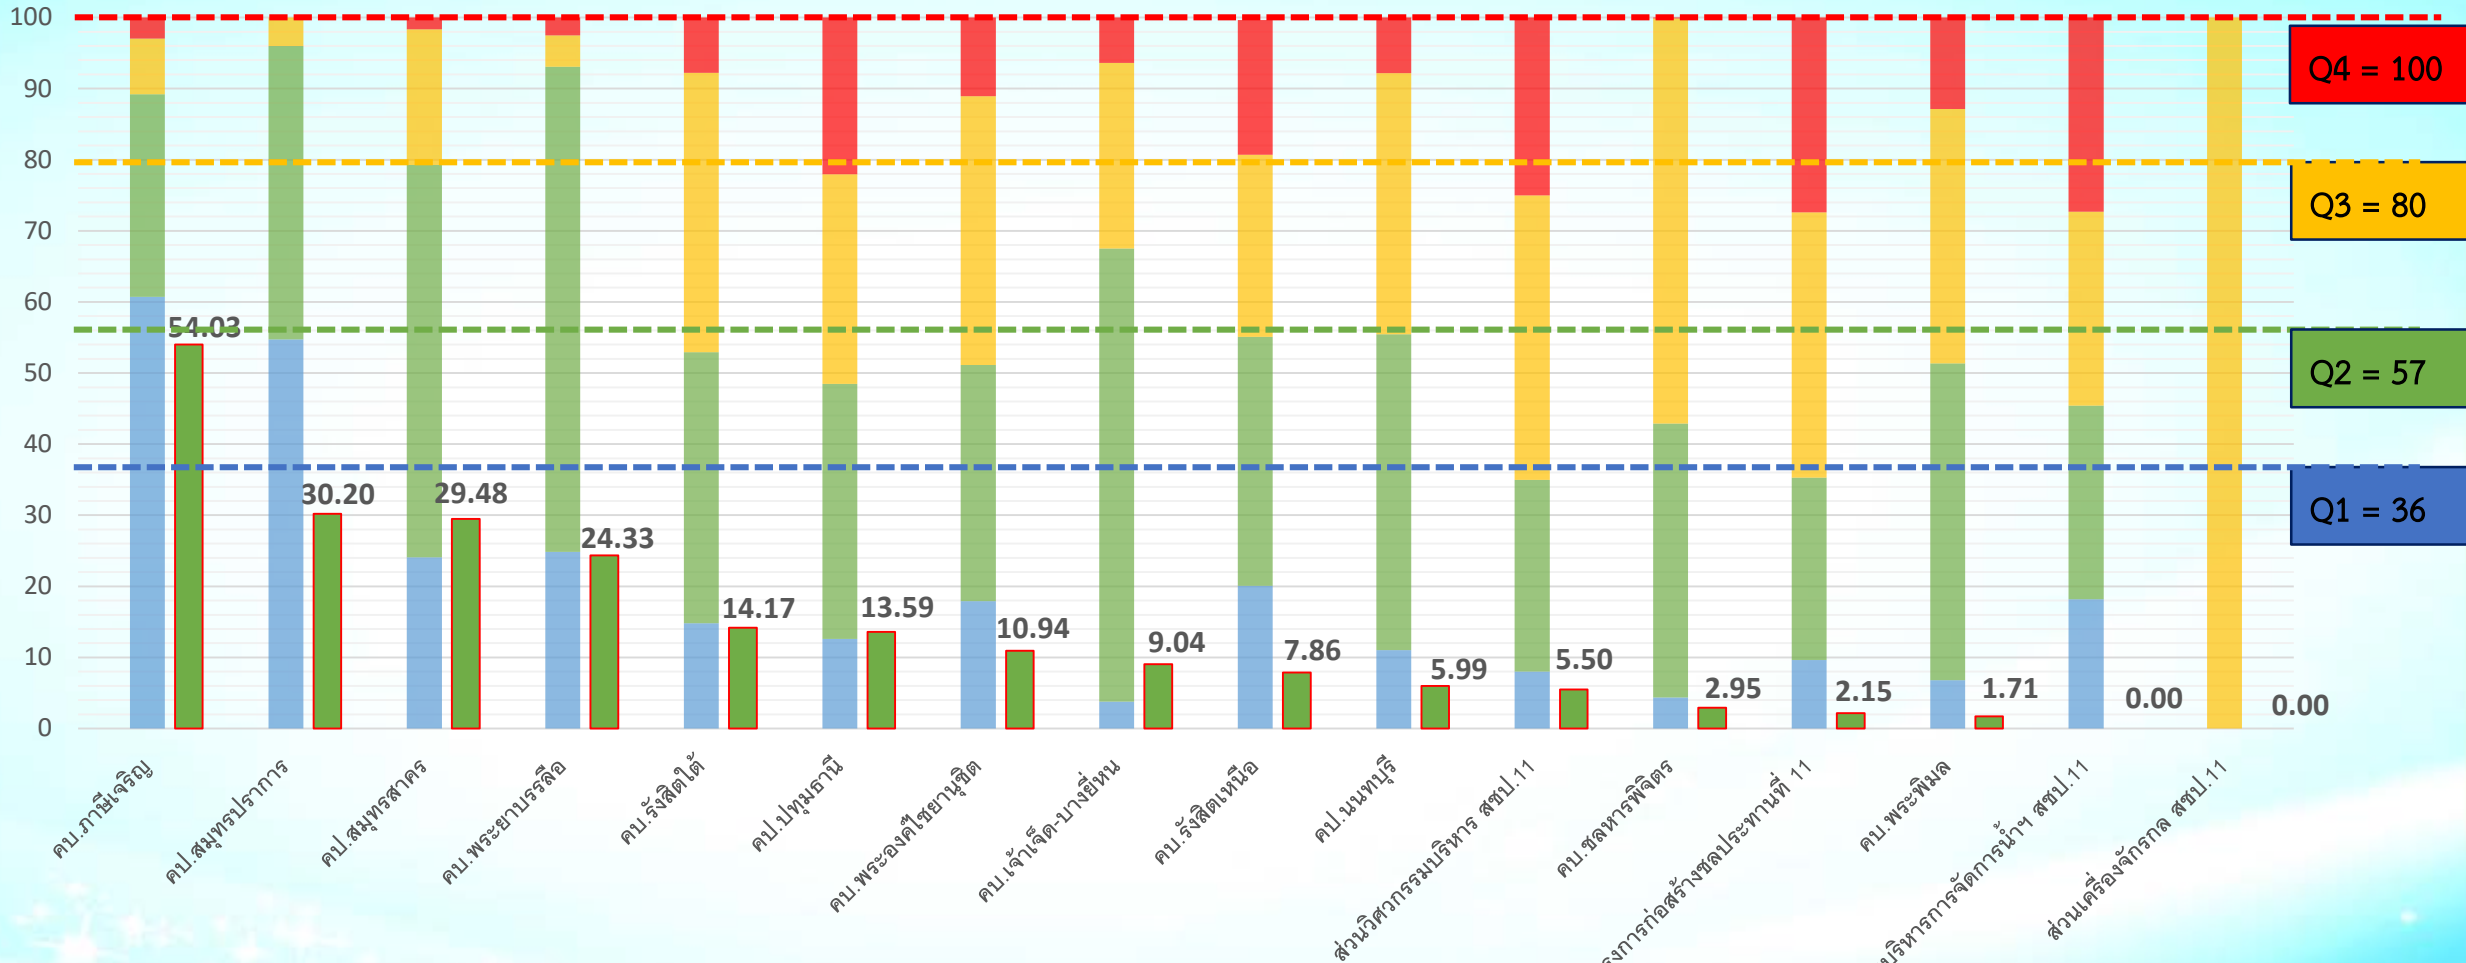


เป้าหมายกรม ประจำปีไตรมาส 1 ร้อยละ 36 %

คาดการณ์เบิกจ่าย ประจำเดือน ธ.ค. 65 ร้อยละ 10.53 %

- วงเงินงบประมาณ 1,575,095,600 บาท
 - ผลเบิกจ่าย 83,558,775 บาท
 - คิดเป็นร้อยละ 5.30 %

ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

- คาดการณ์ไตรมาส 1
- คาดการณ์ไตรมาส 2
- คาดการณ์ไตรมาส 3
- คาดการณ์ไตรมาส 4

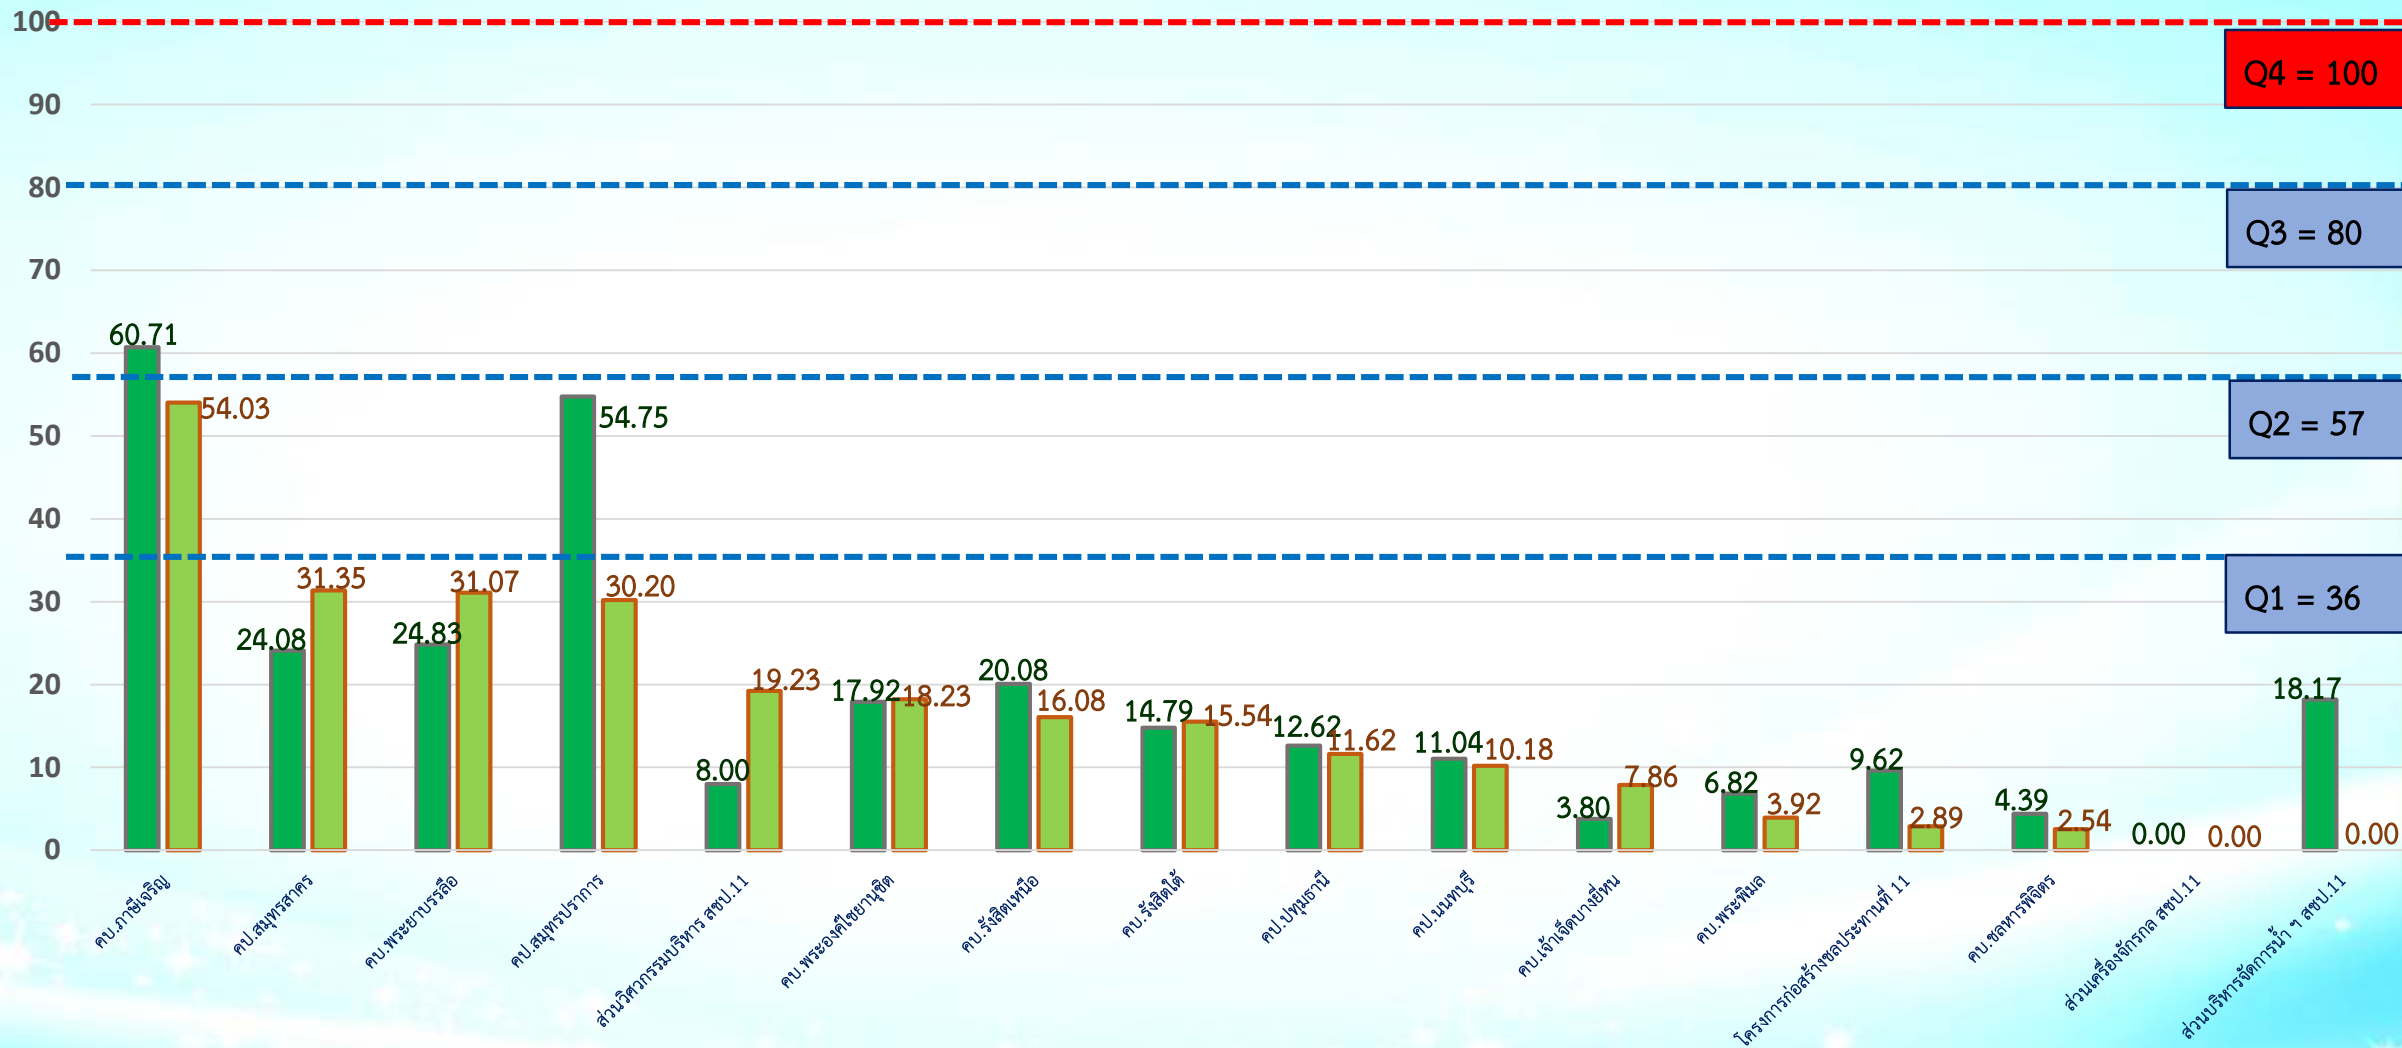

เป้าหมายกรม ประจำปีไตรมาส 1 ร้อยละ 36 %

คาดการณ์เบิกจ่าย ประจำเดือน ธ.ค. 65 ร้อยละ 10.53 %

- ได้รับการโอนจัดสรร 1,103,279,165 บาท
- ผลเบิกจ่าย 83,558,775 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 7.57 %

แผนการเบิกจ่าย เดือน ธันวาคม 2565


ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565


หมายเหตุ : ยังไม่รวมหน่วยเบิกจ่ายสมุทรสาคร



ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

- ได้รับการโอนจัดสรร 23,139,611 บาท
- ผลเบิกจ่าย 20,723,940 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 89.56 %

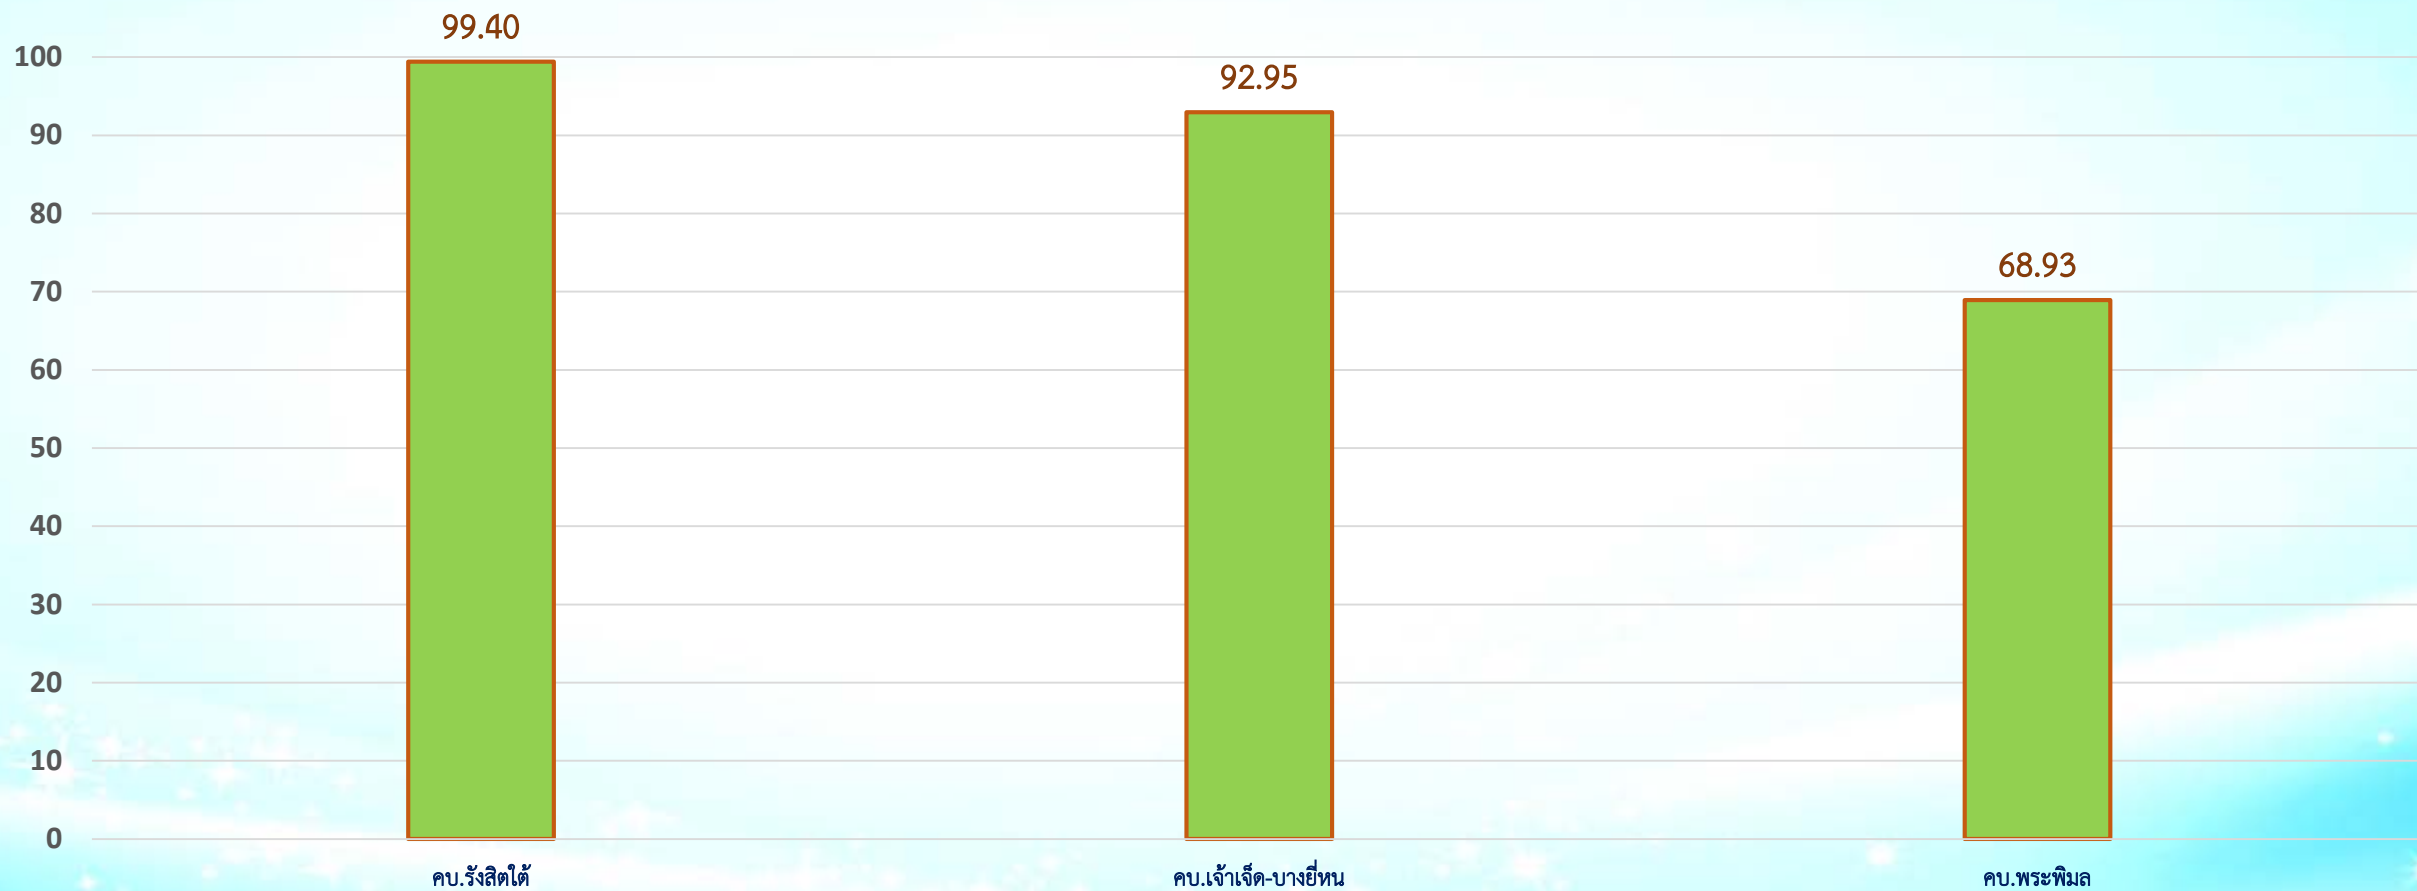

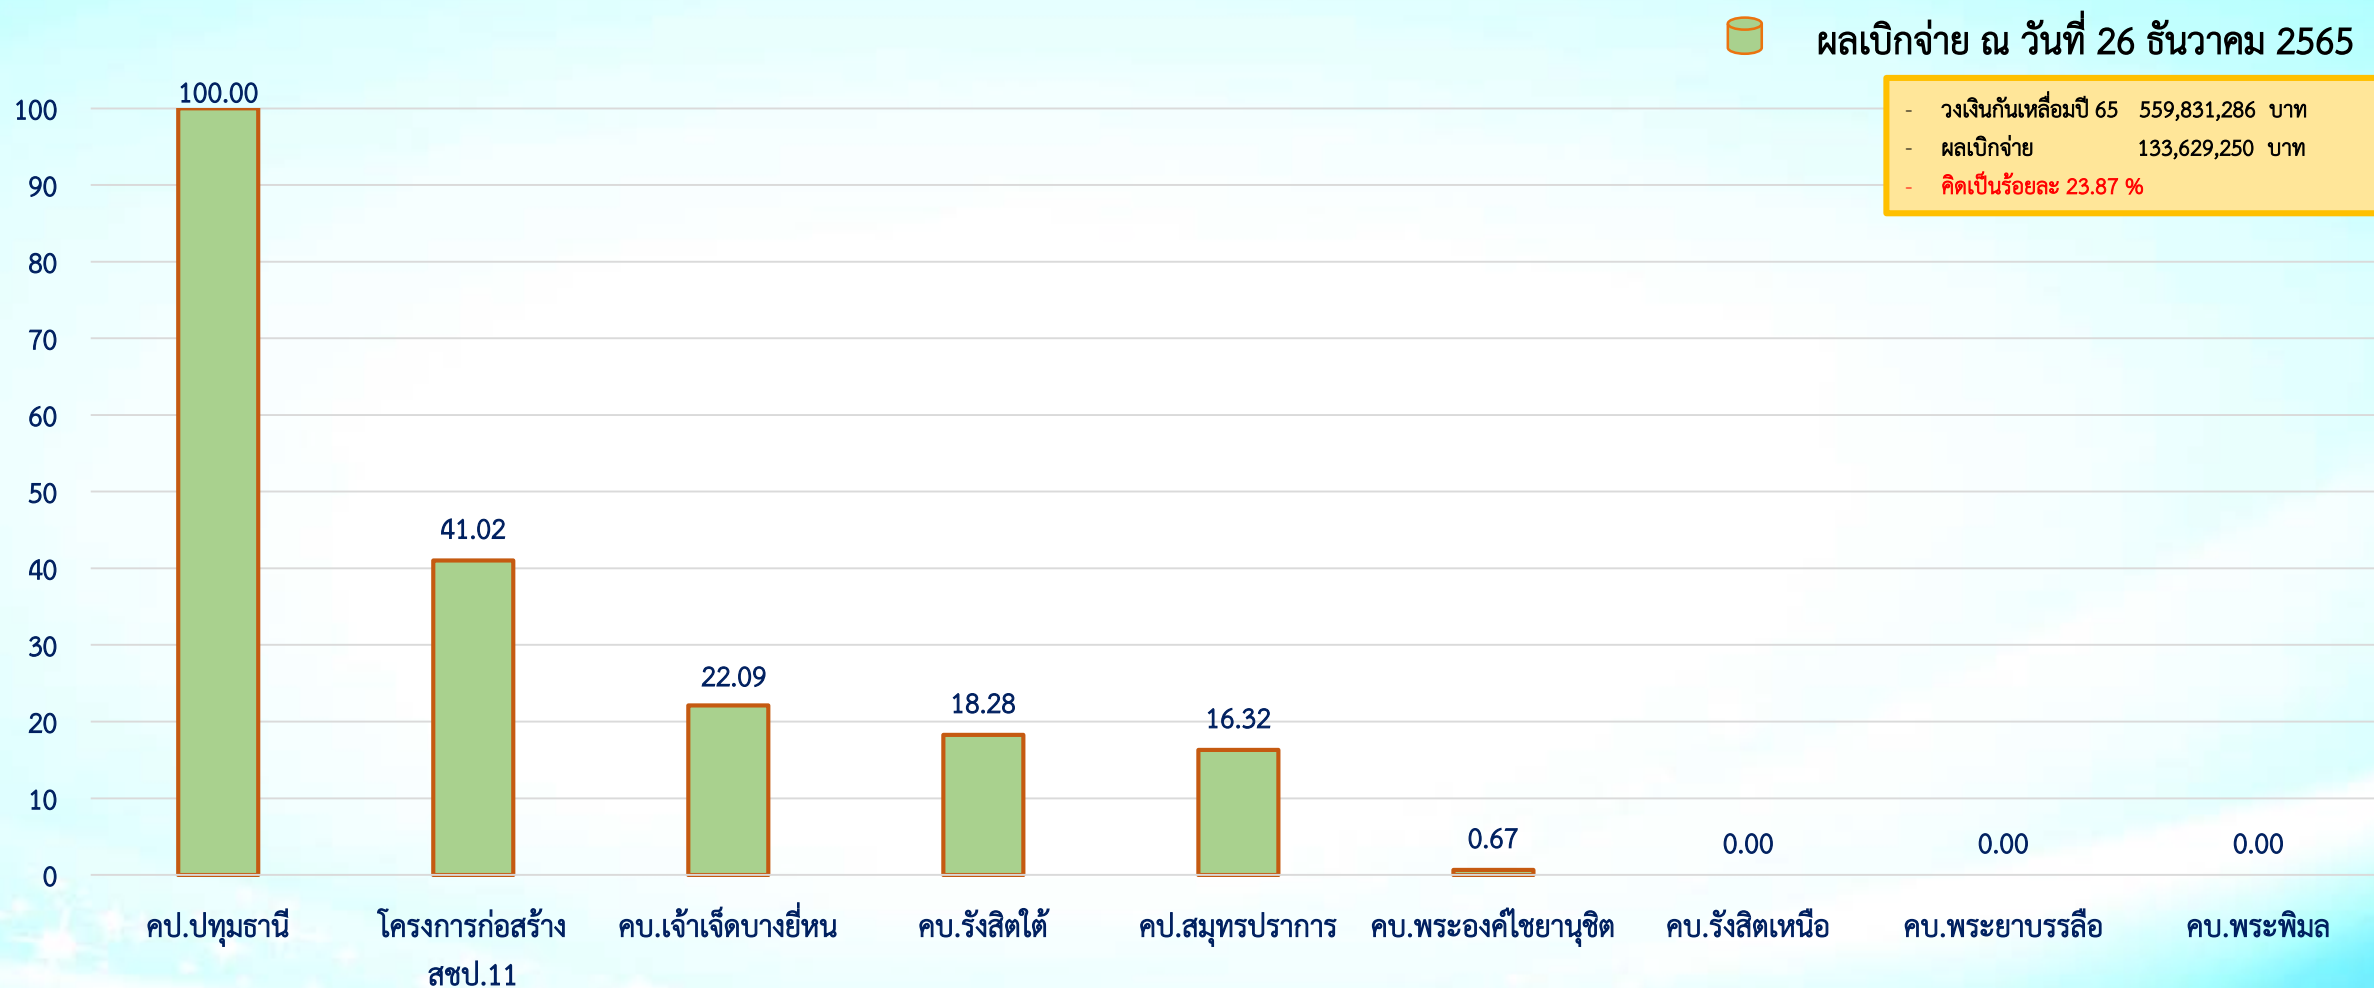

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ชื่องาน / งบประมาณการ	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท) ณ 19 ต.ค. 65	คงเหลือ (เงินพับ)	หมายเหตุ	
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ปรับปรุงเสริมคันคลองรังสิตตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี	65.61	53,084,131.78	30,974,093.62	22,110,038.16	สัญญาเลขที่ กจ.33/2562 (สพด.) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 วงเงินตามสัญญา 53,084,131.78 บาท	
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง ระหว่างคลอง 7-8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	62.67	59,300,320.00	16,569,699.33	42,730,620.67	สัญญาเลขที่ กจ.32/2562 (สพด.) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 วงเงินตามสัญญา 59,300,320 บาท	
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ปรับปรุงเสริมคันคลองหกวาตำบลพิชอุดม อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี	53.36	53,898,778.62	20,620,128.42	33,278,650.20	สัญญาเลขที่ กจ.26/2562 (สพด.) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 วงเงินตามสัญญา 53,898,778.62 บาท	
คบ.รังสิตใต้รวมทั้งสิ้น 3 รายการ					166,283,230.40	68,163,921.37	98,119,309.03	
4	โครงการชลประทานนนทบุรี	ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งด้านทิศเหนือคลองบางตลาด ความยาว 2,000 เมตร โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี <small>สำนักงานชลประทานที่ 11 ส่วนแผนงาน</small>	93.00	พ.ร.บ. 64 138,268,000 กันเหลื่อม 65 116,798,210.3	พ.ร.บ. 64 21,460,930 กันเหลื่อม 65 104,781,487.46	พ.ร.บ. 64 116,807,070 (คืน 8,859.70) กันเหลื่อม 65 12,016,722.84 (พับ11,293.94)	โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 12,005,428.90 บาท สัญญาเลขที่ กจ.6/2564 (สพด.) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เริ่ม 1 มิ.ย. 64 สิ้นสุด 27 มี.ค. 65	

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 2566 (บาท)	ขั้นตอนจัดซื้อ จัดจ้างวันที่	ขั้นตอนจัดซื้อ จัดจ้างวันที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 รายการ			74,136,100				
111	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่บริเวณเกษตร เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 - (533)	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,500,000	2.อนุมัติแผน	อนุมัติรับราคา	ไม่ติดปัญหาอะไร รายการงานปรับปรุงพื้นที่สวนเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างและคาดว่าจะก่อสร้างได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565	-
112	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.16) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประดูระบบน้ำปึงคุดลูก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองคิไชยาบุรีตาด ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา - (547)	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทางโครงการอยู่ระหว่างทำประมาณการใหม่ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ	ทางโครงการดำเนินการเรื่องเอกสารและจัดส่งประมาณการใหม่มาที่สำนัก โดยด่วนที่สุด
113	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.17) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประดูระบบน้ำปึงคุดซ้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองคิไชยาบุรีตาด ตำบลคลองหลวงแห่ง อำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - (548)	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทางโครงการอยู่ระหว่างทำประมาณการใหม่ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ	ทางโครงการดำเนินการเรื่องเอกสารและจัดส่งประมาณการใหม่มาที่สำนัก โดยด่วนที่สุด
114	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.18) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประดูระบบน้ำปึงคุดซ้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองคิไชยาบุรีตาด ตำบลคลองหลวงแห่ง อำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - (549)	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	1.ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทางโครงการอยู่ระหว่างทำประมาณการใหม่ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ	ทางโครงการดำเนินการเรื่องเอกสารและจัดส่งประมาณการใหม่มาที่สำนัก โดยด่วนที่สุด
115	สำนักงานชลประทานที่ 11	(279) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยเครื่องจักร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิชิต ตำบลบางปูใหม่ อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ - (1039)	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	26,400,000	3.ประกาศ TOR	อนุมัติแผน	ยังไม่ได้รับเงินโอนจัดสรร	เร่งดำเนินการทำเอกสารเพื่อขอ
116	สำนักงานชลประทานที่ 11	(6) ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 33 จำนวน 1 แห่ง ตำบลลาดหญ้า อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี - (1979)	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	3.ประกาศ TOR	ประกาศ Tor	แก้ไขเนื้อหา TOR / เอกสารประกวดราคา / ราคาากลาง	แก้ไขเอกสารค่าจ้างให้ชัดเจนแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2565
117	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.2894) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกร ผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยารบรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี - (4989)	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	2.อนุมัติแผน	อนุมัติแผน	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพื่อประกอบการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการฯ จะเร่งจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน
118	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.2931) บริหารจัดการน้ำในเขโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี - (5026)	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	934,600	2.อนุมัติแผน	ทำข้อมูลพัน(สัญญา)	-	-
119	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.3134) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดปทุมธานี - (5229)	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	36,000	2.อนุมัติแผน	อนุมัติแผน	เพิ่งได้รับเงินจัดสรร เลขที่ กทพ 04/5865/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565	เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
120	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.3183) ซ่อมแซม ปากคลองระแหงใต้ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยารบรลือ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหญ้า จังหวัดปทุมธานี - (5278)	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	870,000	2.อนุมัติแผน	อนุมัติแผน	แก้ไขชื่อรายการงานให้ถูกต้อง เพื่อให้ตรงกับข้อมูลสิทธิหรือที่ลงทะเบียนไว้ จากเดิมซ่อมแซม <u>ประตู ปากคลองระแหงใต้</u> จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยารบรลือ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหญ้า จังหวัดปทุมธานี ขอแก้ไขเป็น ซ่อมแซม <u>ประตูระบายน้ำคลองระแหง(คลองขุดใหม่(ฝั่งซ้าย)</u> จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยารบรลือ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหญ้า จังหวัดปทุมธานี	เมื่อได้รับอนุมัติให้แก้ไขรายการสามารถดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที
121	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.3618) ซ่อมแซมคันคลองบ้านน้ำผึ้งยาว กม.2+000 - กม.2+500 ความยาว 0.50 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยารบรลือ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - (5713)	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	450,000	2.อนุมัติแผน	อนุมัติแผน	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR เพื่อประกอบการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการฯ จะเร่งจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน
122	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.5597) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสมุทรปราการ - (7692)	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	13,200	2.อนุมัติแผน	ทำข้อมูลพัน(สัญญา)	-	-
123	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.5601) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกร ผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิชิต ตำบลคลองด่าน อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ - (7696)	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000	2.อนุมัติแผน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่ติดปัญหาอะไร คาดว่าจะสามารถทำข้อมูลพัน(สัญญา) ได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.2565	-
124	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.5649) ก่อสร้างฝายพิชิตโยธเรนง ปริมาณ 95 ไร่ โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอมืองสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - (7744)	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	308,000	2.อนุมัติแผน	ทำข้อมูลพัน(สัญญา)	-	-
125	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.5655) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 16.62 กิโลเมตร โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอมืองสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - (7750)	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	234,600	2.อนุมัติแผน	ทำข้อมูลพัน(สัญญา)	-	-
126	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.5662) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสมุทรปราการ พื้นที่รับประโยชน์ 191,457 ไร่ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ - (7757)	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	140,200	2.อนุมัติแผน	ทำข้อมูลพัน(สัญญา)	-	-
127	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.5663) บำรุงรักษาฝายงานและอาคารบังคับน้ำ พื้นที่ 118 ไร่ โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ - (7758)	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	249,500	2.อนุมัติแผน	ทำข้อมูลพัน(สัญญา)	-	-
