

# ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 1/2566



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เล่มที่ ๔

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



ส่วนแผนงาน

สำนักงานชลประทานที่ 11

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11

# รายละเอียดข้อมูล



- รายงานผลการเบิกจ่าย งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



- รายงานผลการเบิกจ่าย งบกันเหลือมปี 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566




- รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณที่พับไป



- เอกสารประกอบประมาณการ (ผง.)



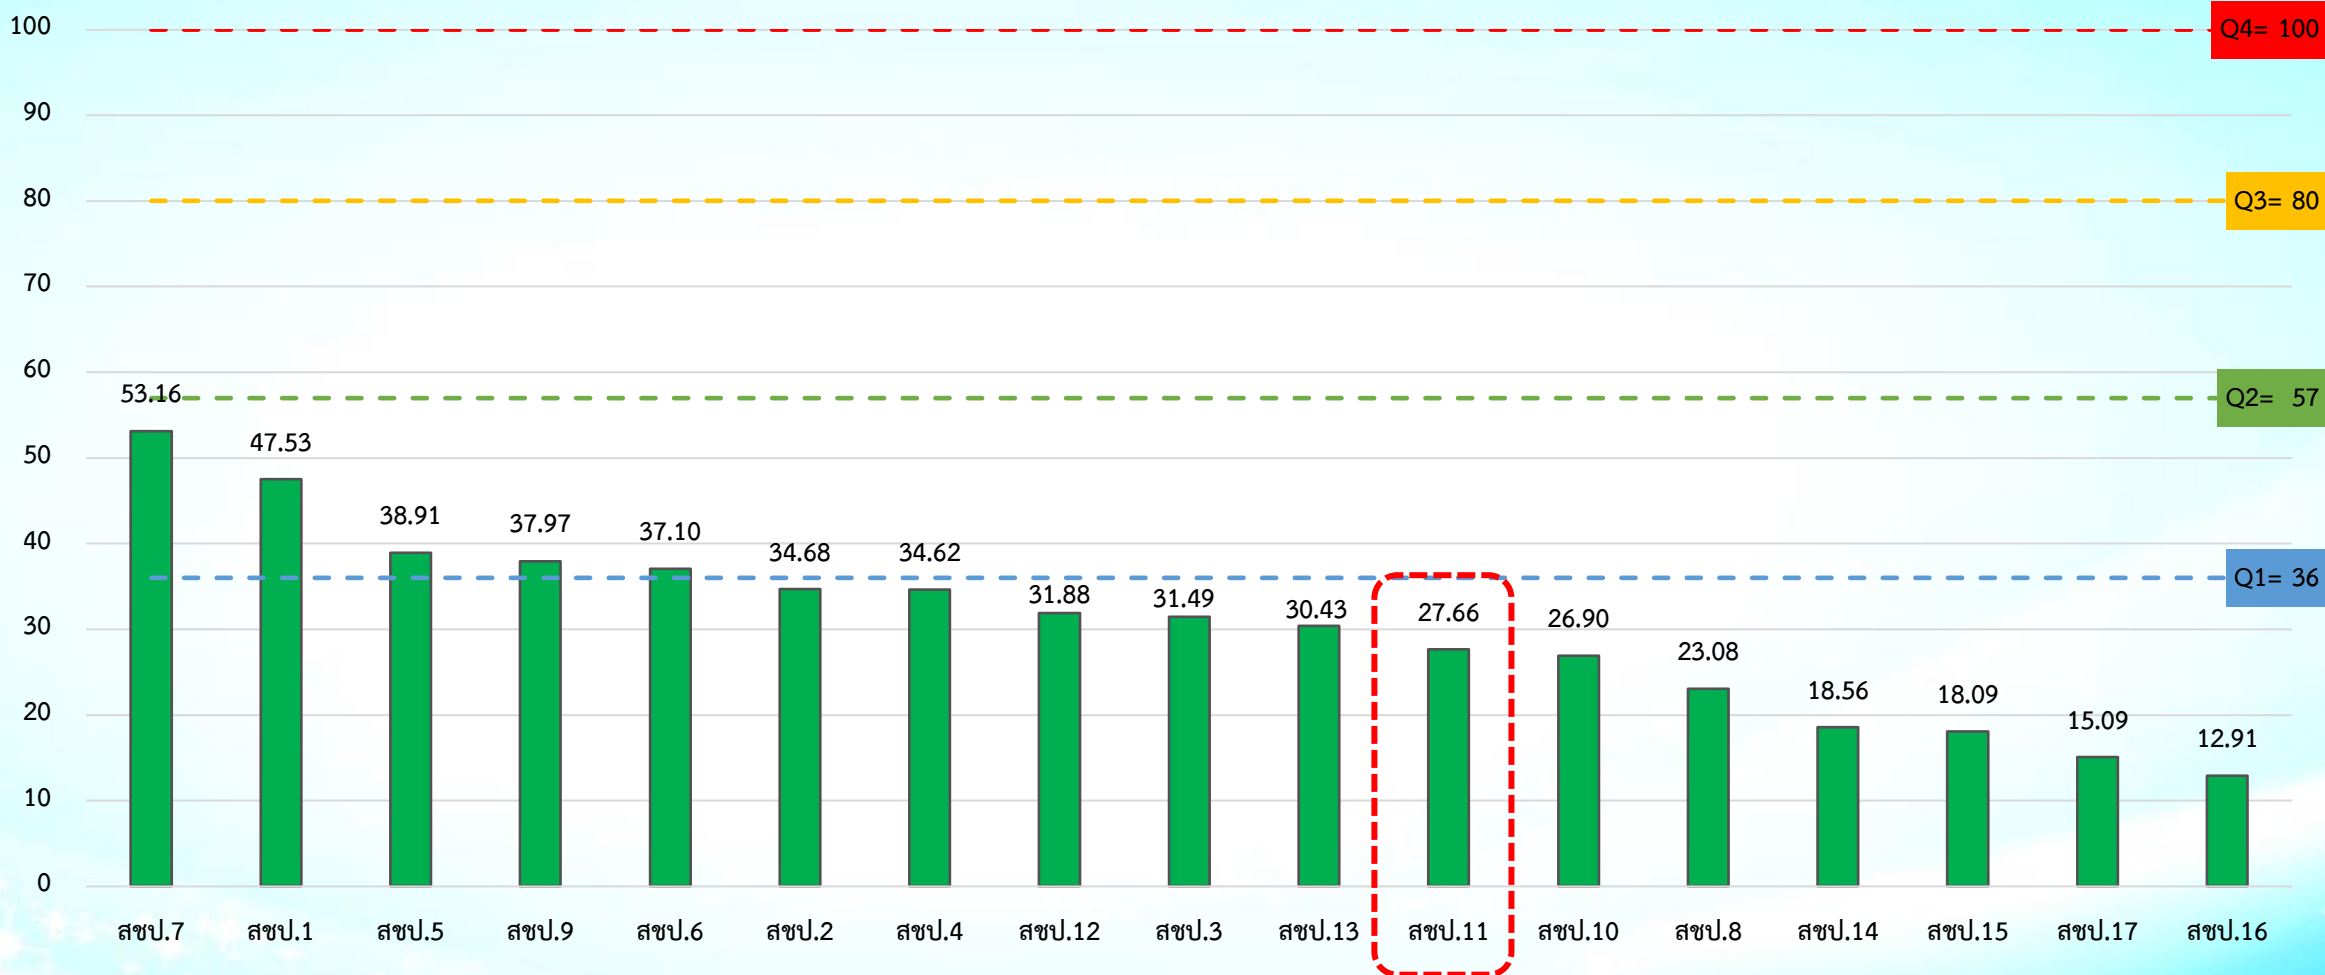

คาดการณ์เบิกจ่าย สขป.11 ไตรมาส 2 ร้อยละ 38.36 %

ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


- ได้รับการโอนจัดสรร	1,251,622,131.00	บาท
- ผลเบิกจ่าย	346,229,779.00	บาท
- คิดเป็นร้อยละ	27.66 %	

[ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ] ข้อมูลจากระบบ CEN เวลา 09:00 น.

# ส่วนแผนงาน

## กราฟแสดงคาดการณ์ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 **สขบ.11**

57

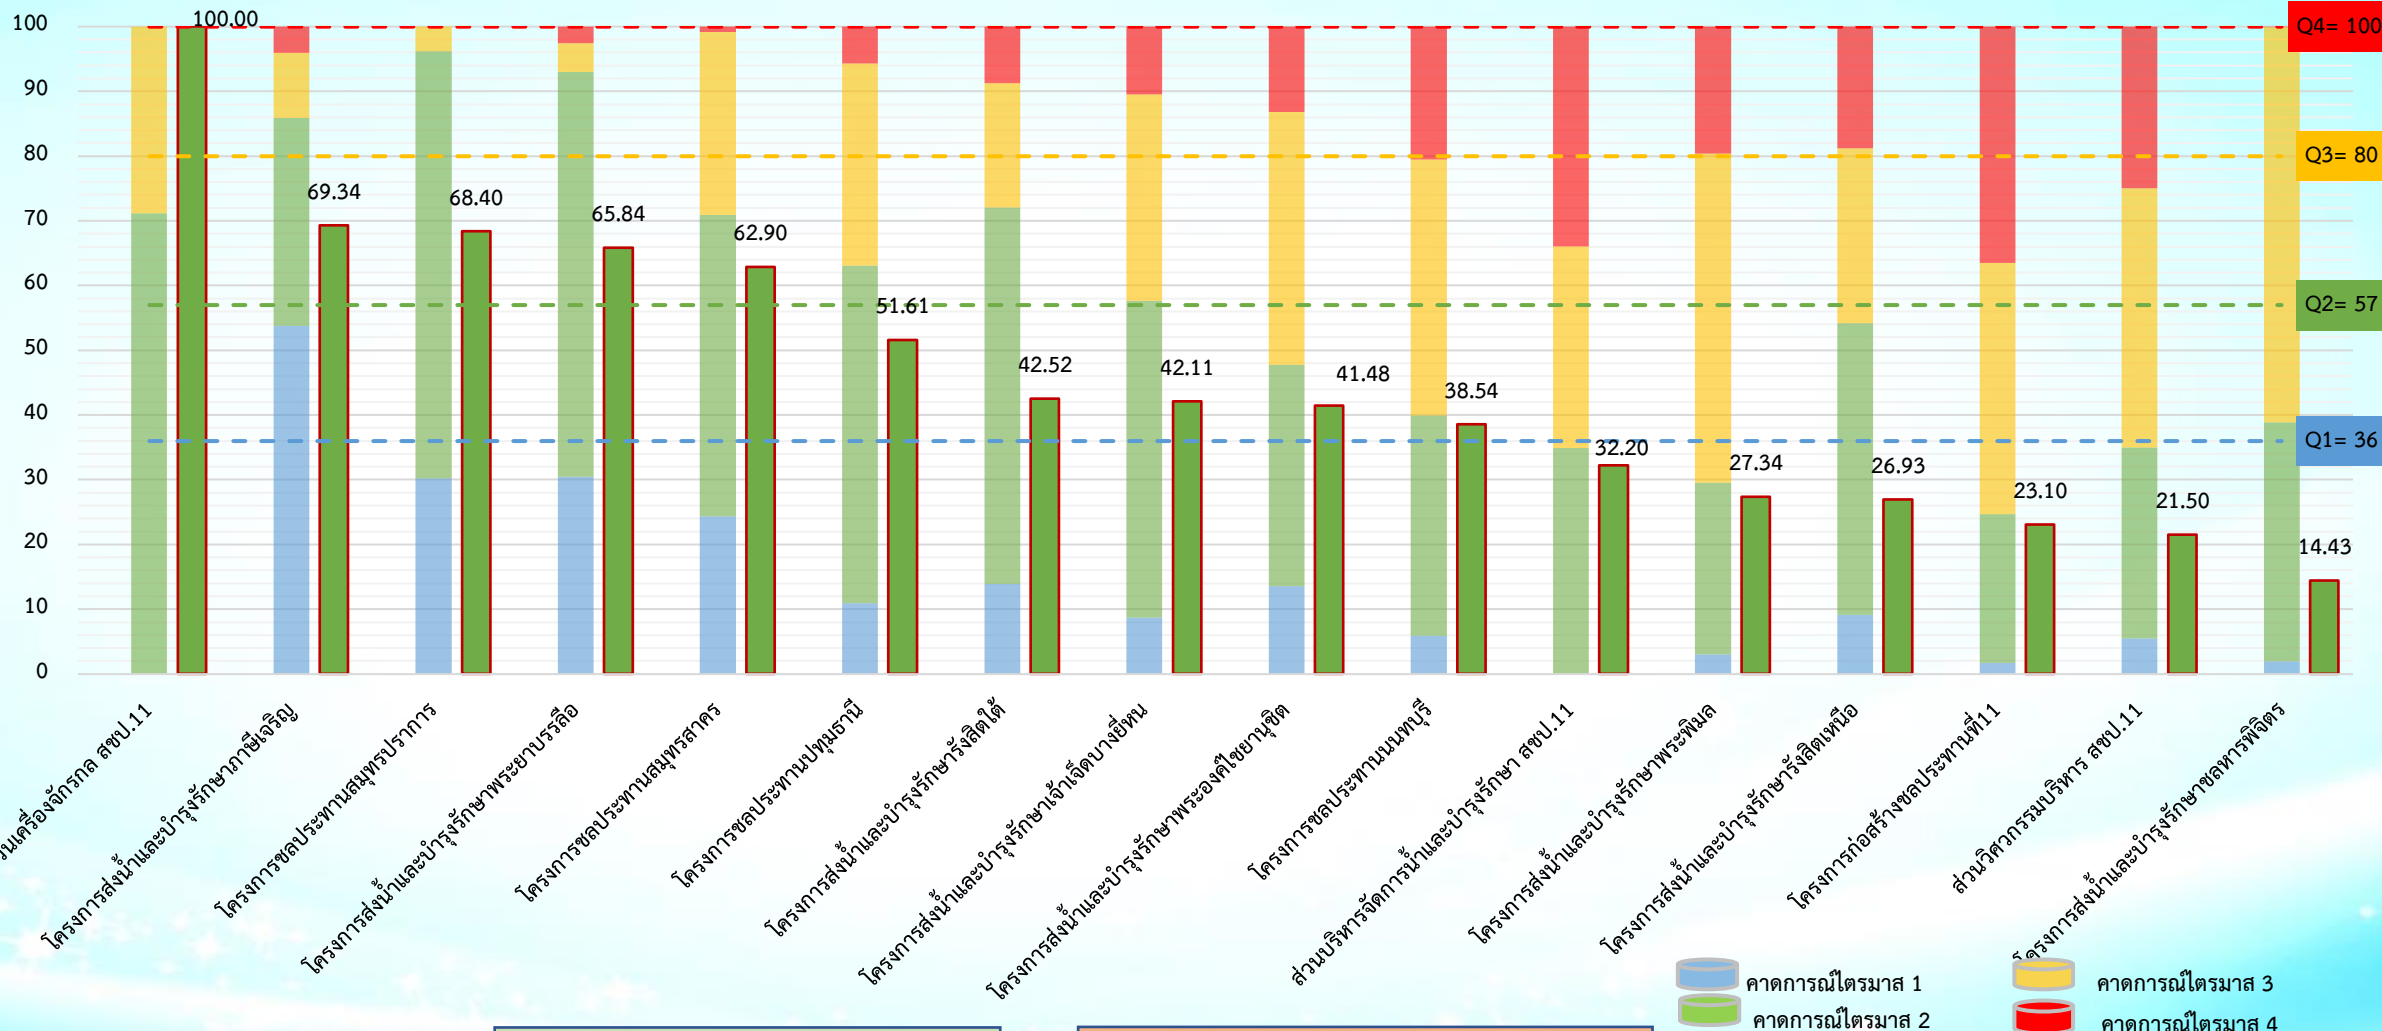

เป้าหมายกรม ประจำปีไตรมาส 2 ร้อยละ 57 %

คาดการณ์เบิกจ่าย สขบ.11 ประจำปีไตรมาส 2 ร้อยละ 38.6 %

คาดการณ์เบิกจ่าย ประจำเดือน ก.พ. 66 ร้อยละ 26.64 %


■ คาดการณ์ไตรมาส 1  
■ คาดการณ์ไตรมาส 2  
■ คาดการณ์ไตรมาส 3  
■ คาดการณ์ไตรมาส 4

- ได้รับการโอนจัดสรร 1,251,622,131 บาท  
 - ผลเบิกจ่าย 346,229,779 บาท  
 - คิดเป็นร้อยละ 27.66 %

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

\*ข้อมูลจากระบบ Cen-Project ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

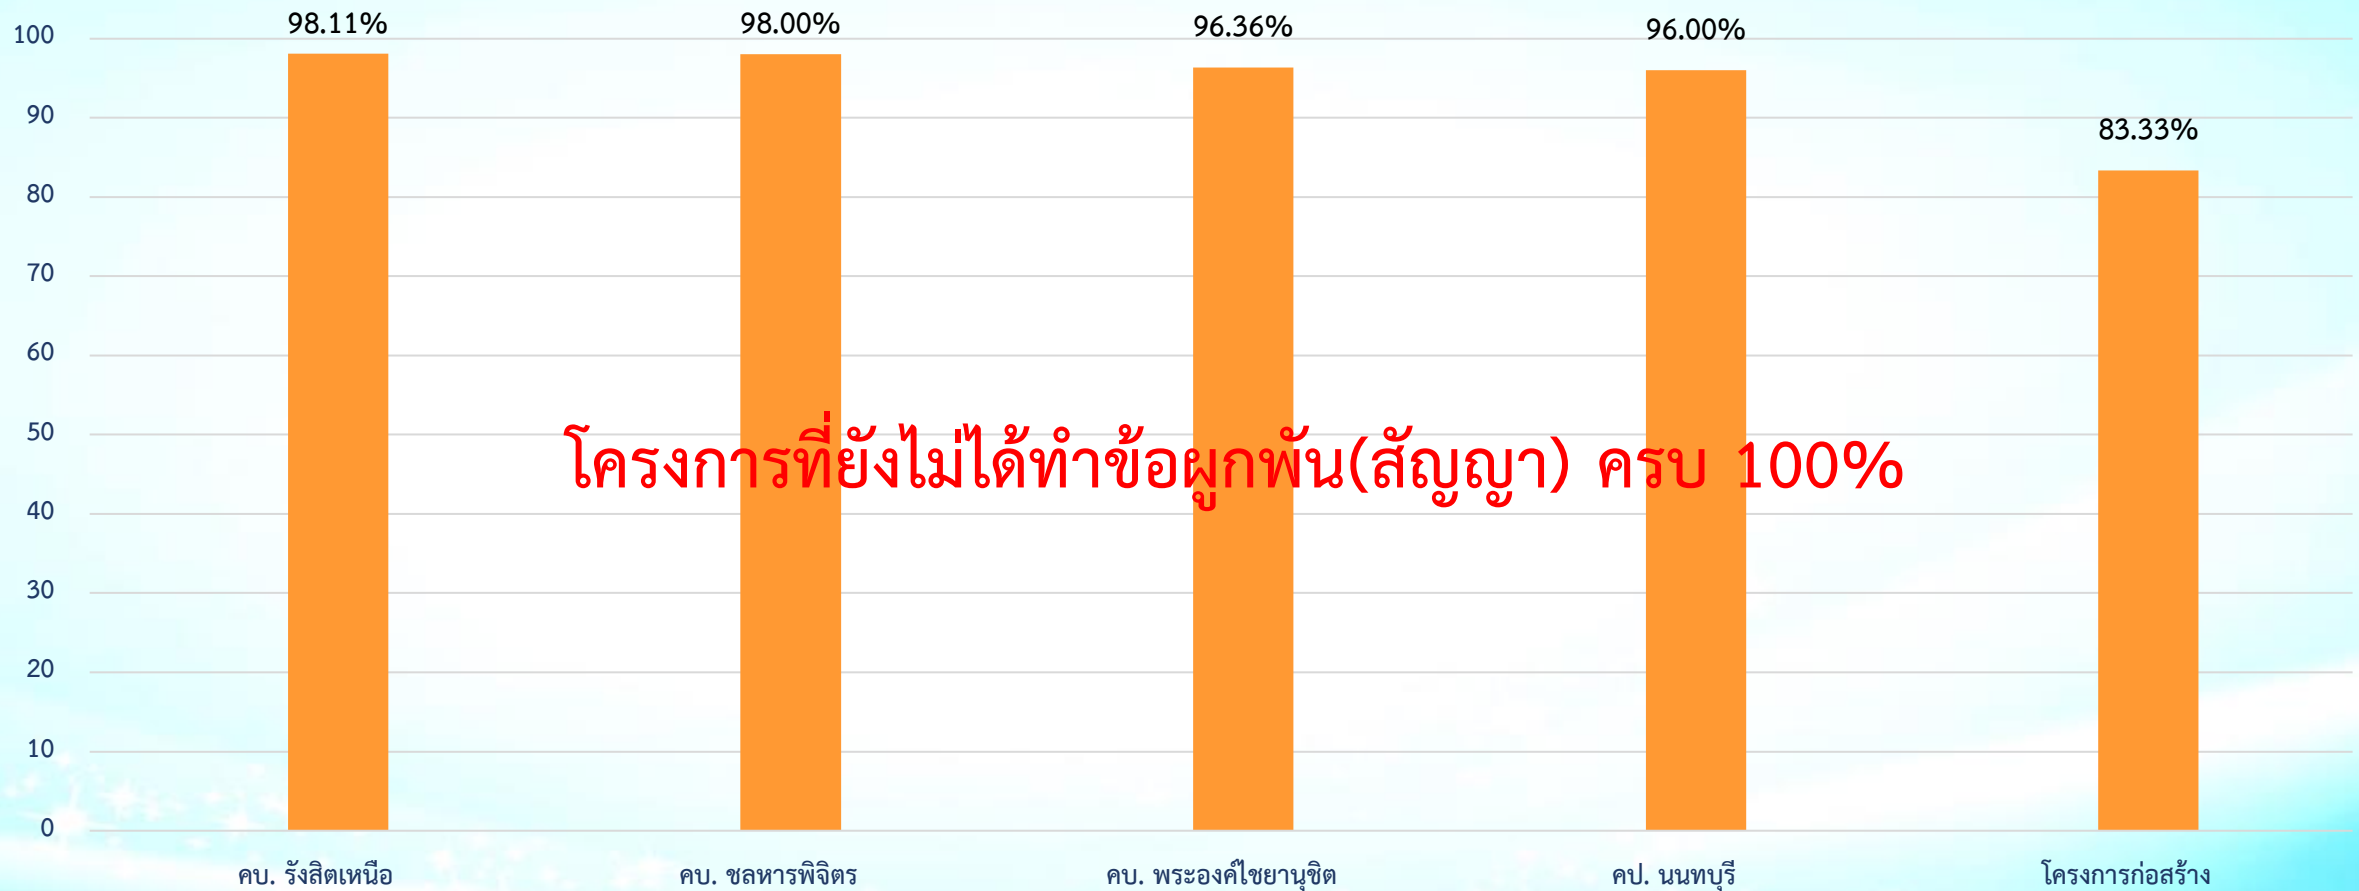

โครงการที่ยังไม่ได้ทำข้อผูกพัน(สัญญา) ครบ 100%

ภาพรวมของ สชป.11 ที่ทำข้อผูกพัน (สัญญา) แล้วเสร็จ \*จำนวน 567 รายการ จากทั้งหมด \*จำนวน 582 รายการ คิดเป็น **97.42%**

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง																			โอนจัดสรร
หน่วยงาน	รวมที่ต้องดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ		1.อยู่ระหว่างเตรียมการ		2.อนุมัติแผน		3.ประกาศ TOR		4.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง		5.เปิดซอง		6.อนุมัติรับราคา		7.ทำข้อผูกพัน (สัญญา)		จำนวน
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	
โครงการก่อสร้างชลประทานที่11	12	759.2781	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	180.0000	0	0.0000	1	8.5000	10	570.7781	10
โครงการชลประทานนพบุรี	25	33.8256	0	0.0000	0	0.0000	1	1.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	24	32.8256	24
โครงการชลประทานปทุมธานี	32	17.2721	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	32	17.2721	31
โครงการชลประทานสมุทรปราการ	20	15.0723	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	20	15.0723	20
โครงการชลประทานสมุทรสาคร	18	19.0742	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	18	19.0742	18
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน	41	30.6826	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	41	30.6826	41
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	50	397.8191	0	0.0000	0	0.0000	1	26.4000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	49	371.4191	51
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	81	69.0656	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	81	69.0656	81
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	62	42.2160	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	62	42.2160	61
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	110	98.2149	0	0.0000	0	0.0000	4	25.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	106	73.2149	106
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	21	12.6585	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	21	12.6585	21
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	44	33.7053	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	44	33.7053	44
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	53	69.1756	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	25.0000	0	0.0000	0	0.0000	52	44.1756	54
ส่วนเครื่องจักรกล สขป.11	2	29.5000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	2	29.5000	2
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สขป.11	1	0.9346	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	0.9346	1
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.11	1	13.9592	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	13.9592	1
สำนักงานชลประทานที่ 11	10	14.4618	1	0.6500	0	0.0000	3	11.6000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	3	2.1300	3	0.0818	0
<b>รวม</b>	<b>583</b>	<b>1,656.9155</b>	<b>1</b>	<b>0.6500</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>9</b>	<b>64.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>2</b>	<b>205.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>4</b>	<b>10.6300</b>	<b>567</b>	<b>1,376.6355</b>	<b>566</b>




รายการงานที่ยังไม่ทำข้อผูกพัน(สัญญา)					
ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	ชื่อรายการงาน	ประเภทงาน	งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้าง สขป.11	(16) สถานีสูบน้ำเชื่อมต่อแก้มลิงคลองเปรมประชากร และส่วนประกอบอื่น	จ้างเหมาบางส่วน	180,000,000	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2	โครงการก่อสร้าง สขป.11	(1.2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่สวนเกษตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	จ้างเหมาบางส่วน	8,500,000	อนุมัติรับราคา
3	คป.นนทบุรี	(1.2929) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานนนทบุรี	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,000,000	อนุมัติแผน
4	คบ.ชลหารพิจิตร	(279) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำตำหุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	ดำเนินการเอง	26,400,000	อนุมัติแผน
5	คบ.พระองค์ไชยานุชิต	(1.680) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,000,000	อนุมัติแผน
6	คบ.พระองค์ไชยานุชิต	(1.18) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประตุระบายน้ำบึงคู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 549 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	8,000,000	อนุมัติแผน
7	คบ.พระองค์ไชยานุชิต	(1.17) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประตุระบายน้ำบึงคัดช้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 548 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	8,000,000	อนุมัติแผน
8	คบ.พระองค์ไชยานุชิต	(1.16) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประตุระบายน้ำบึงบ่อห้าลูก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 547 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	8,000,000	อนุมัติแผน
9	คบ.รังสิตเหนือ	(94) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ (สูบน้ำ 2 ทาง) ปตร.ปลายคลองระบายน้ำที่ 2 ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี - [ 854 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	25,000,000	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง




ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


-	วงเงินกัณฑ์ลื้อมปี 65	513,867,099 บาท
-	ผลเบิกจ่าย	174,270,253 บาท
-	คิดเป็นร้อยละ	33.91 %

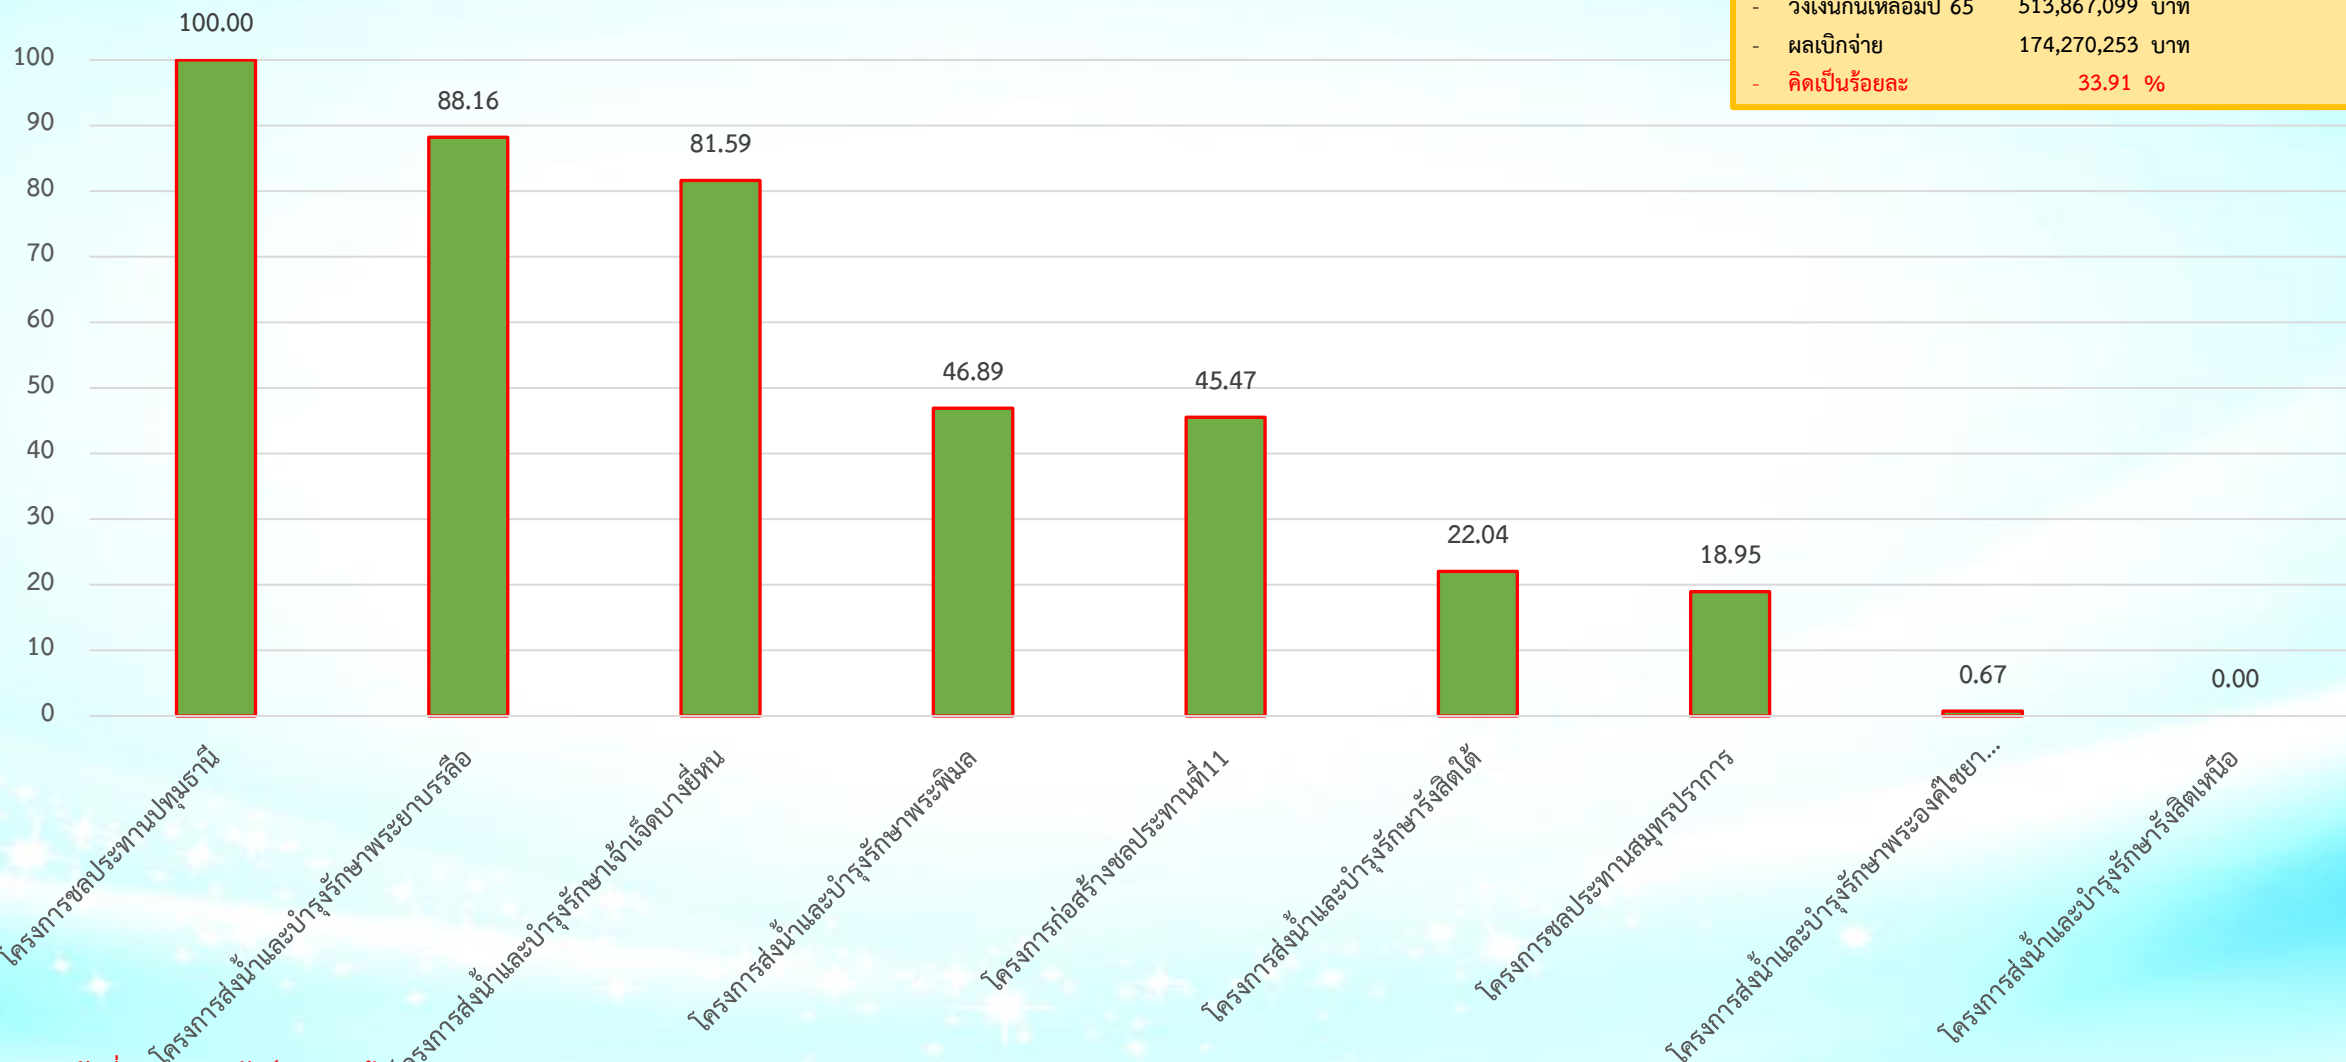




# ติดตามงบเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

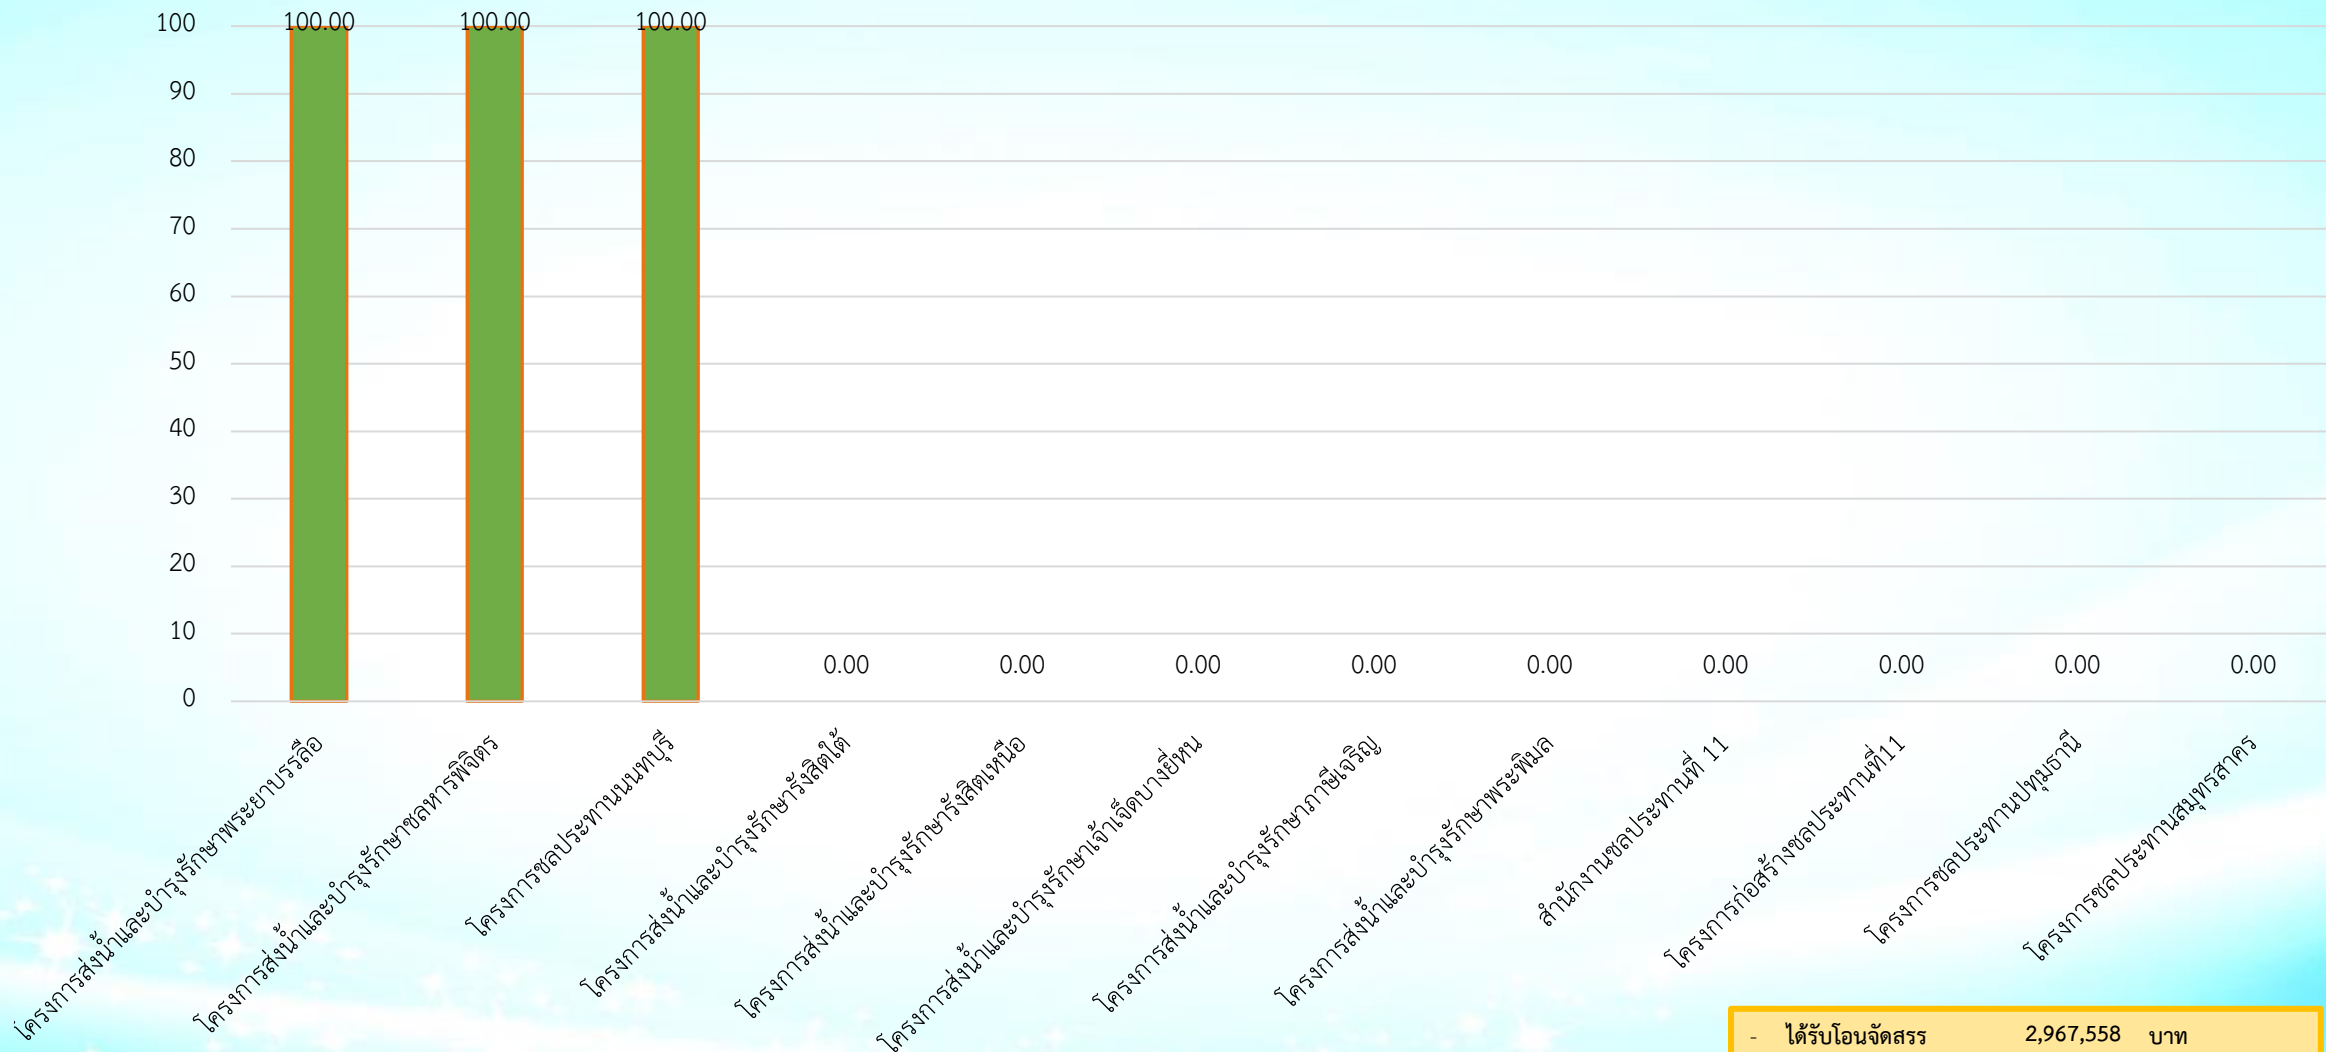

 ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

- ได้รับโอนจัดสรร	2,967,558	บาท
- ผลเบิกจ่าย	435,758	บาท
- คิดเป็นร้อยละ	14.68	%

[ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ] ข้อมูลจากระบบ CEN เวลา 09:00 น

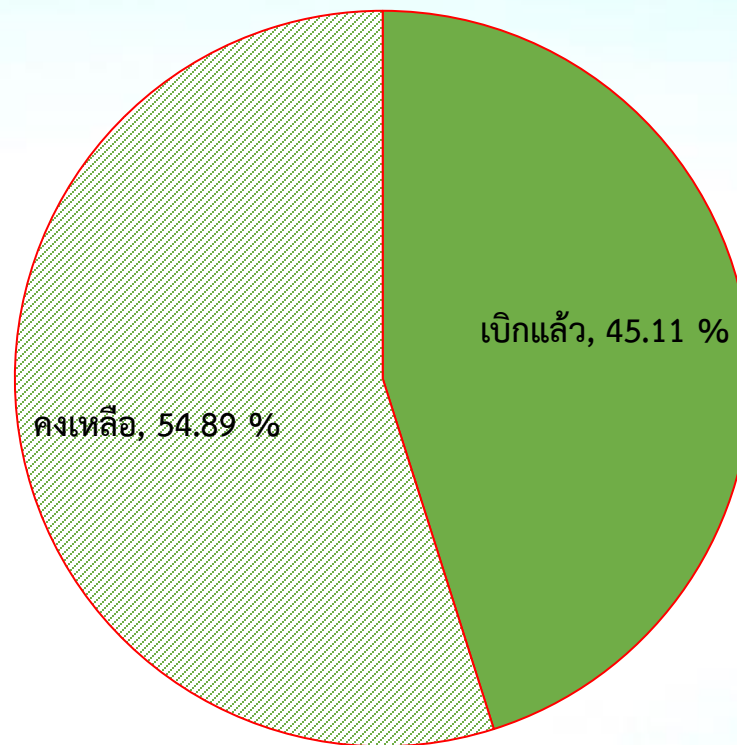

งานปรับปรุงห้องทำงานส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร



ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566



ผลเบิกจ่ายคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

- ได้รับโอนจัดสรร	2,380,000 บาท
- ผลเบิกจ่าย	1,073,700 บาท
- คิดเป็นร้อยละ	45.11 %

[ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ] ข้อมูลจากระบบ CEN เวลา 09:00 น

# ติดตามการดำเนินการงบประมาณที่ถูกพับไป (เงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ชื่องาน / งบประมาณการ	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท) ณ 19 ต.ค. 65	คงเหลือ (เงินพับ)	หมายเหตุ
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ปรับปรุงเสริมคันคลองรังสิตตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี	65.61	53,084,131.78	30,974,093.62	22,110,038.16	สัญญาเลขที่ กจ.33/2562 (สพด.) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 วงเงินตามสัญญา 53,084,131.78 บาท
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง ระหว่างคลอง 7-8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	62.67	59,300,320.00	16,569,699.33	42,730,620.67	สัญญาเลขที่ กจ.32/2562 (สพด.) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 วงเงินตามสัญญา 59,300,320 บาท
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ปรับปรุงเสริมคันคลองหกวาตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี	53.36	53,898,778.62	20,620,128.42	33,278,650.20	สัญญาเลขที่ กจ.26/2562 (สพด.) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 วงเงินตามสัญญา 53,898,778.62 บาท
<b>คบ.รังสิตใต้รวมทั้งสิ้น 3 รายการ</b>					166,283,230.40	68,163,921.37	98,119,309.03
4	โครงการชลประทานนนทบุรี	ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งด้านทิศเหนือคลองบางตลาด ความยาว 2,000 เมตร โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	93.00	พ.ร.บ. 64 138,268,000  กันเหลื่อม 65 116,798,210.3	พ.ร.บ. 64 21,460,930  กันเหลื่อม 65 104,786,916.36	พ.ร.บ. 64 116,807,070 (คืน 8,859.70) กันเหลื่อม 65 12,016,722.84 (พับ11,293.94)	โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว <b>12,000,000 บาท</b> สัญญาเลขที่ กจ.6/2564 (สพด.) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เริ่ม 1 มิ.ย. 64 สิ้นสุด 27 มี.ค. 65

# เอกสารประกอบประมาณการ

ชื่องาน.....

โครงการ.....

ลำดับ	รายการ	ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	บันทึกข้อความ เสนอขออนุมัติประมาณการ		
2	คำชี้แจงเหตุผลความจำเป็น		
3	แบบประมาณการ แบบฟอร์ม สป.325 และรายละเอียด - ชื่องาน/ที่ตั้ง - วงเงินงบประมาณ		
4	รายละเอียด - โอนจัดสรร - ปริมาณงาน - อัตราราคางาน/การคำนวณราคา - หลักฐานที่มาของราคา - การคำนวณค่า Factor F		
5	บัญชีแสดง รายการงานและราคางาน (BOQ) (กรณีงานจ้างเหมา)		
6	รายการคำนวณปริมาณงาน ,เหล็กเสริมฯ ,ไม้แบบ		
7	ภาพถ่าย/แผนที่แสดงบริเวณจุดดำเนินการ		
8	เอกสารในการใช้ที่ดิน		
9	แบบก่อสร้างที่ใช้ในการจัดทำประมาณการ		
10	เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือกรมฯ ตอบรับ, กรมฯ อนุมัติแผนงาน		
11	แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ		



# ตัวอย่างแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนงาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน

สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา....

ผลผลิต โครงการปรับปรุงงานชลประทาน

รายการ งานปรับปรุง.....

หน่วย : พันบาท (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)

รายการงาน	วงเงิน งบประมาณ	งบประมาณ ปี 2566											กัณเงิน เหลือในปี	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
งานจ้างเหมา	300.0										100.0	100.0	100.0	
งานดำเนินการเอง														
รวมงบประมาณ แยกเป็นรายเดือน		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	
รวมงบประมาณ สะสม	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	200.0	300.0	

จัดทำ

(xxx xxxxxxx)

ตำแหน่ง...

(xxx xxxxxxx)

ผศบ...

(นายชุตินันต์ สกฤพรหมณ์)

ผส.ชป.11



# ตัวอย่างเอกสารการใช้ที่ดิน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ \_\_\_\_\_

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง ขออนุญาตให้ใช้ที่ดิน ของแผนงาน/โครงการ \_\_\_\_\_

เรียน ผส.ชป.๑๑ ผ่าน ผผง.ชป.๑๑

ตามโครงการ..... ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แผนงาน/

โครงการ.....

ชื่อรายการ ตามเอกสารแนบ ในด้านการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน นั้น

โครงการ..... ขอยืนยันว่า พื้นที่การดำเนินการดังกล่าว อยู่ในพื้นที่

ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณสามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดปัญหา  
ด้านที่ดิน และรายการดังกล่าวไม่เป็นภารกิจถ่ายโอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.....)

รายละเอียดแผนงาน/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 สำนักงานชลประทานที่ 11

1	2	3	4				5	6	6.1-6.4				6.5	7.4	8						
			4.1	4.2	4.3	4.4			สถานที่ดำเนินการ						วงเงินที่เสนอ (บาท)	สถานะความพร้อมโครงการ					
									ลักษณะงาน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด				พื้นที่	Lat	Long	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการอยู่	ยังไม่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น																					
11	1	ซ่อมแซมคันคลอง สถานีสูบน้ำบริเวณราษฎร์	5	19	2	5.1	12	บางปู	เมือง	สมุทรสาคร	1001	10	13.4984	100.7632	2,200,000	1	1	1	1	1	1
11	2	ซ่อมแซมคันคลอง สถานีสูบน้ำบางปลาเจ้า	5	19	2	5.1	12	บางโพธิ์	เมือง	สมุทรสาคร	1001	10	13.5081	100.7025	2,400,000	1	1	1	1	1	1
11	3	ซ่อมแซมคันคลอง สถานีสูบน้ำบางหญ้า	5	19	2	5.1	12	คลองด่าน	บางบัว	สมุทรสาคร	1001	10	13.5013	100.8358	2,300,000	1	1	1	1	1	1
11	4	ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองพวงมณี	5	19	2	5.1	12	ในคลองบางกอก	พระสมุทรเจดีย์	สมุทรสาคร	1002	10	13.5702	100.5322	850,000	1	1	1	1	1	1
11	5	ซ่อมแซม ท่อป.ปากคลองระลอกใต้	5	19	2	5.1	12	ทรงคนอง	พระประแดง	สมุทรสาคร	1001	10	13.6689	100.5321	600,000	1	1	1	1	1	1
11	6	ซ่อมแซมคูน้ำคันคลองพลาขันธ์ ปตร.คลองสวน	5	19	2	5.1	12	บ้านคลองสวน	พระสมุทรเจดีย์	สมุทรสาคร	1001	10	13.5643	100.4696	398,000	1	1	1	1	1	1
11	7	ซ่อมแซมคูน้ำคันคลองบ้านบระบาย ท่อ.คลองสวน	5	19	2	5.1	12	บ้านคลองสวน	พระสมุทรเจดีย์	สมุทรสาคร	1001	10	13.5738	100.4782	475,000	1	1	1	1	1	1
11	8	ซ่อมแซมคูน้ำคันคลองบ้านบระบาย ปตร.คลอง	5	19	2	5.1	12	บ้านคลองสวน	พระสมุทรเจดีย์	สมุทรสาคร	1001	10	13.5828	100.4925	475,000	1	1	1	1	1	1
11	9	ซ่อมแซมคูน้ำคันคลองบ้านบระบาย ท่อ.คลองสาย	5	19	2	5.1	12	บ้านคลองสวน	พระสมุทรเจดีย์	สมุทรสาคร	1001	10	13.5926	100.5065	545,000	1	1	1	1	1	1
11	10	ซ่อมแซมคูน้ำคันคลองบ้านบระบาย ท่อ.คลองคำเรือ	5	19	2	5.1	12	บ้านคลองสวน	พระสมุทรเจดีย์	สมุทรสาคร	1001	10	13.5976	100.5062	545,000	1	1	1	1	1	1
11	11	ซ่อมแซมคูน้ำคันคลองบ้านบระบาย ปตร.คลอง	5	19	2	5.1	12	ตลาด	พระสมุทรเจดีย์	สมุทรสาคร	1001	10	13.648455	100.531227	489,000	1	1	1	1	1	1

สิ้นสุดการนำเสนอ

ขอบคุณครับ
